


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 45.08%
- Real: 44.95%
- Semanal: 0.69%
- Financiero: 39.0%

* Redondeados

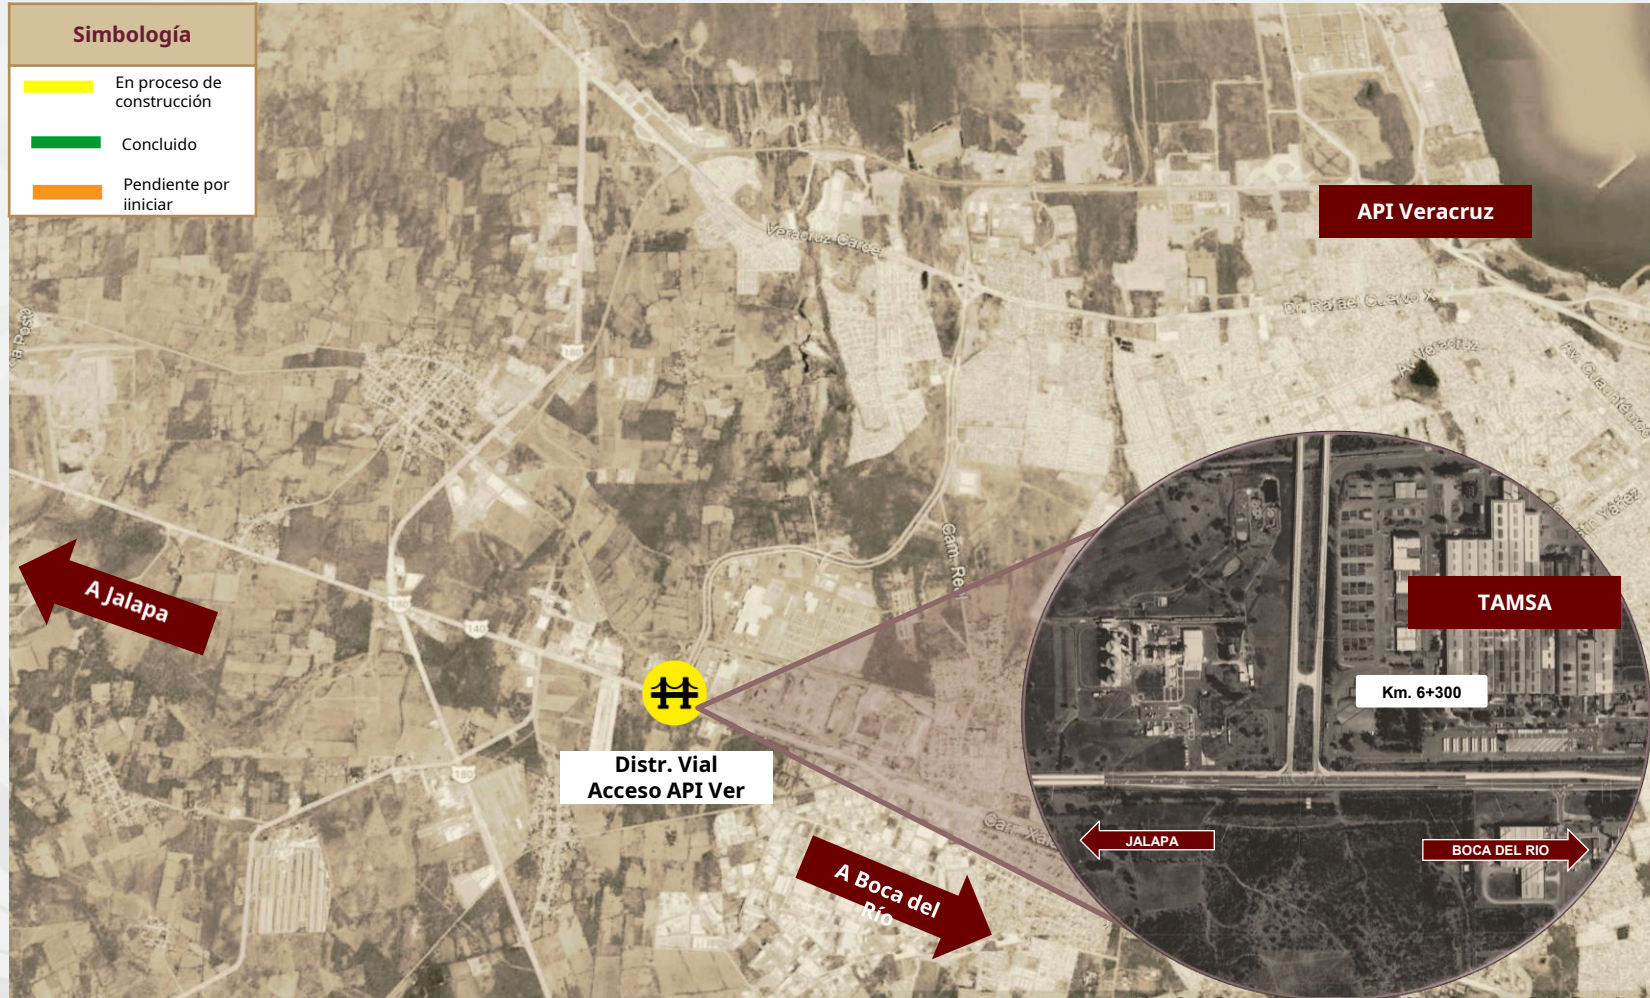

Inversión total: 867 mdp*
Meta total 2025-2026: 2 km*



Inversión 2025: 361.2 mdp
Meta 2025: 0.69 km de PSV
Inversión 2026: 500.0 mdp
Meta 2026: 1.28 km de PSV



Inicio: 14 de julio de 2025
Término meta total: junio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026



780,441 habitantes beneficiados



2,601 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios

Agiliza el funcionamiento vial en la intersección con el Boulevard de acceso al Puerto de Veracruz en el Entr. TAMSA.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 27 al 05/03/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.00	622.50	0.0	Concluido en el cpo B
Cortes	m³	52,059.00	52,059.0	100.0%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Terraplenes	m³	36,650.00	36,650.0	100.0%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	1,377.9	90.0%	153.10	127.60	0.0	Programa 2026
Base asfáltica	m³	4,384.00	3131.0	71.4%	1,253.00	548.00	3,131.0	
Carpeta asfáltica	m³	3,090.00	983.0	31.8%	2,107.00	386.30	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Montaje de trabes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Losa (claro)	pza.	22	22	100.0%	0	2	0.0	Programa 2026
Guarnición	pza.	22	8	36.4%	14	2	8.0	Programa 2026
Barrera Central	pza.	22	0	0.0%	22	3	0.0	Programa 2026

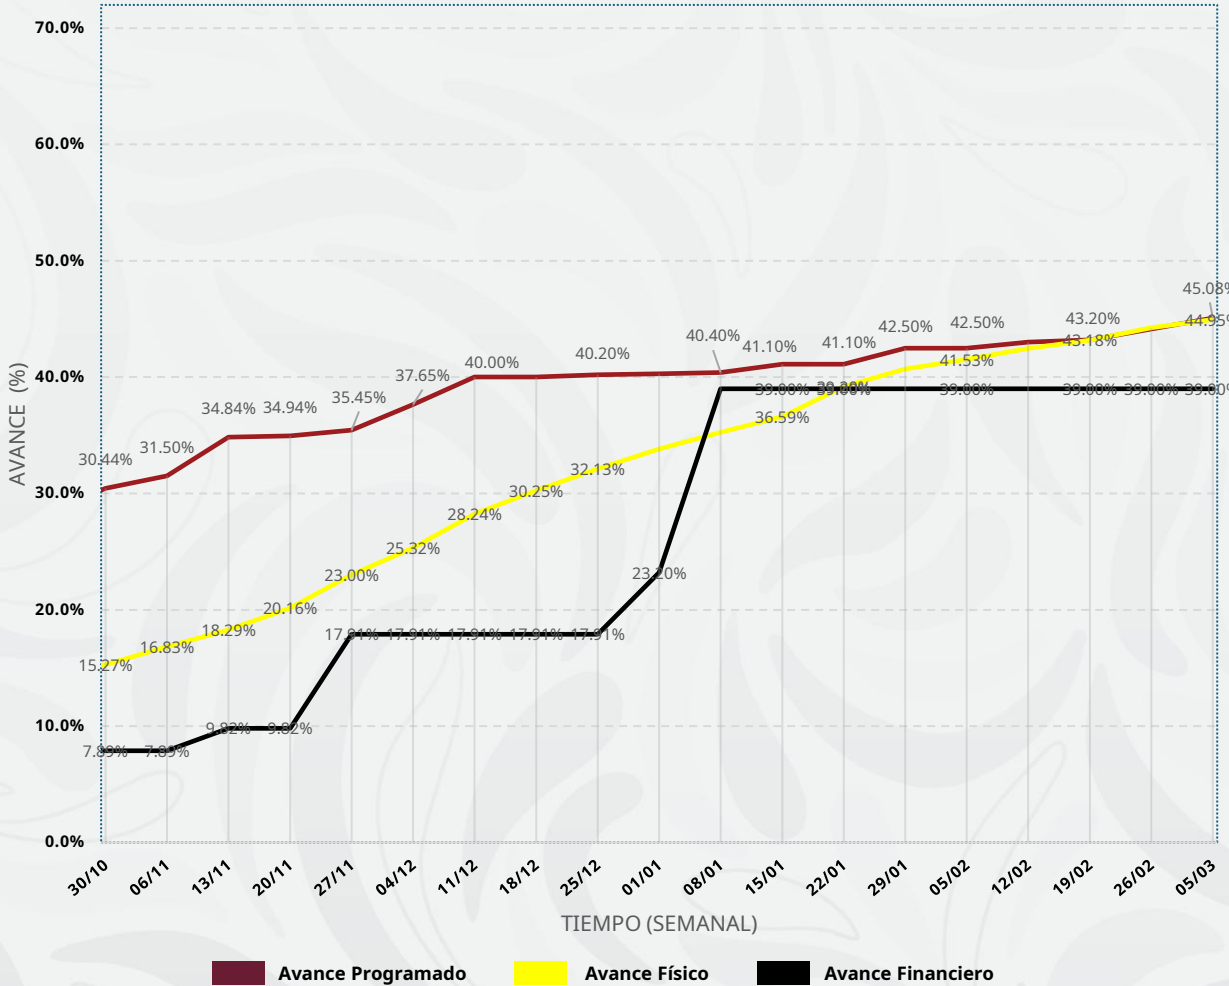

	20 de Febrero al 26 de Febrero	27 de Febrero al 05 de Marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	89	104
Maquinaria	35	35
Frentes de trabajo	5	5
