


PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

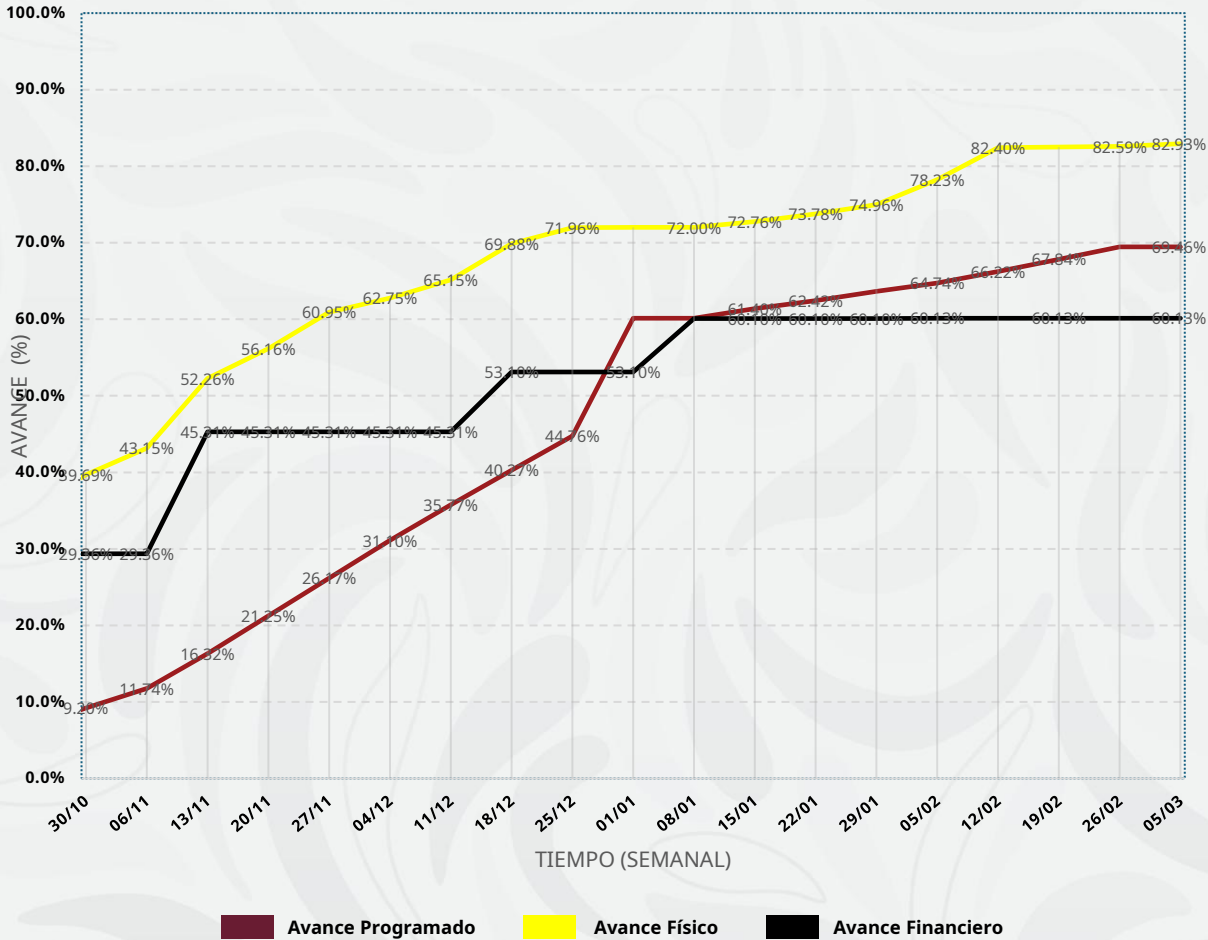

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 27 al 05/03/26		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.1	0.0	Falta proyecto de semaforización y diseño
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura	Actividad	77	77	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Fabricación de Trabes AASHTO IV								
Superestructura	pieza	77	77	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	11	11	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura								
Fabricación de Trabes Nebrazka	pieza	11	11	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura	pieza	11	11	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Montaje de Trabes Nebrazka NU240								
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocación de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico Accesos	Pieza	3.0	3.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Parapeto	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Alumbrado	Actividad	2	2.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Señalamiento	Actividad	2	0.3	15.0%	1.70	0.3	0.0	
Semaforización	Actividad	1	1.0	100.0%	0	0.3	0.0	Concluido
Barrera Central	m	587.0	587	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	0.5	25.0%	1.5	0.5	0.5	
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	194.4	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	2,109.0	41.9%	2,923.0	0	0.0	
Relleno Fluído	m3	2,174.0	1,094.0	50.3%	1,080.0	0	0.0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.0	0	0.0	
Banqueta	m2	6,922.0	580.0	8.4%	6,342.0	0	0.0	
Relleno	m3	692.0	280.0	40.5%	412.0	0	0.0	

	Del 20 de Febrero al 26 de Febrero	Del 27 de Febrero al 05 de Marzo
Personal	78	78
Maquinaria	11	11
Frentes de trabajo	5	5
