

Puente La Presa

Colima

Avance global

• Programado: 86.00 %

• Real: 56.42 %

• Semanal: 0.53 %

• Financiero: 29.98 %



Inversión total 2025-2026: 86.0 mdp
Meta total: 0.601 km



Inversión 2025: 31.0 mdp
Meta 2025: 38.6 % del Puente
Inversión 2026: 55.0 mdp
Meta 2026: 61.4 % del Puente



Fecha de inicio: 11 de agosto, 2025
Fecha de término: Abril, 2026



4,053 habitantes beneficiados



258 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Beneficios: Con la construcción del Puente se garantizará que la comunidad de la Presa tenga acceso a los servicios básicos ininterrumpidos en épocas de lluvias, mismos que en la actualidad se ven afectados por las crecientes del Río El Salado.

Un carril por sentido.




Tramo	Empresas
Construcción del Puente La Presa	• Contratista: GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERÍA, SA DE CV

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	27/02/26 al 05/03/26	
				Programado	Ejecutado
Preliminares					
Desmonte y Despalme (Ha)	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
Subestructura					
Pilas de cimentación (Perforación). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Armado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Colado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Columnas. Pza.	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de cabezales y bancos. Pza.	4.00	3.00	1.00	1.00	0.00
Superestructura					
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Fabricación)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)	18.00	6.00	12.00	6.00	6.00
Colado de diafragma y losa. M3	197.1	0.00	197.1	0.00	0.00
Carpeta asfáltica. M3.	220	0.00	220	0.00	0.00
Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.	43.8	0.00	43.8	0.00	0.00
Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.	182	0.00	182	0.00	0.00

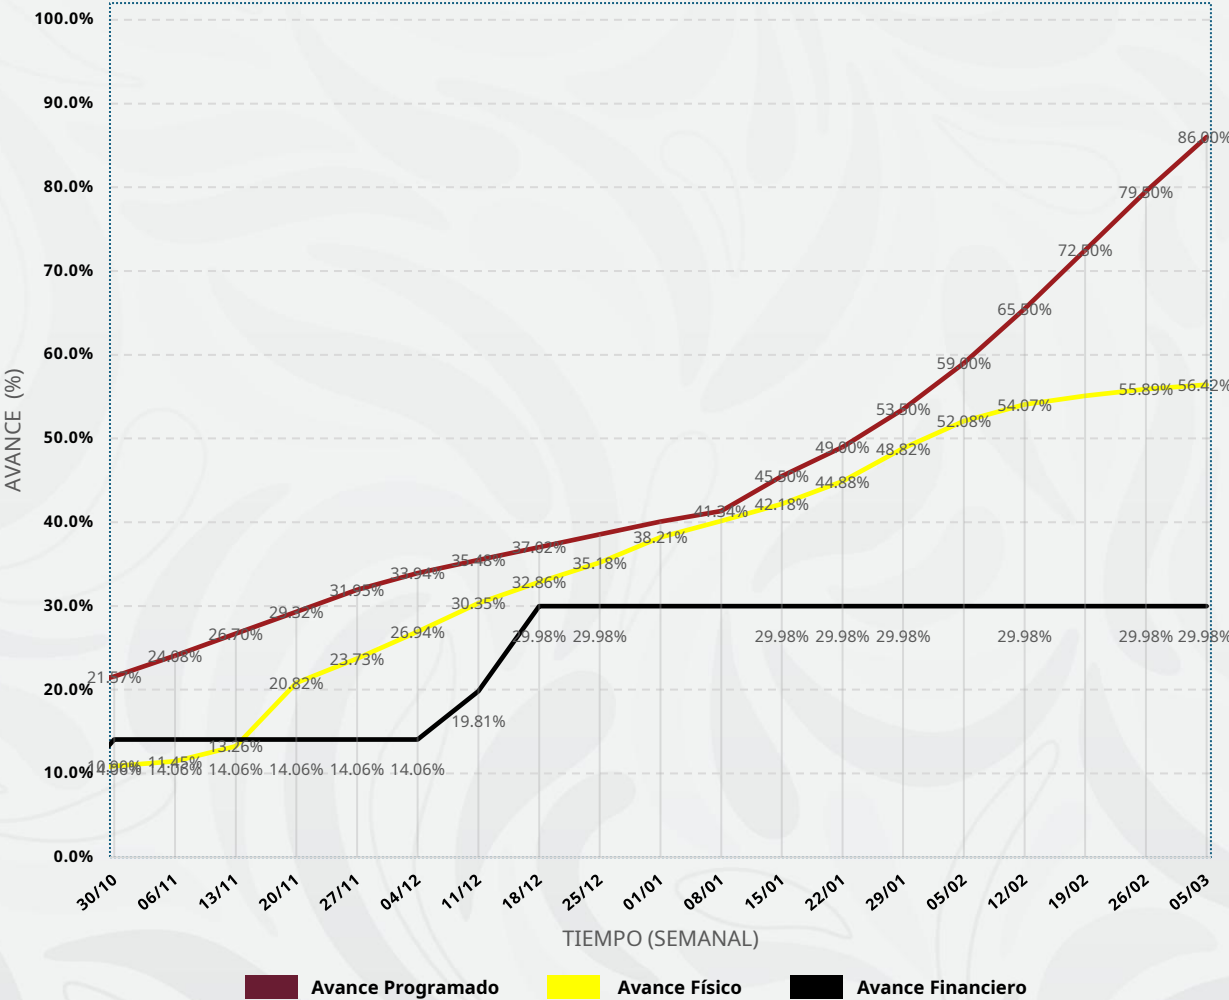

	20 febrero al 26 de febrero	27 febrero al 05 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	54	54
Maquinaria	8	8
Frentes de trabajo	7	7
