


Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance global

- Programado: 26.01%
- Real: 48.54%
- Semanal: 4.32%
- Financiero: 30.59%

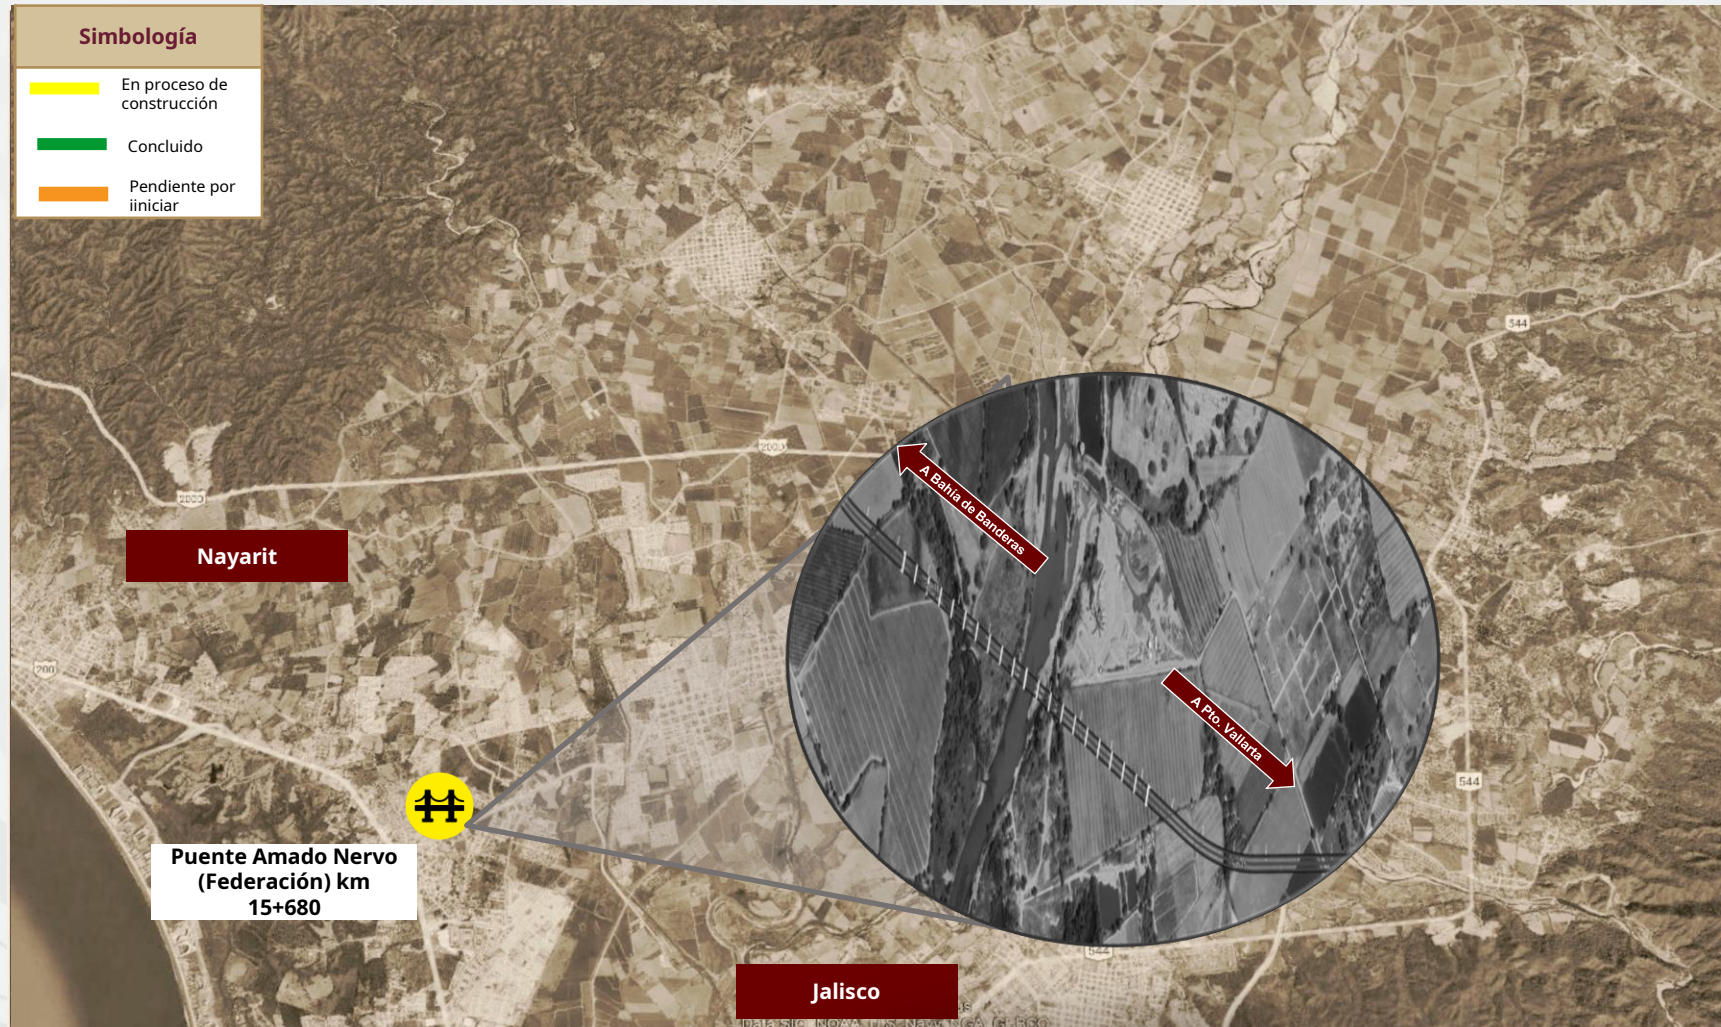

 **Inversión total 2025-2026:** 930.0 mdp
Meta total: 1 Puente | 0.798 km
Accesos | **1.222 km**

 **Inversión 2025:** 230.0 mdp
Meta 2025: 0.7 km de Puente
Inversión 2026: 700.0 mdp
Meta 2026: 1.32 km

 **Inicio:** 14 de julio de 2025
Término: Septiembre de 2026

 **479,471** habitantes beneficiados

 **2,700** empleos generados

 **25 min** ahorro en tiempo

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.


Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 30 al 05/02/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	7,866.2	56.0%	6,175.8	6,175.80	0	Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco
Cortes	m3	10,823.0	0.0	0.0%	10,823.0	10,823.00	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	52,366	32.5%	108,751.0	3,450.50	5,116	Se continuan trabajos de pedraplén en lado Jalisco.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	309.60	0	
Losa de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	484.80	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	11.00	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	126	100.0%	0	0	0	Concluidos
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	125	99.2%	1	7	0	Se tienen coladas 125 columnas restando una del apoyo 11.
Cabezales	pza.	21	18	85.7%	3	1	0	Se tienen colados 18 cabezales de los apoyos 1 al 6, 8, 9 y 12 al 21
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	114	71.3%	46	6	21	Se tienen coladas 114 trabes y se trabaja en los armados de 2 adicionales.
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	86	53.8%	74	8	14	Se tienen montados los claros 5-6, 14-15 , 16-17, 18-19 y 19-20. Se encuentran en proceso 4-5 y 17-18
Losas y Diafragmas	m3	4,450.40	0	0.0%	4,450.40	278	0	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	399	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	2.3	57.5%	1.70	2	0	Se continúa el acomode cajones de concreto prefabricados en el lado Jalisco.
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	1.3	65.0%	0.70	0.7	0	Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

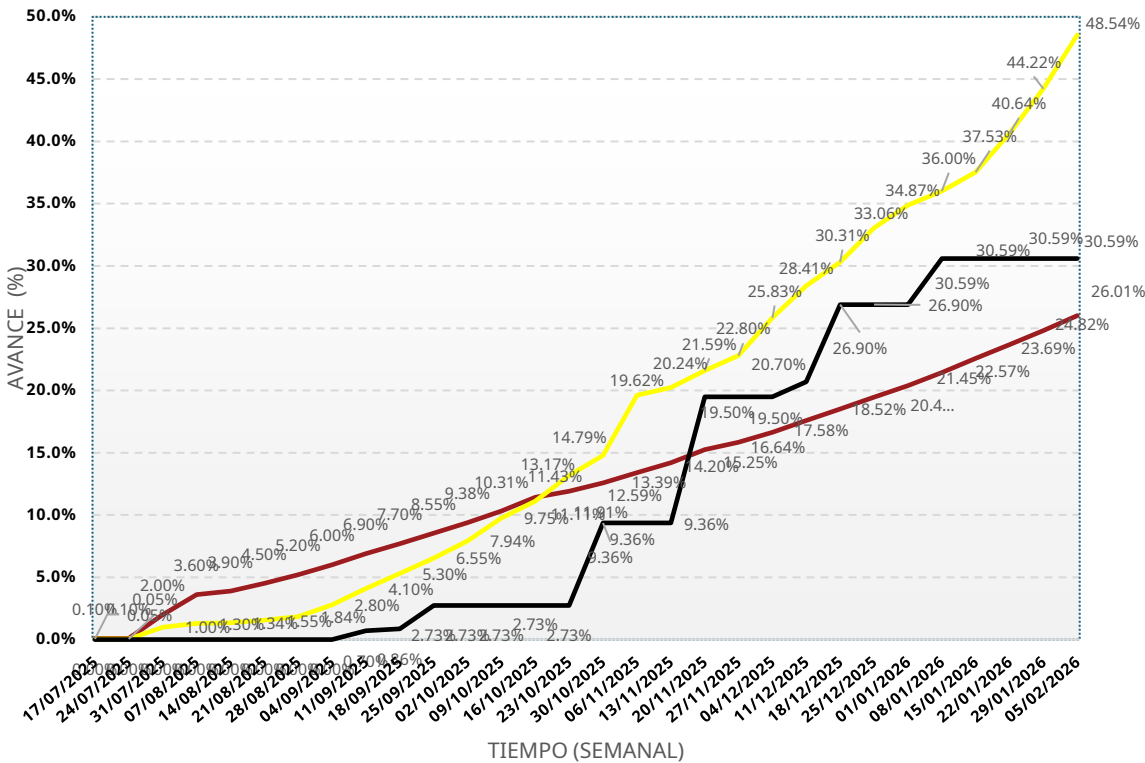

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	23 de Enero al 29 de Enero	30 de Enero al 05 de Febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	88	93
Maquinaria	21	21
Frentes de trabajo	5	5
