

PSF Arco Sur


Colima

Avance global

- Programado: 64.16%
- Real: 65.27%
- Semanal: 2.17%
- Financiero: 47.22%

- **Inversión total 2025-2026:** 630 mdp
- Inversión 2025:** 280 mdp
- Inversión 2026:** 350.0 mdp
- **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)
- Meta 2025:** 0.55 km (46% del puente (superestructura y accesos))
- Meta 2026:** 0.65 km (54% del puente (superestructura y accesos))
- **Inicio:** 03-Julio de 2025
- Término:** abril de 2026
- Término meta 2025:** Diciembre
- Término meta 2026:** Abril
- **157,048** habitantes beneficiados
- **1,431** empleos generados
- **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN CONTRATO FINALIZADO 31-DIC-2025

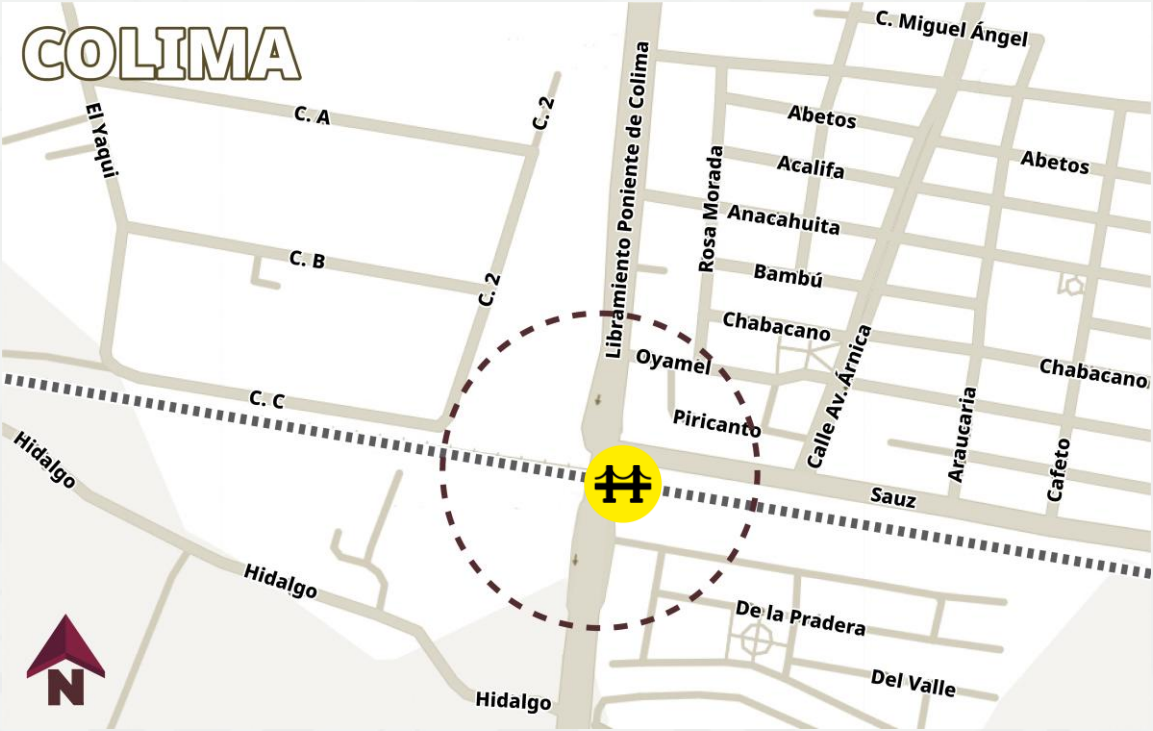

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	30/01/2026 al 05/02/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2, 477.55	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Puente lateral (pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida.
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	994.56	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	790.42	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Accesos al PSF (m)	896.00	437.74	458.26	43.48	52.78	
Subestructura PSF						
Pilas (pza)	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Columnas (pza)	40.00	40.00	0.00	0.00	4.00	Partida concluida
Cabezales (pza)	24.00	21.48	2.52	0.00	0.48	
Apoyos (pza)	168.00	5.16	162.84	8.17	0.00	

