

Puente El Chical

Colima

Avance global

• Programado: 67.75 %

• Semanal: 0.85 %

• Real: 85.08%

• Financiero: 24.0 %

**Inversión total 2025-2026:** 137 mdp
Meta total: 0.736 km


**Inversión 2025:** 43 mdp
Meta 2025: 24.0 % del Puente
Inversión 2026: 94 mdp
Meta 2026: 76.0 % del Puente

**Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: Marzo, 2026

**4,053** habitantes beneficiados

**411** empleos generados

**15 min** ahorro en tiempo

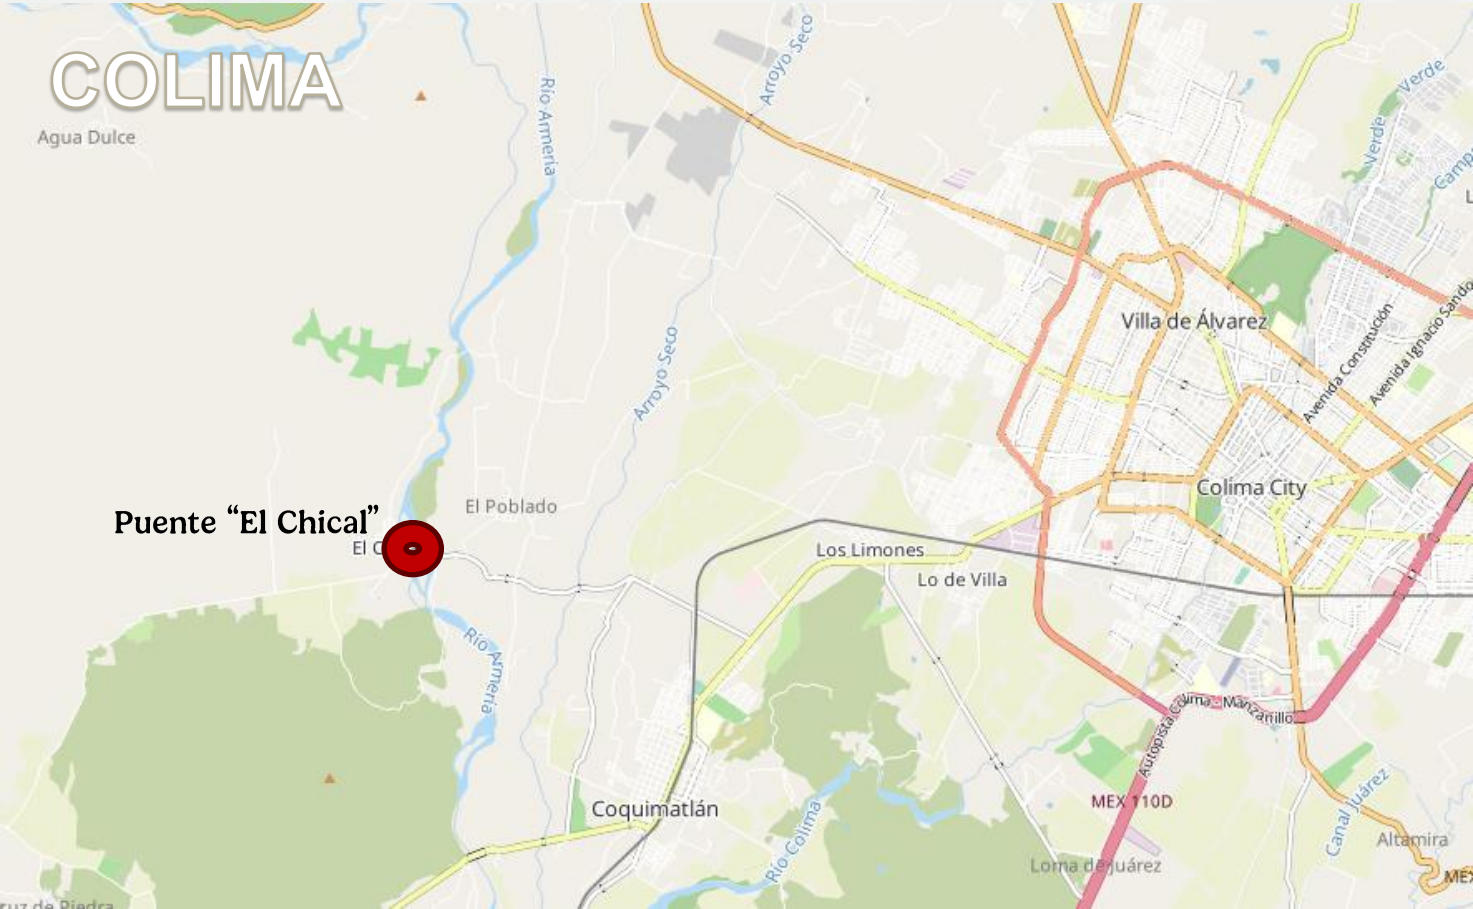


Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERIA, S.A DE C.V

Puente El Chical

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	30/01/26 al 05/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	
Columnas (Pza)	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes (Pza)	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	648.0	0.0	72.0	72.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	400.0	320.0	160.0	160.0	
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	125,000.0	0.0	0.0	0.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

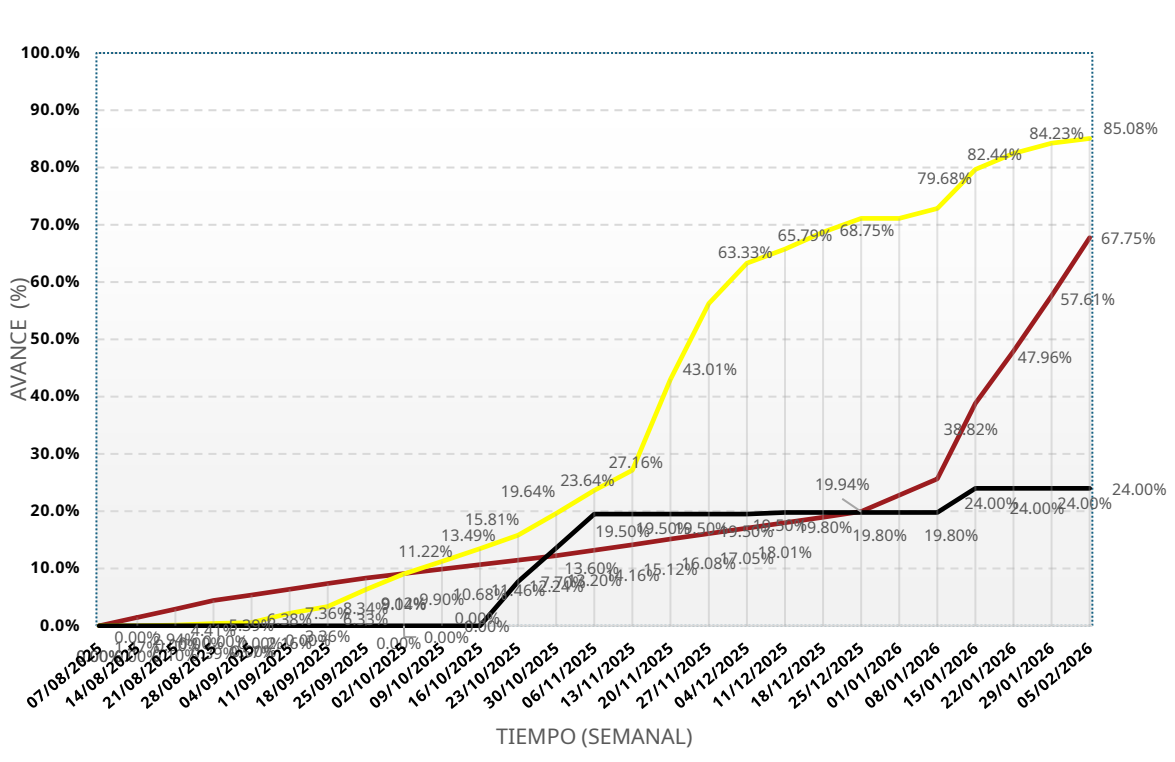

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	23 de Enero al 29 de Enero	30 de Enero al 05 de Febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	31	31
Maquinaria	5	5
Frentes de trabajo	5	5
