


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 59.19%
- Real: 41.53%
- Semanal: 0.83%
- Financiero: 39.0%

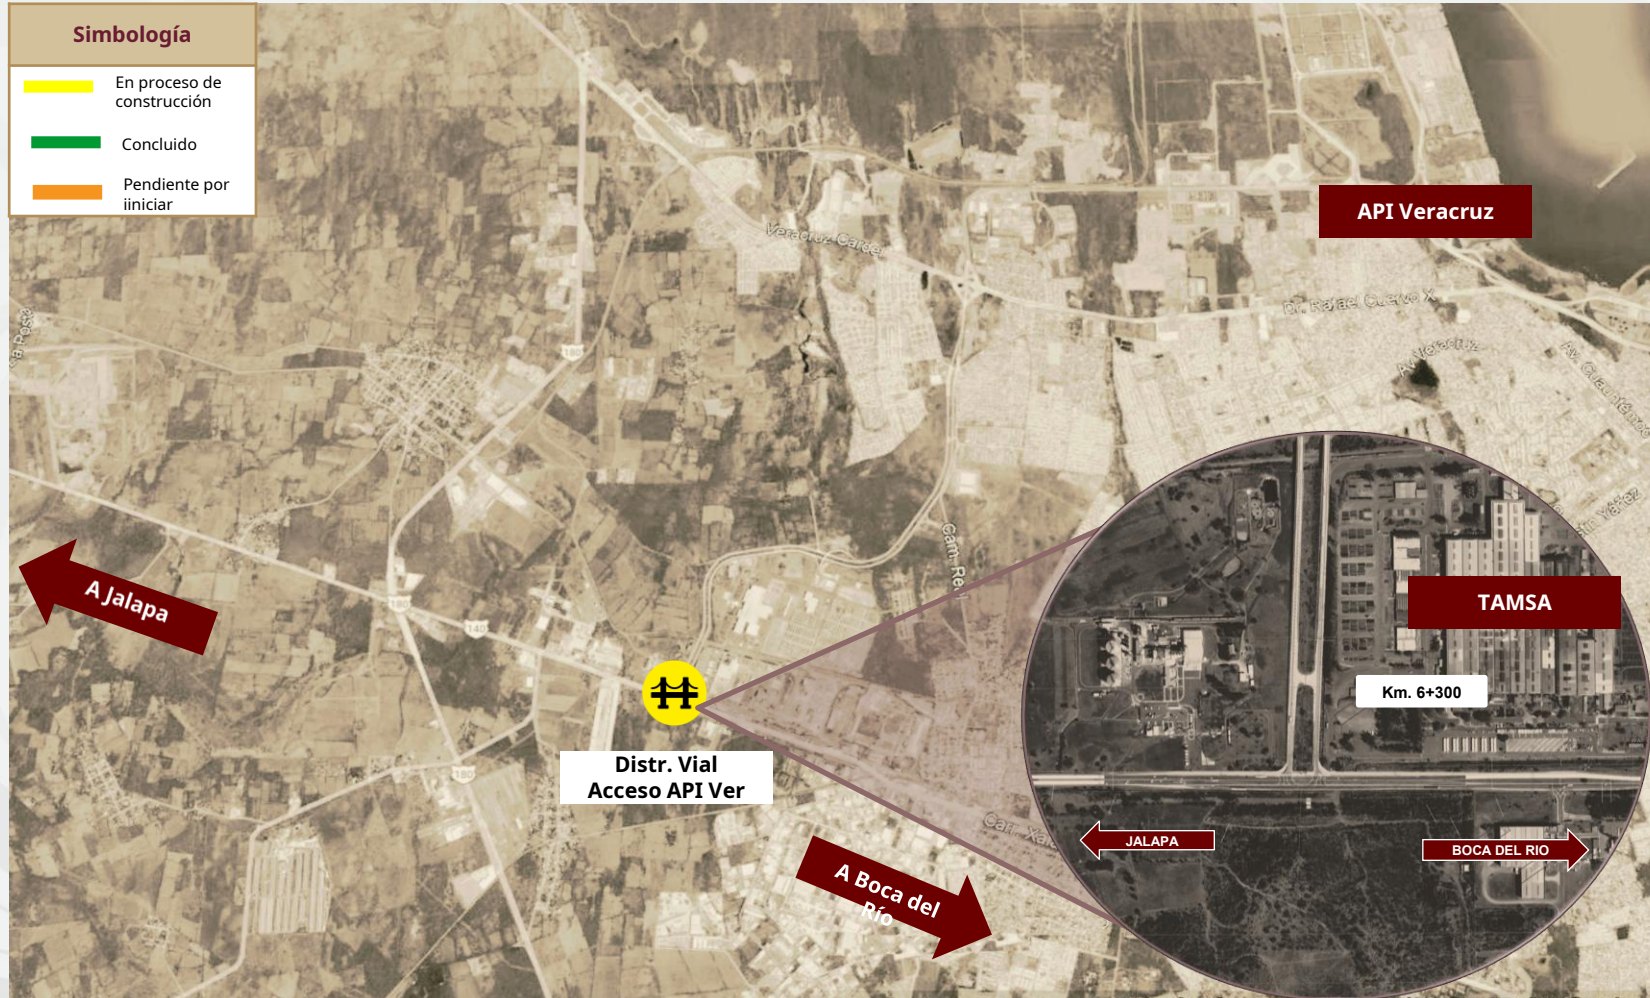

-  **Inversión total: 867.3 mdp**
Meta total 2025-2026: 1.97 km
-  **Inversión 2025: 367.3 mdp**
Meta 2025: 0.78 km de PSV
Inversión 2026: 500 mdp
Meta 2026: 1.18 km de PSV
-  **Inicio: 14 de julio de 2025**
Término meta total: junio de 2026
-  **780,441** habitantes beneficiados
-  **2,602** empleos generados
-  **25 min** ahorro en tiempo

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 30 al 05/02/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.00	622.50	0.0	Concluido en el cpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.09	0.0	
Excavaciones	m³	52,059.00	36,571.0	70.2%	15,488.00	3,718.50	0.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	27,530.0	75.1%	9,120.00	2,617.90	0.0	Se continúa con la formación de la subrasante del km 94+200 al 94+500
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	1,377.9	90.0%	153.10	127.60	0.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	548.00	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	95.0	0.0%	2,995.00	386.30	95.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	0.20	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Montaje de trabes	pza.	132	132	100.0%	0	19	15	Concluido en el cpo B
Diafragmas	pza.	110	90	81.8%	20	14	5	
Losa (claro)	pza.	22	18	81.8%	4	4	1	Se tienen concluidas las losas del 16 al 22 y del claro 7 al 9 y en proceso de construcción 2 losas

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

