

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 57.13%
- Real: 69.48%
- Semanal: 0.13%
- Financiero: 45.43%



Inversión total 2025-2026: 700 mdp
Meta total: 1 Deprimido (1.5 km) y Gasas (4.1 km)



Inversión 2026: 380 mdp
Meta 2026: 0.22 km de Deprimido y 3.83 km de gasas



Inicio: 12 de mayo de 2025
Término: abril de 2026



351,000 habitantes beneficiados



2,100 empleos generados



25 min ahorro en tiempo



Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)




Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	30/01/26 al 05/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Reforzamiento Puente Peatonal (lote)	1.0	0.1	0.9	0.25	0.1	
Terracerías y Pavimentos						
Terracerías (m3)	14,112.0	7,990.4	6,121.6	940.8	500.0	
Excavación núcleo (m3)	100,069.2	76,748.0	23,321.2	0.0	884.0	
Base hidráulica (m3)	11,840.0	7,447.0	4,393.0	1,315.6	903.7	
Base asfáltica (m3)	5,545.0	194.8	5,350.2	616.1	52.7	
Carpeta asfáltica (m3)	1,992.0	142.1	1,849.9	0.0	0.0	
Relleno fluido (m3)	1,680.0	0.0	1,680.0	336.0	0.0	
Pavimento rígido (m3)	3,552.0	0.0	3,552.0	507.4	0.0	
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas (pzas)	12.0	12.0	-	-	-	Concluido
Muros de 2 a 7 m (pzas)	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	Concluido
Trabes de liga (m)	1,123.6	678.0	445.6	0.0	100.0	
Contratrabes Metálicas (pza)	29.0	0.0	29.0		0.0	
Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	52.0	-	-	-	Concluido
Concreto lanzado (m2)	7,000.0	25.0	6,975.0	1,166.7	0.0	
Losas de acceso (m2)	609.8	509.0	100.8	0.0	0.0	
Losas puentes (m2)	1,642.8	962.1	680.7	0.0	0.0	
Parapeto (m)	1,725.2	295.0	1,430.2	0.0	75.0	
Guarnición (m3)	375.0	61.1	313.9	0.0	6.0	
Banquetas (m3)	3,304.2	130.0	3,174.2	0.0	3.0	
Drenaje Pluvial (m)	1,600.0	270.0	1,330.0	320.0	180.0	
Registros Pluviales (pza)	32.0	0.0	32.0	8.0	0.0	
Semaforización y Señalamiento						
Semaforización (%)	100.0	9.00	91.0	0.0	3.0	
Horizontal (m)	29,901.7	0.0	29,901.7	0.0	0.0	
Vertical (pza)	273.0	0.0	273.0	0.0	0.0	
Obra inducida						
Alumbrado (pza)	305.0	0.0	305.0	0.0	0.0	

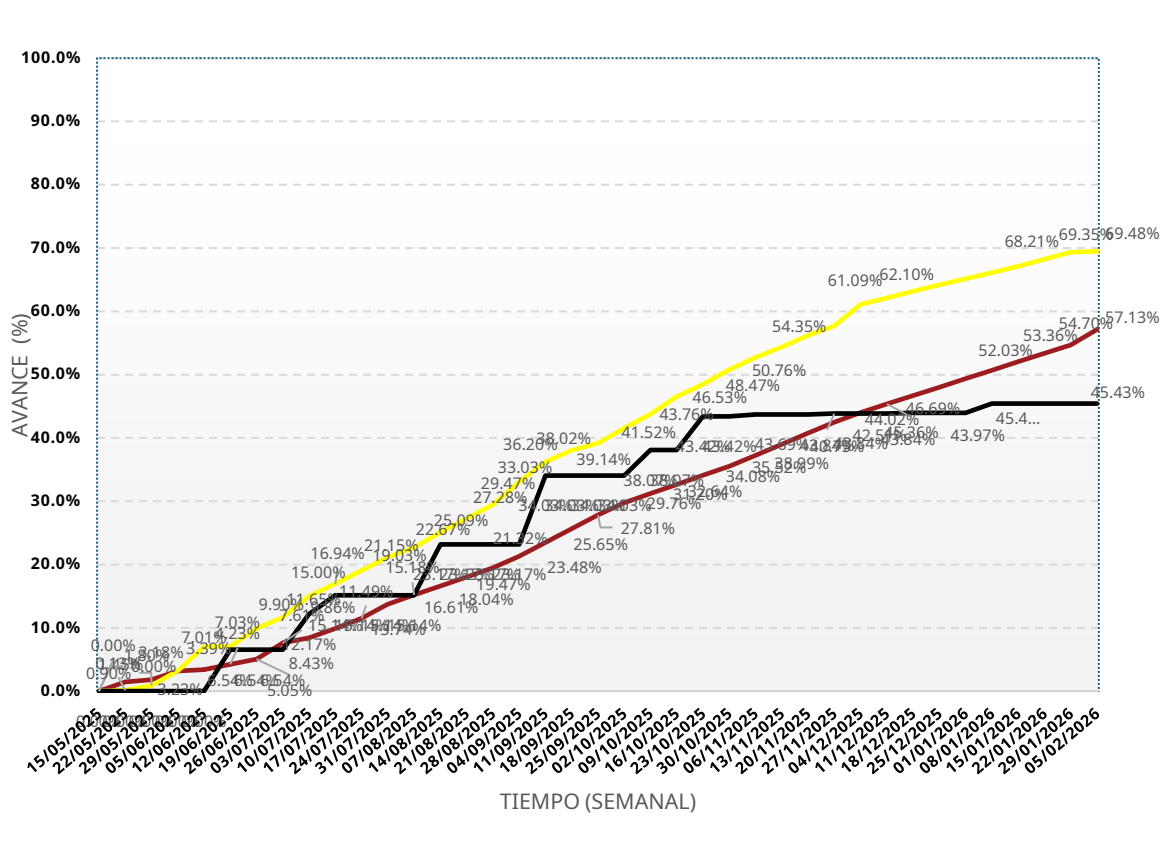

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	23 de enero al 29 de enero	30 de enero al 05 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	102	102
Maquinaria	18	18
Frentes de trabajo	9	9
