

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

La fecha de terminación contractual es agosto 2026

Avance global

- Programado: 64.74%
- Real: 78.23%
- Semanal: 3.27%
- Financiero: 60.13%

 **Inversión total 2025-2026:** 405.0 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total

 **Inversión 2025:** 225.0 mdp
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km

 **Inicio:** 18 de agosto de 2025
Término: febrero 2026 *


 **862,037** Habitantes beneficiados

 **1,140** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

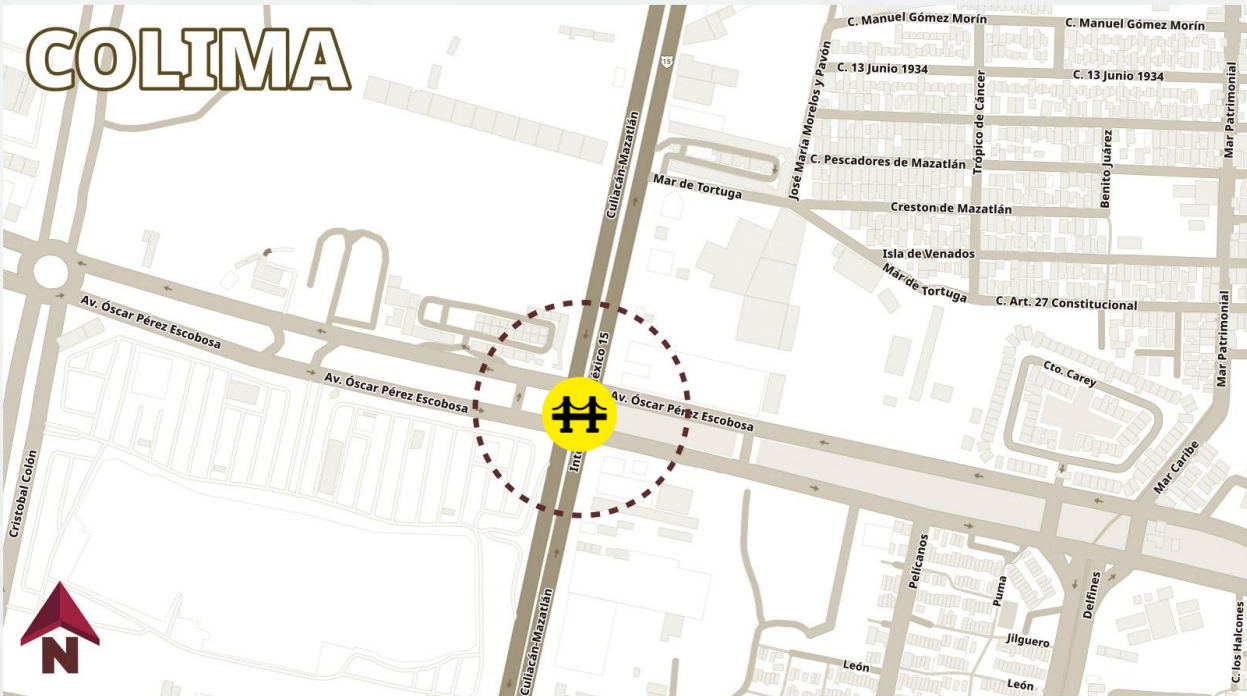


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

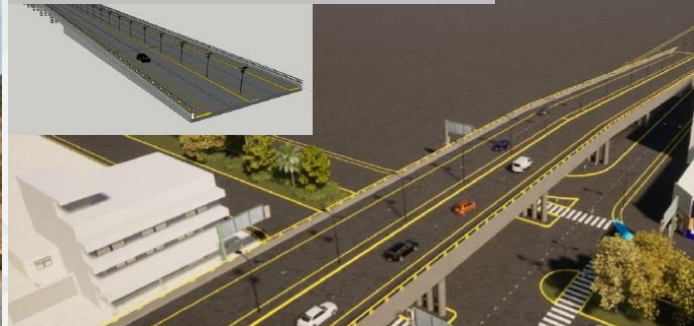

Proyecto


* Primera etapa

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 30 al 05/02/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.0	0.0	Falta proyecto de semaforización y diseño
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Superestructura	Actividad	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Fabricación de Trabes AASHTO IV								
Superestructura	pieza	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Montaje de Trabes AASHTO IV								
Superestructura	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Fabricación de Trabes Nebraska								
Superestructura	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Montaje de Trabes Nebraska NU240								
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico Accesos	m3	5,266	1,017	19.3%	4,249.0	0.00	1,014.0	
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	1.00	0.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	852.0	88.9%	106.0	179.00	315.0	
Parapeto	m	958.0	648.0	67.6%	310.0	0.00	164.7	
Pavimento Accesos	m3	5,266	1,017	19.3%	4,249	2,633	1,017.0	
Alumbrado	Actividad	2	1.0	50.0%	1	0	0.2	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0.0	
Barrera Central	m	587.0	280	47.7%	307.0	0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	1,813.0	36.0%	3,219.00	0	722.0	
Relleno Fluido	m3	3,992.0	509.0	12.8%	3,483.00	0	95.0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0.0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0.0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0.0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

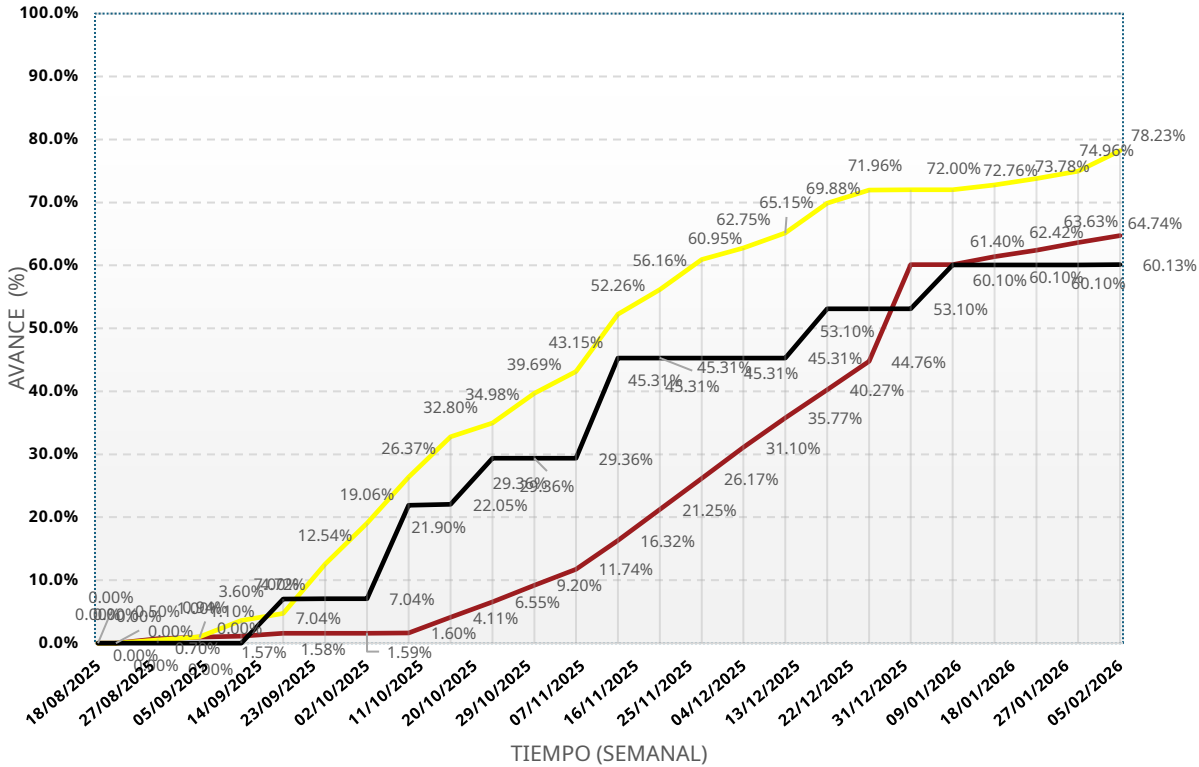

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 23 de Enero al 29 de Enero	Del 30 de Enero al 05 de Febrero
Personal	138	138
Maquinaria	13	13
Frentes de trabajo	9	9
