

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance global

- Programado: 30.49%
- Real: 39.90%
- Semanal: 0.60%
- Financiero: 24.10%



Inversión total 2025-2026: 740 mdp

Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inversión 2026: 140 mdp

Meta 2026: 38% de 1 Distribuidor Vial

Inversión 2026: 600 mdp

Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial



Inicio: 16 de julio de 2025

Término meta 2025: Diciembre 2025

Término meta total: julio de 2026




73,215 habitantes beneficiados



2,220 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

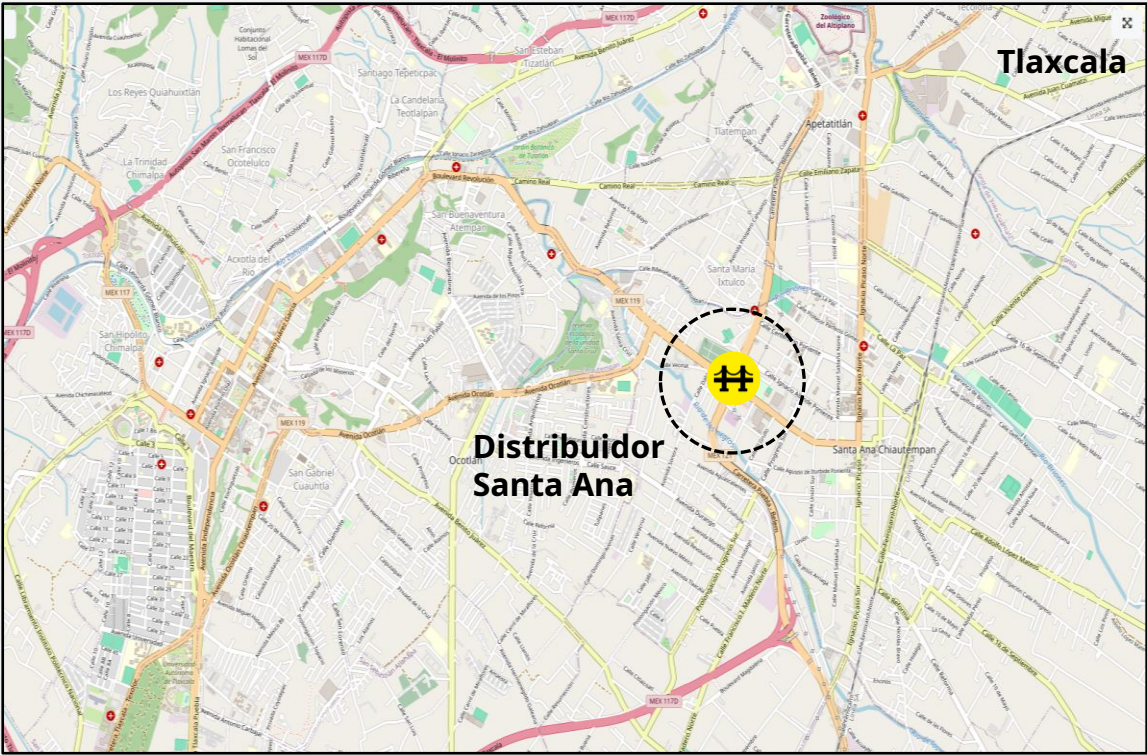


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.



Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	30 al 05-02-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	39.90% 1 Distribuidor Vial	60.10% de 1 Distribuidor Vial	0.52%	0.60%	Se trabaja en: Construcción de cabezales eje # 3 y 12, zapata del eje #6 y pilas en la ampliación del puente Río de los Negros.

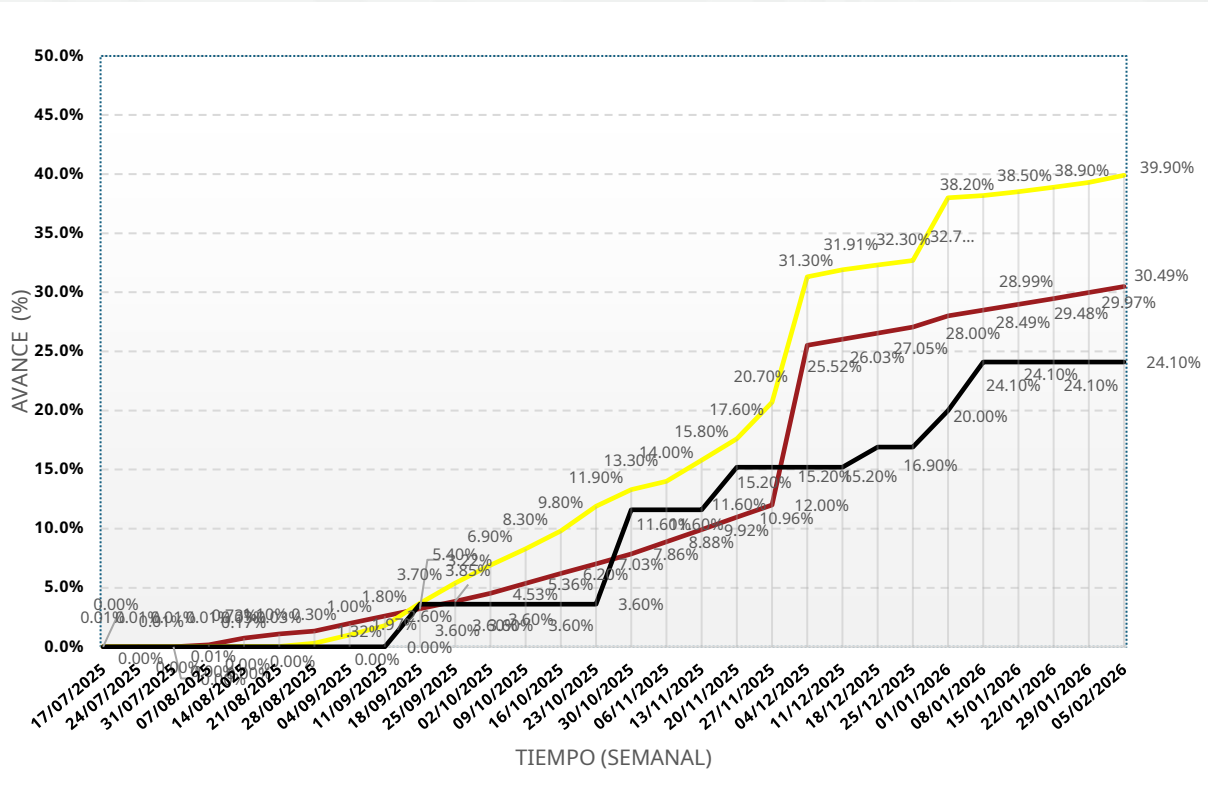

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	23 al 29 de enero	30 al 05 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	97	82
Maquinaria	17	14
Frente de trabajo	10	7
