

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance global

- Programado: 59.00 %
- Real: 52.08 %
- Semanal: 3.26 %
- Financiero: 29.98 %

 **Inversión total 2025-2026:** 86.0 mdp
Meta total: 0.601 km


 **Inversión 2025:** 31.0 mdp
Meta 2025: 38.6 % del Puente
Inversión 2026: 55.0 mdp
Meta 2026: 61.4 % del Puente

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: Abril, 2026

 **4,053** habitantes beneficiados

 **258** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

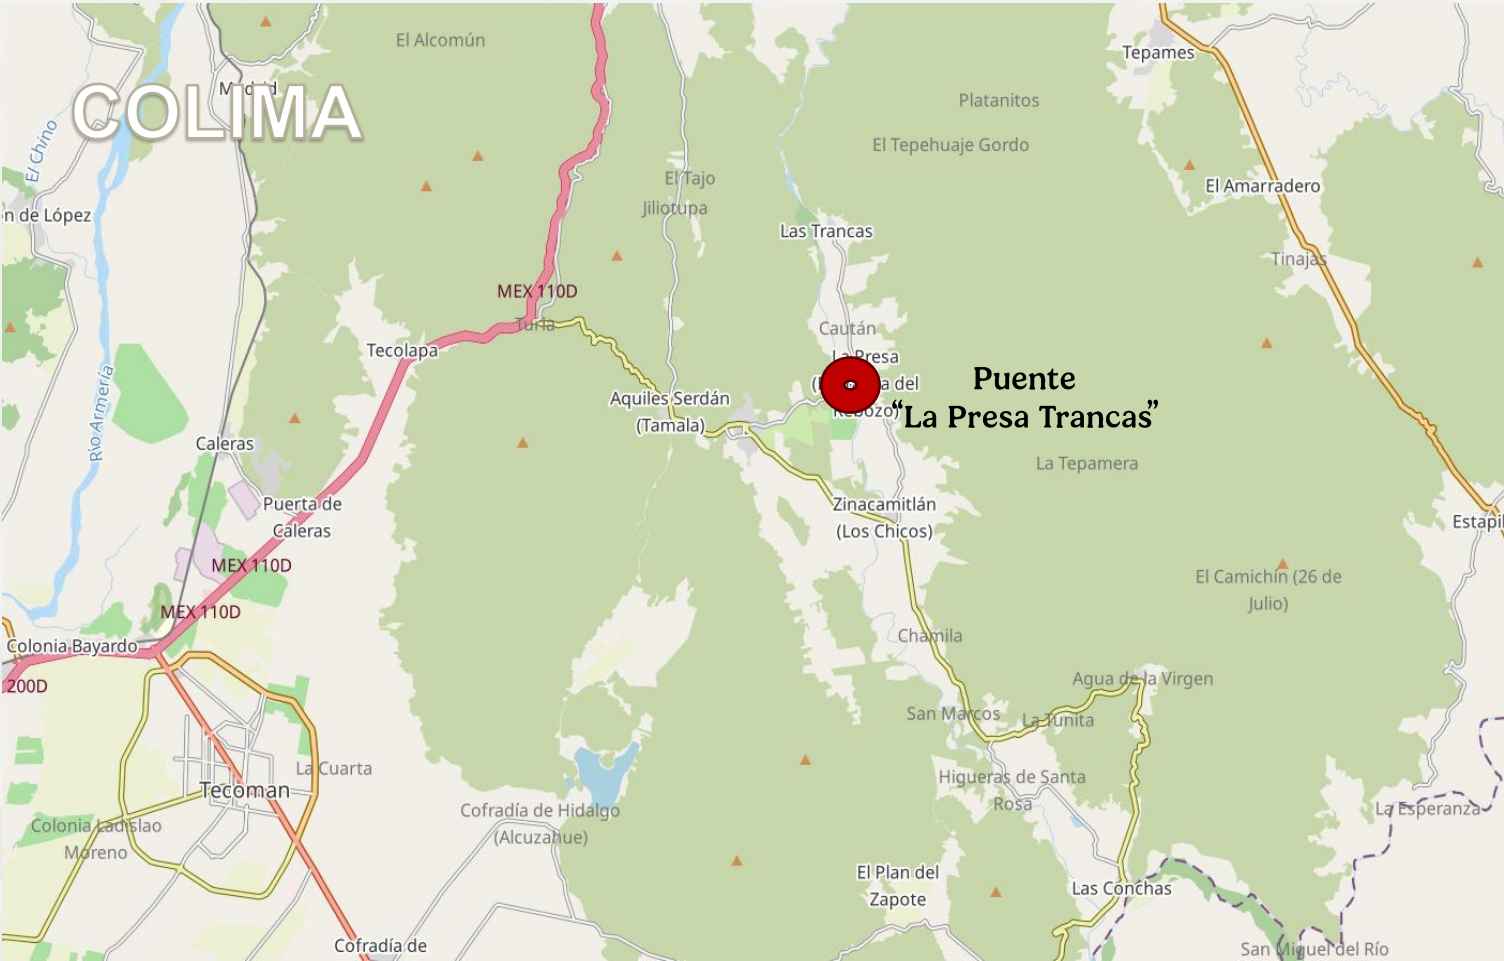


Tramo	Empresas
Construcción del Puente La Presa Trancas	• Contratista: GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERÍA, SA DE CV

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	30/01/26 al 05/02/26	
				Programado	Ejecutado
Preliminares					
Desmonte y Despalme (Ha)	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
Subestructura					
Pilas de cimentación (Perforación). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Armado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Colado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Columnas. Pza.	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Construcción de cabezales y bancos. Pza.	4.00	1.00	3.00	3.00	1.00
Superestructura					
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Fabricación)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)	18.00	0.00	18.00	6.00	0.00
Colado de diafragma y losa. M3	197.1	0.00	197.1	0.00	0.00
Carpeta asfáltica. M3.	220	0.00	220	0.00	0.00
Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.	43.8	0.00	43.8	0.00	0.00
Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.	182	0.00	182	0.00	0.00

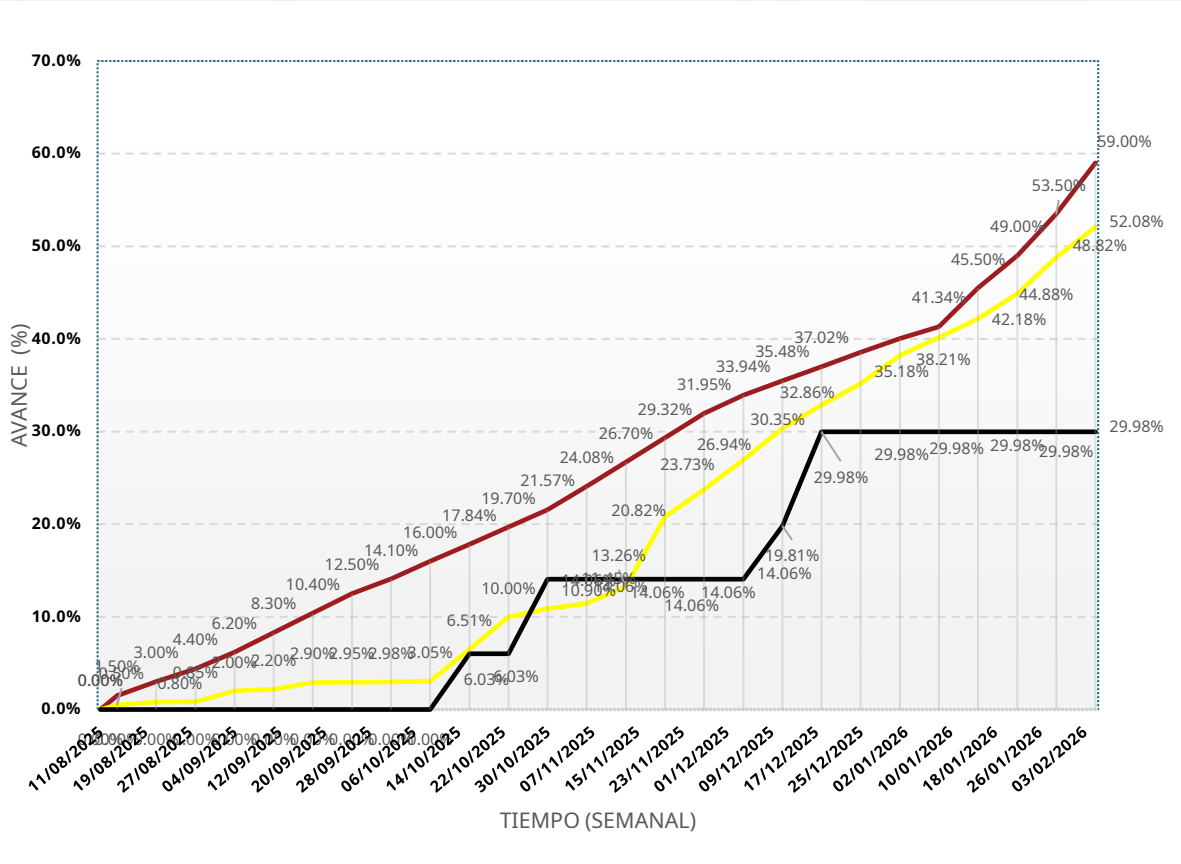

	23 de enero al 29 de enero		30 enero al 05 de febrero	
	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero	
Fuerza de Trabajo (personas)	57		58	
Maquinaria	7		9	
Frentes de trabajo	6		7	
