

CDMX

Alameda Oriente

Avance global

- Programado: 29.73%
- Real: 19.86%
- Semanal: 0.03%
- Financiero: 15.79%



Inversión total 2025-2027: 2,000 mdp
Inversión 2025: 317 mdp
Inversión 2026: 670 mdp



Meta total: 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.
Meta 2025: 16.86% de 2 puentes
Meta 2026: 33.86% de 2 puentes



Inicio: 17 de junio de 2025
Término: Octubre 2027
Término meta 2026: Diciembre



1,798,474 habitantes beneficiados



6,000 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Beneficios: Contribuye a mejorar la conectividad de la zona oriente de la CDMX y EDO. MEX. mejorando el nivel de servicio, actualmente el Puente 1 opera en doble sentido de circulación (2 carriles en sentido Sur-Norte y 1 sentido Norte-Sur) debido al daño estructural en el Puente 2 ocasionado por los sismos de los años 2017, 2020 y 2021, reduciendo la capacidad de movilidad de 6 a 3 carriles.

Empresas

- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes




Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado		13/feb/26 al 19/feb/26	
			Acumulado	Faltante	Programado	Ejecutado
Estudios (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Demolición y retiro de estructura (Puente 2)	500	m	500	0	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento de señal tipo puente (Puente 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 2)	4,740.4	m3	4,169.54	570.86	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puente 2)	58,115.16	m3	9,878.43	48,236.73	0	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 2)	42,615.03	m3	14,133.19	28,481.84	0	0
Construcción de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puente 2)	1,892	Pzs	1,892	0	0	0
Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puente 2)	1,892	Pzs	812	1,080	92.62	39
Excavación para desplante de Zapatas (Puente 2)	1,984.10	m3	0	1,984.1	165.34	0
Construcción de Zapatas (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0.3	0
Excavación para desplante de Cajones (Puente 2)	1,984.10	m3	1,564.15	419.95	152.62	0
Construcción de Cajones (Puente 2)	8.00	Pzs	0	8	0.64	0
Construcción de Columnas (Puente 2)	11.00	Pzs	0	11	1.67	0
Construcción de Cabezales (Puente 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Fabricación de trabes pretensadas (Puente 2)	44.00	Pzs	5	39	0.57	0
Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puente 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Fabricación de trabes de Acero (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0.30	0
Traslado y montaje de trabes de Acero (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0.27	0
Construcción de Losas de calzada (Puente 2)	10.00	Claros	0	10	0	0
Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puente 2)	960.00	m	0	960	0	0
Construcción de Accesos (Puente 2)	1.00	Accesos	0	1	0	0
Construcción de línea de alumbrado publico (Puente 2)	1.00	Línea	0	1	0	0
Señalamiento Horizontal y Vertical (Puente 2)	1.00	Lote	0	1	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 1)	5,222.6	m3	4,546	676.6	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puente 1)	64,026.84	m3	10,051.18	53,975.66	0	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 1)	46,949.97	m3	12,180	34,769.97	0	0

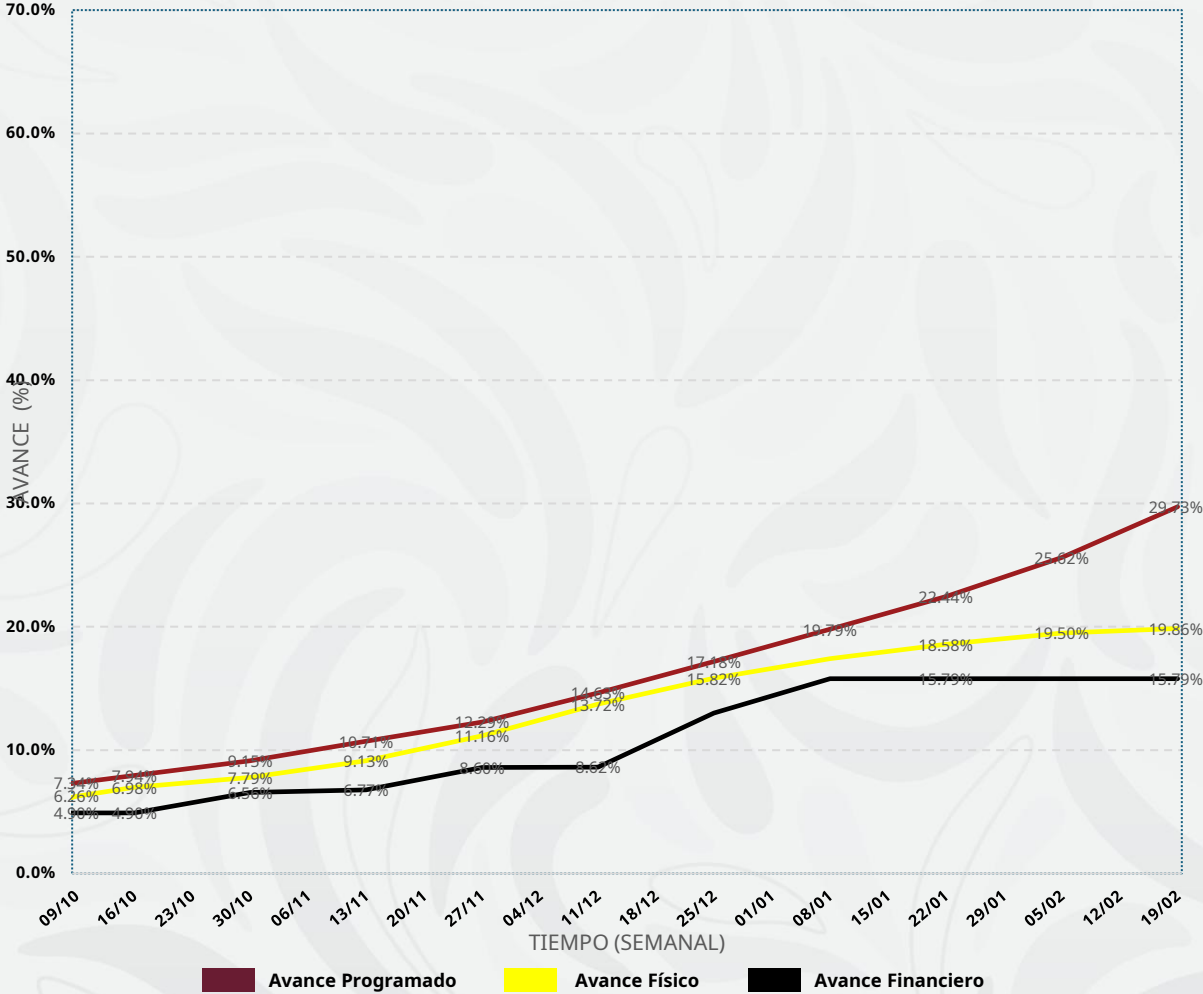

	Del 06 al 12 de febrero de 2026	Del 13 al 19 de febrero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	60	71
Maquinaria	24	24
Frentes de trabajo	6	8
