



Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo



Inversión total: 484 MDP

Avance físico

- Programado: 2.7%
- Real: 2.7%
- Semanal: 0.7%
- Financiero: 0.0%



Meta total: 0.77 km longitud total.

- 0.65 km puente
- 0.12 km accesos



Inicio: 06 Abril de 2026
Término: Octubre 2026



Más de 1,320,00 de habitantes beneficiados



2,890 empleos generados



5 minutos ahorro en tiempo

Beneficios:

- Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes.
- Fortalecer la seguridad de los residentes y turistas de la zona turística ante situaciones de contingencias ambientales
- Población beneficiada: 20 millones de turistas al año
- **Es un distribuidor vial que cuenta con un paso superior con dos cuerpos separados para alojar dos carriles de circulación por sentido y calles laterales para servicios locales**



SITUACIÓN ACTUAL



IMAGEN OBJETIVO

Tramo	Empresas
Construcción distribuidor vial Kukulcán.	• Contratista: Grupo Formado por las empresas: Consorcio de Ingenieros Constructores y consultores, S.A. de C.V y ASCH, S.A. de C.V. • Supervisión: En espera de fallo.


Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

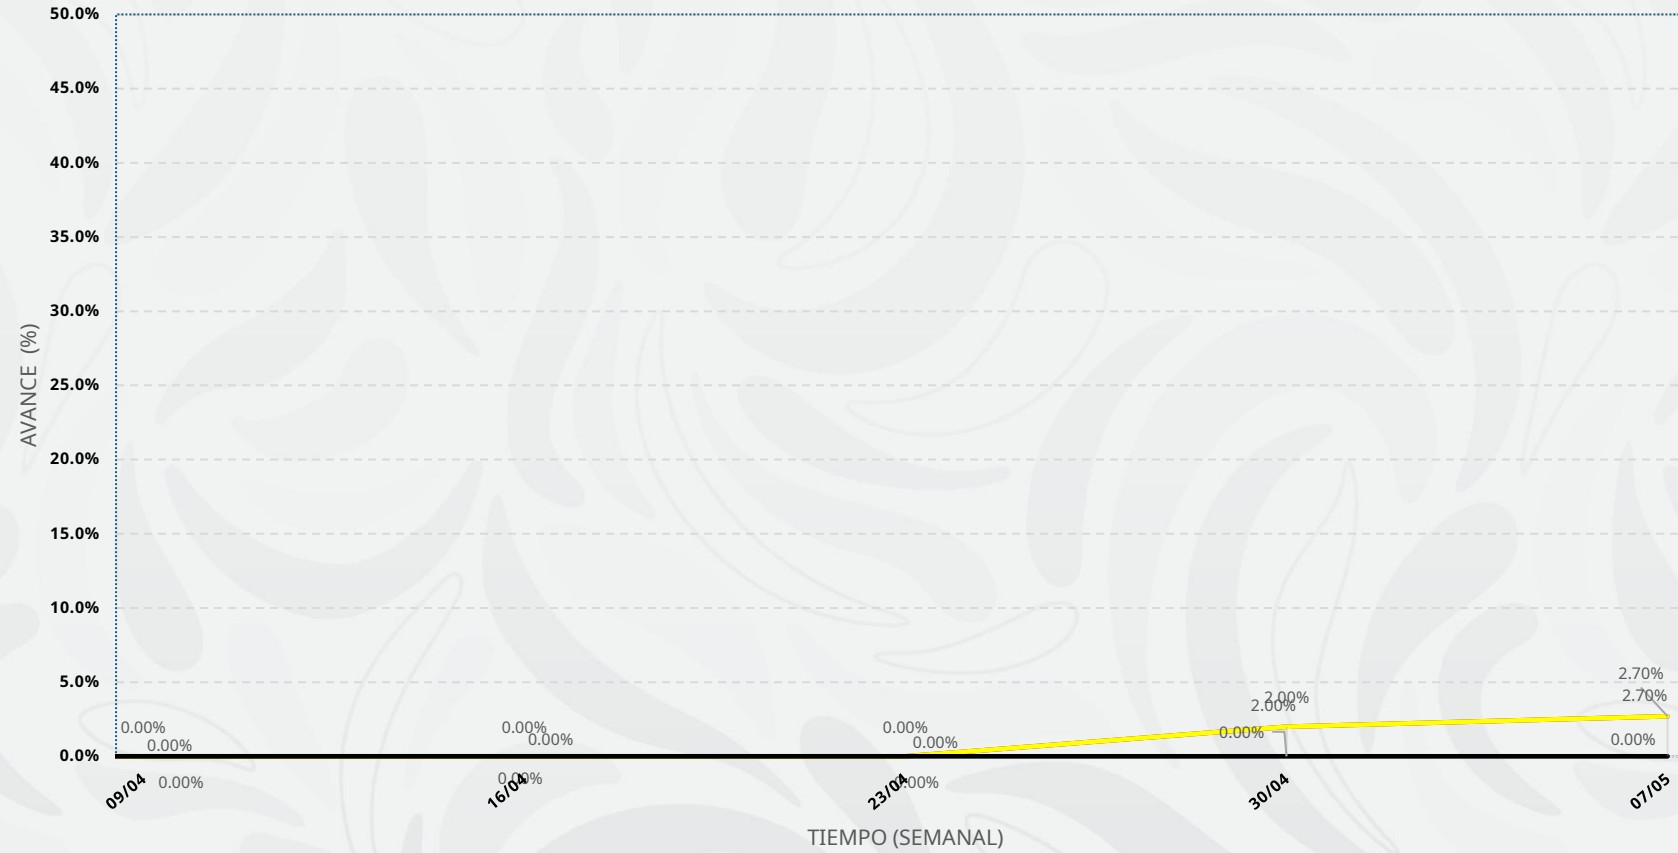

■ Avance Programado ■ Avance Físico ■ Avance Financiero

Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Perforación para pilas, cuerpo B



Suministro de acero, cuerpo B



Armado de acero para pilas, cuerpo B



Armado de acero para pilas, cuerpo B
