

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 43.73%
- Real: 48.90%
- Semanal: 0.60%
- Financiero: 45.40%



Inversión total 2025-2026: 740 mdp

Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inversión 2025: 140 mdp

Meta 2025: 38% de 1 Distribuidor Vial

Inversión 2026: 600 mdp

Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial



Inicio: 16 de julio de 2025

Término meta 2025: Diciembre 2025

Término meta total: Julio de 2026



73,215 habitantes beneficiados



2,220 empleos generados




20 min ahorro en tiempo

Beneficios Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.


Paso superior con dos carriles por sentido

Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

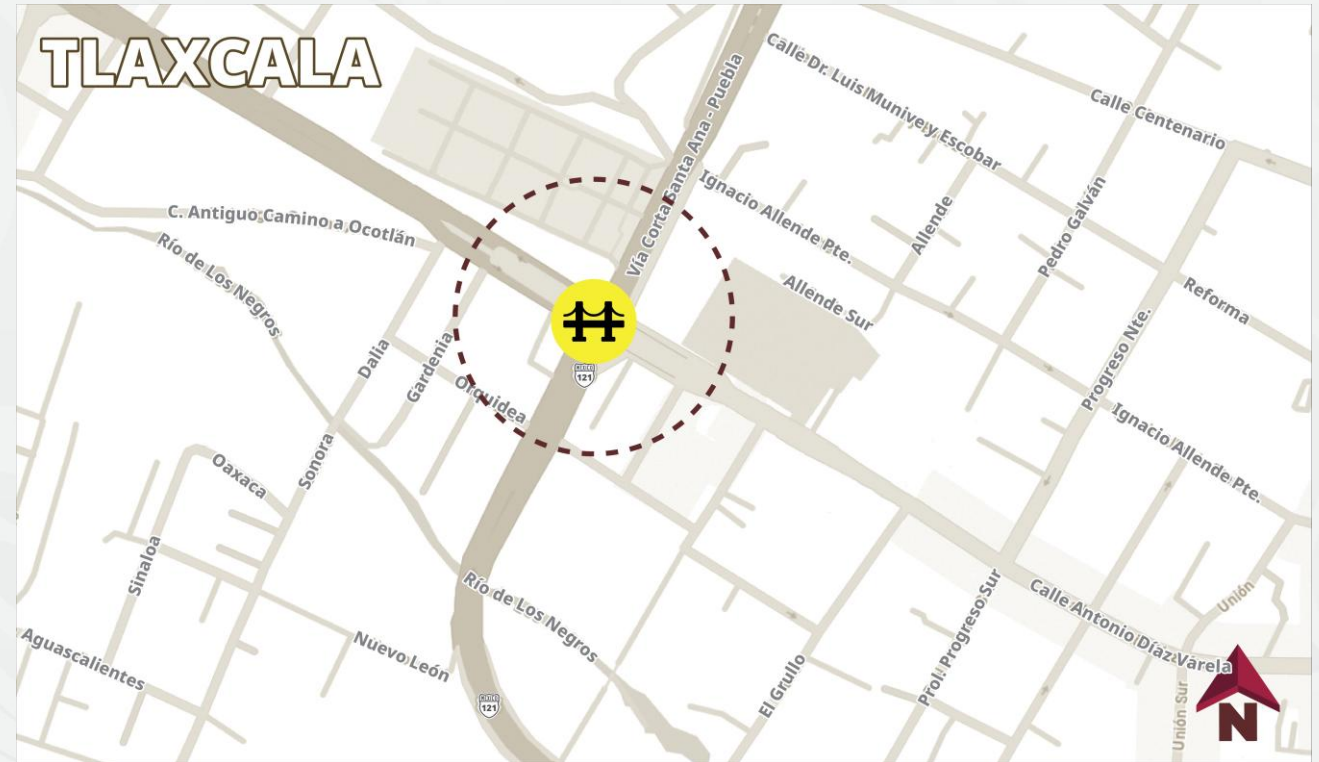

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	Del 24-04-26 al 30-04-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	48.90% 1 Distribuidor Vial	51.10% de 1 Distribuidor Vial	1.72%	0.60%	Se trabaja en: Sobre losa de cabezales metálicos, montaje de trabes y construcción de pilas de 1.50 m de φ.

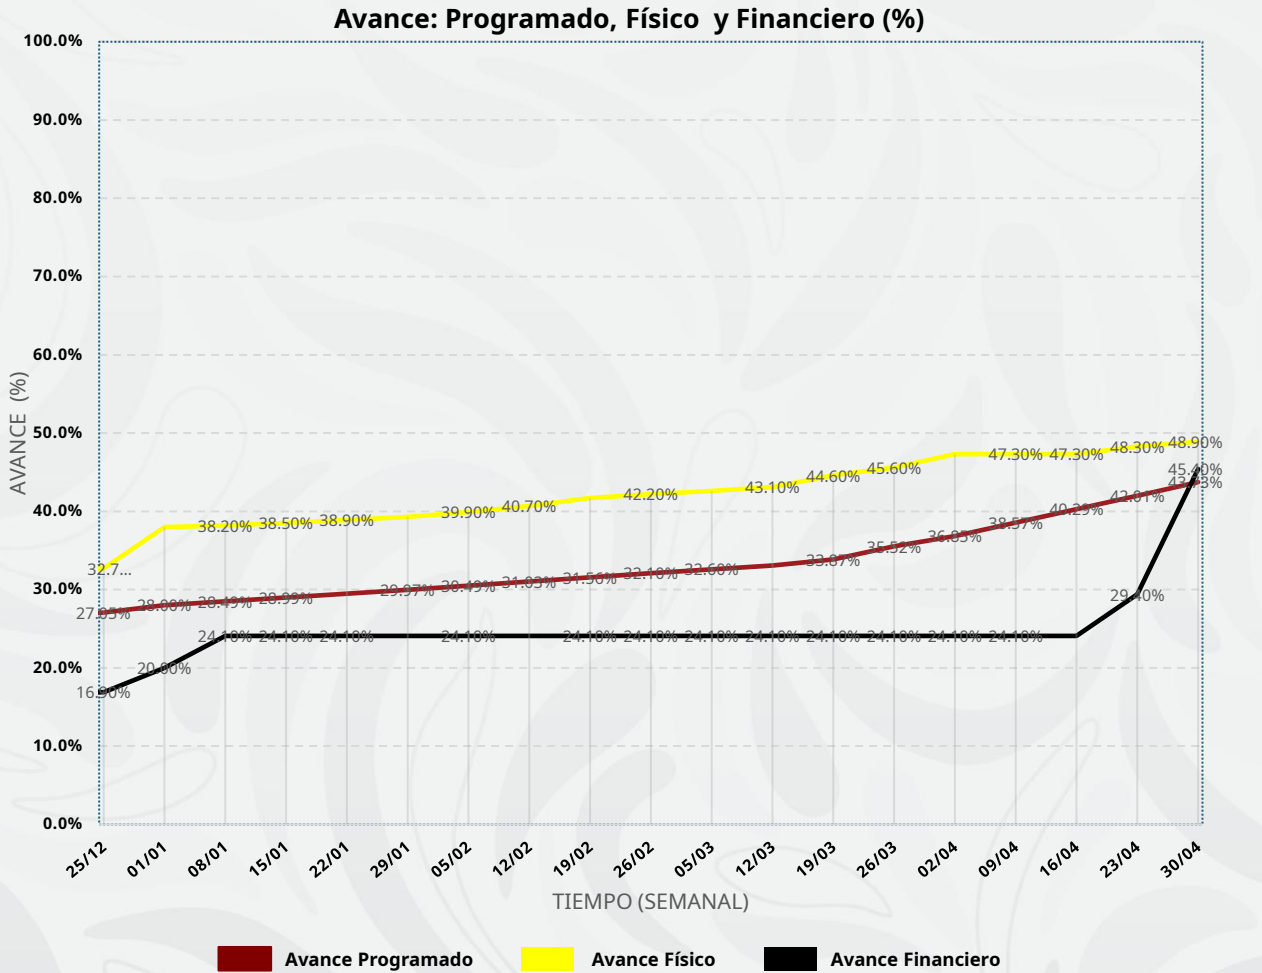

	17 al 23 de abril	24 al 30 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	43	53
Maquinaria	13	13
Frente de trabajo	4	5
