

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance global

• Programado: 17.84 %

• Real: 6.51 %

• Semanal: 3.46 %

• Financiero: 6.03 %

Avance 2025

• Programado: 44.60 %

• Real: 16.28 %

• Semanal: 8.65 %

• Financiero: 15.09 %



Inversión total 2025-2026: 90.0 mdp

Inversión 2025: 30.0 mdp



Meta total: 0.601 km (0.092km de estructura, 0.509 km de accesos)

Meta 2025: 38.6 % del Puente



Fecha de inicio: 11 de agosto, 2025

Fecha de término: 10 de agosto, 2026

Termino meta 2025: 31 de diciembre




4,053 habitantes beneficiados



225 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

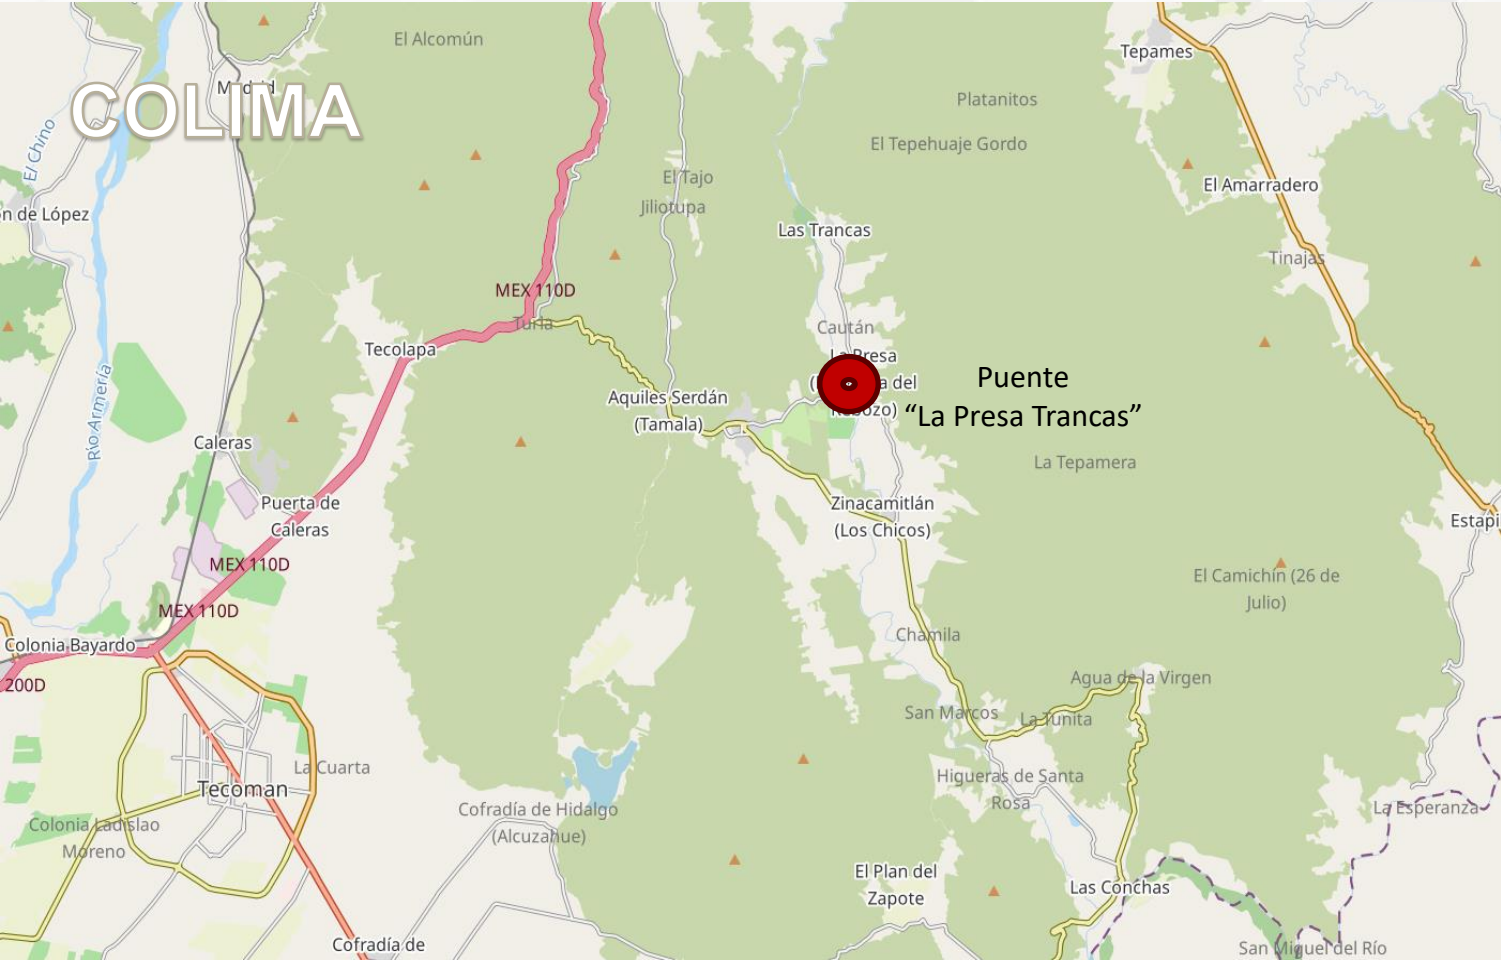


Tramo	Empresas
Construcción del Puente La Presa Trancas	• Contratista: GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERÍA, SA DE CV

Puente La Presa Trancas

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	10/10/25 al 16/10/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Desmonte y Despalme (Ha)	0.83	0.83	0	0	0	
Subestructura						
Pilas de cimentación (Perforacion). Pza.	26.00	4.00	22.00	22.00	0.00	
Pilas de cimentación (Armado). Pza.	26.00	14.00	12.00	12.00	3.00	
Pilas de cimentación (Colado). Pza.	26.00	3.00	23.00	23.00	1.00	
Columnas. Pza.	2.00	0.00	2.00	0.6	0.00	
Cnstruccion de cabezales y bancos. Pza.	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
Superestructura						
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza)	18	0	18	0	0	
Colado de diafragma y losa. M3	197.1	0	197.1	0	0	
Carpeta asfáltica. M3.	220	0	220	0	0	
Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.	43.8	0	43.8	0	0	
Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.	182	0	182	0	0	

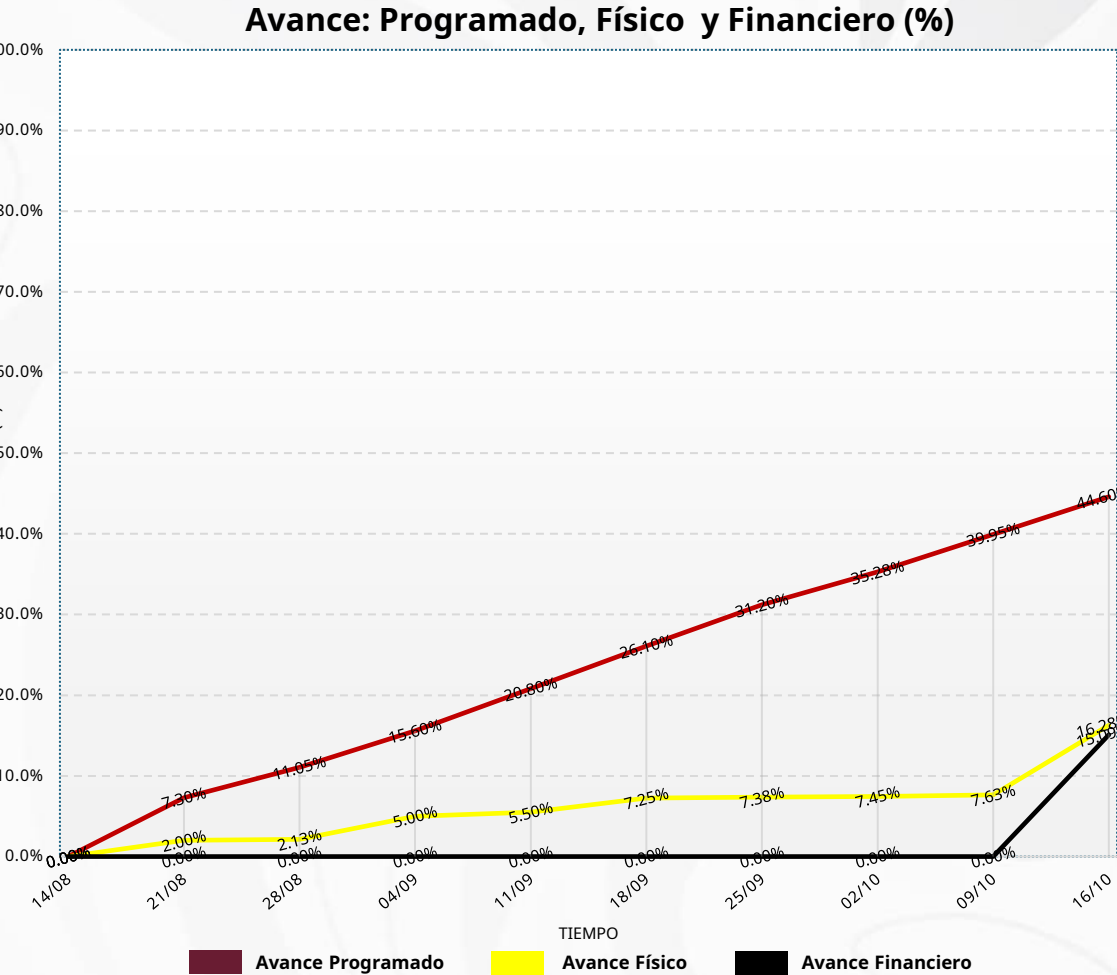

	03 de octubre al 09 de octubre	10 de octubre al 16 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	19	31
Maquinaria	7	7
