

CDMX

Alameda Oriente

Avance global

• Programado: 18.46%

• Real: 16.86%

• Semanal: 1.04%

• Financiero: 13.01%

Avance 2025

• Programado: 100%

• Real: 100%

• Semanal: 1.12%

• Financiero: 82.05%



Inversión total 2025-2027: 2,000 mdp

Inversión 2025: 317 mdp | (16.86% de 2 puentes)

Nota: El 03/dic/25 se asignaron 50 mdp adicionales al ejercicio fiscal 2025



Meta total: 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.



Inicio: 17 de junio de 2025

Término: Octubre 2027

Término meta 2025: Diciembre



1,798,474 habitantes beneficiados




6,000 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Empresas	
• Contratista:	CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
• Supervisión:	ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.

Se actualizo la meta física 2025 de acuerdo a lo ejecutado al cierre de año

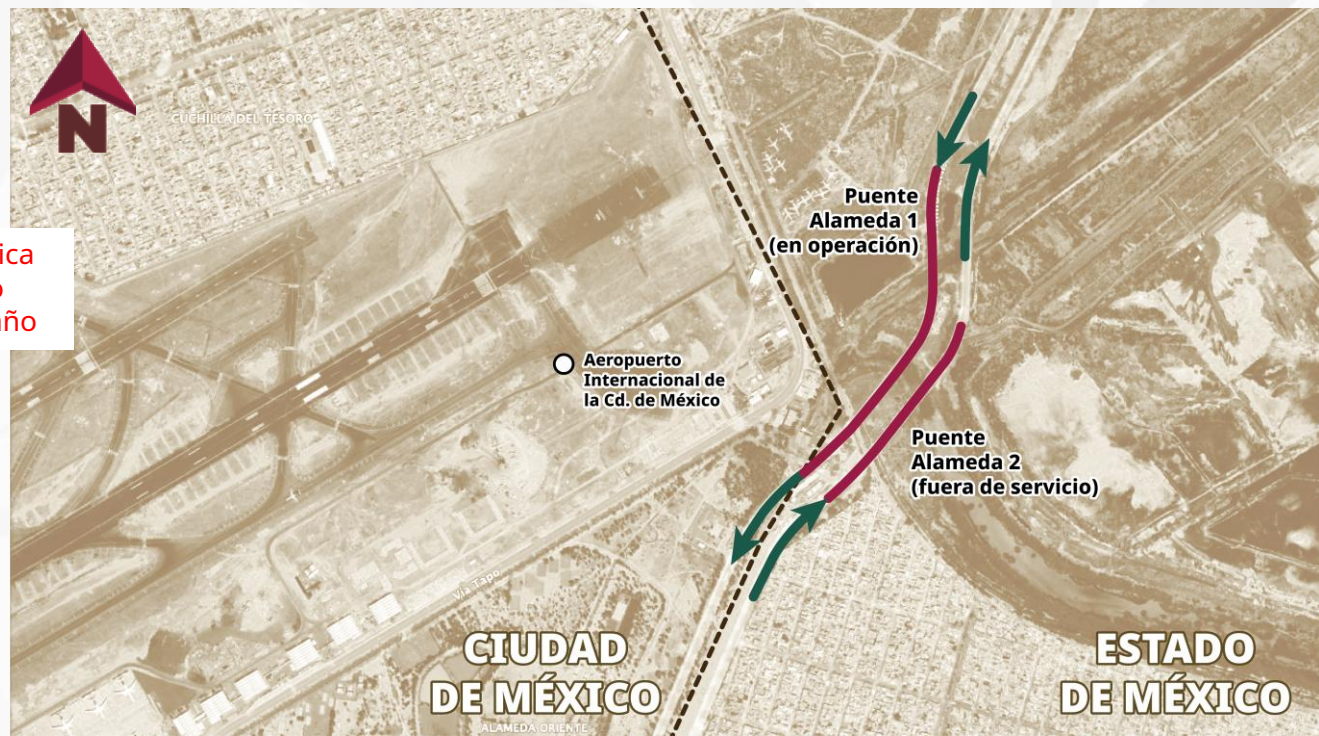

Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	26/dic/25 al 01/dic/26	
			Acumulado		Programado	Ejecutado
Estudios (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Demolición y retiro de estructura (Puente 2)	500	m	450	50	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento de señal tipo puente (Puente 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 2)	4,740.4	m3	4,169.54	570.86	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puente 2)	58,115.16	m3	9,663.09	48,452.07	2,694.08	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 2)	42,615.03	m3	13,690.88	28,924.15	1,807.91	0
Construcción de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puente 2)	1,892	Pzs	1,380	512	115.17	100
Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puente 2)	1,892	Pzs	512	1,380	92.62	0
Excavación para desplante de Zapatas (Puente 2)	1,984.10	m3	0	1,984.1	165.34	0
Construcción de Zapatas (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0.04	0
Excavación para desplante de Cajones (Puente 2)	1,984.10	m3	884	1,100.1	152.62	0
Construcción de Cajones (Puente 2)	8.00	Pzs	0	8	0.64	0
Construcción de Columnas (Puente 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Construcción de Cabezales (Puente 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Fabricación de trabes pretensadas (Puente 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puente 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Fabricación de trabes de Acero (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Traslado y montaje de trabes de Acero (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Construcción de Losas de calzada (Puente 2)	10.00	Claros	0	10	0	0
Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puente 2)	960.00	m	0	960	0	0
Construcción de Accesos (Puente 2)	1.00	Accesos	0	1	0	0
Construcción de línea de alumbrado publico (Puente 2)	1.00	Línea	0	1	0	0
Señalamiento Horizontal y Vertical (Puente 2)	1.00	Lote	0	1	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 1)	5,222.6	m3	4,546	676.6	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puente 1)	64,026.84	m3	10,051.18	53,975.66	0	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 1)	46,949.97	m3	12,180	34,769.97	0	0

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

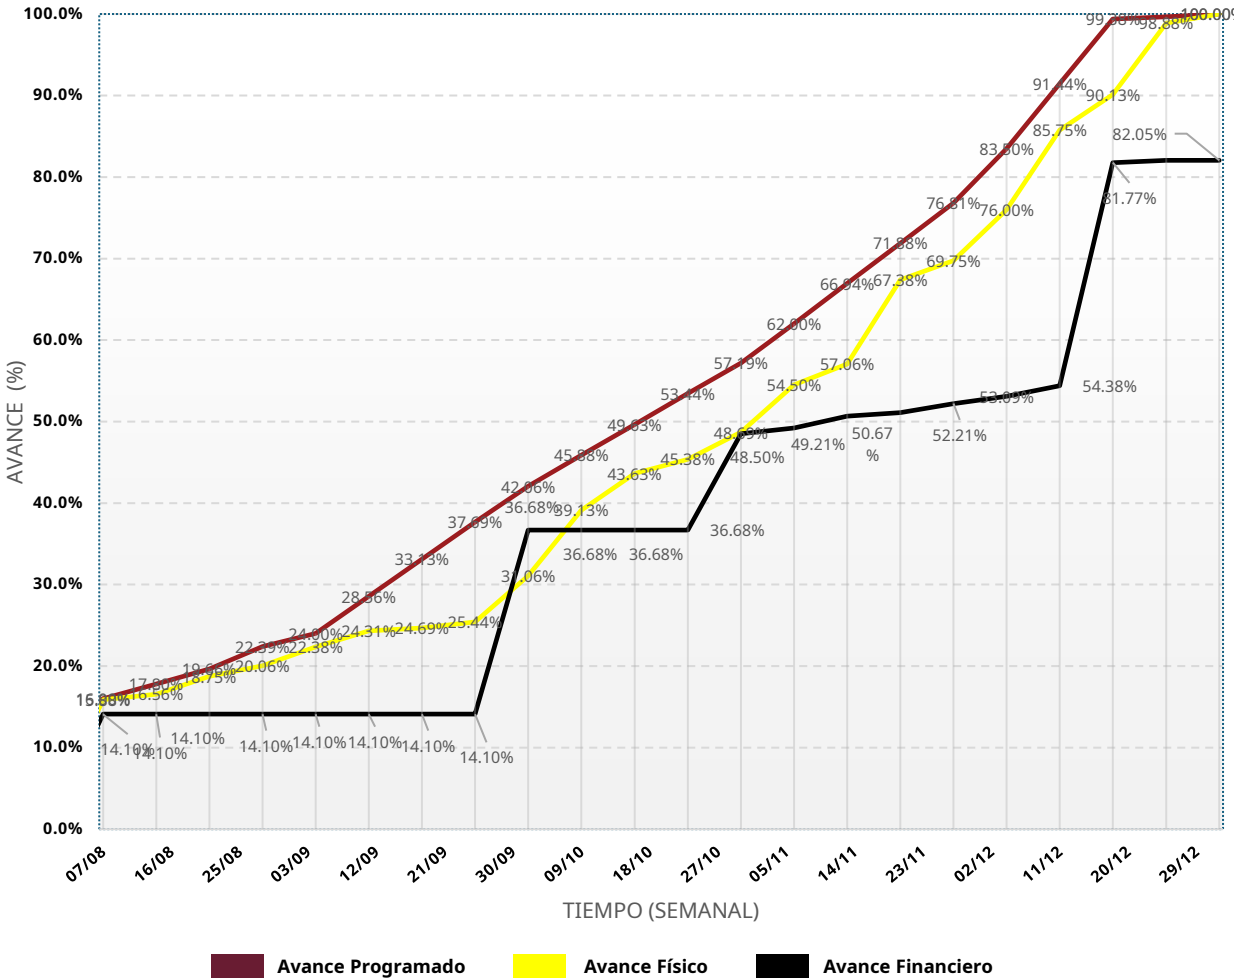

	Del 19 al 25 de diciembre de 2025	Del 26 de diciembre de 2025 al 01 de enero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	61	20
Maquinaria	17	17
Frentes de trabajo	8	2
