

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

- Programado: 47.57%
- Real: 57.52%
- Semanal: 0.97%
- Financiero: 37.77%


Avance 2025

- Programado: 100.0%
- Real: 100.0%
- Semanal: 2.04%
- Financiero: 79.17%

* La meta 2025 ya se cumplió, pero se continúa con actividades en obra.


-  **Inversión total 2025-2026:** 630 mdp
Inversión 2025: 280 mdp
-  **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)
Meta 2025: 0.55 km (**46% del puente (cimentación y subestructura)**)
-  **Inicio:** 03-Julio de 2025
Término: abril de 2026
Término meta 2025: Diciembre
-  **157,048** habitantes beneficiados
-  **1,431** empleos generados
-  **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V

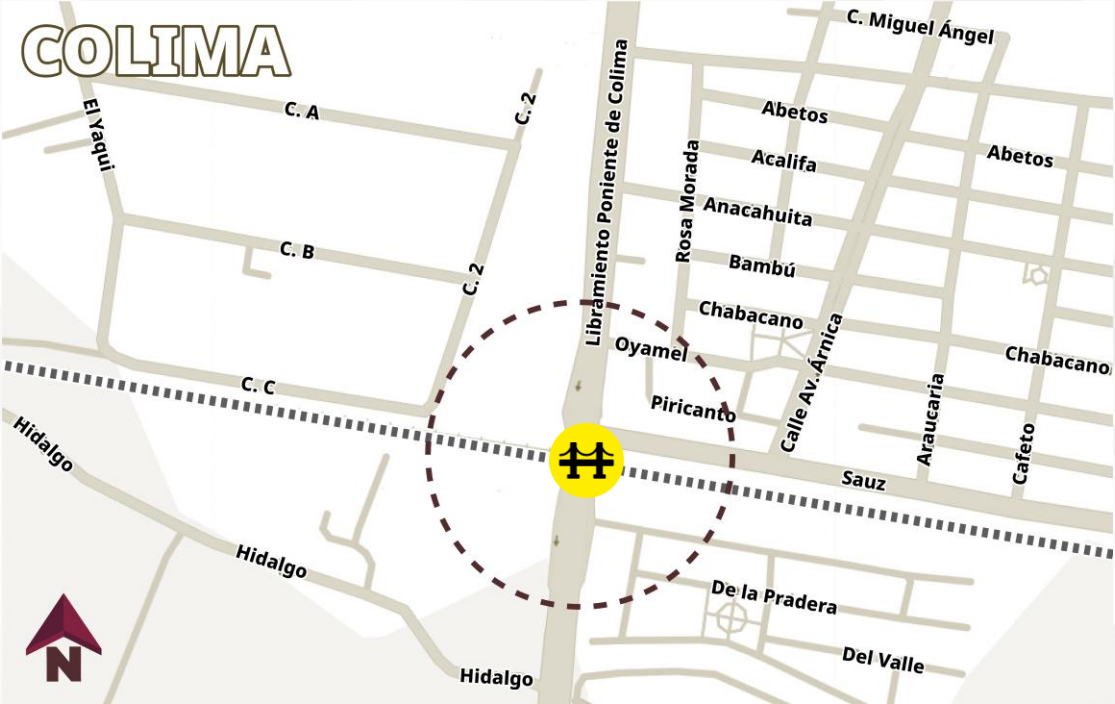

PSF Arco Sur
Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

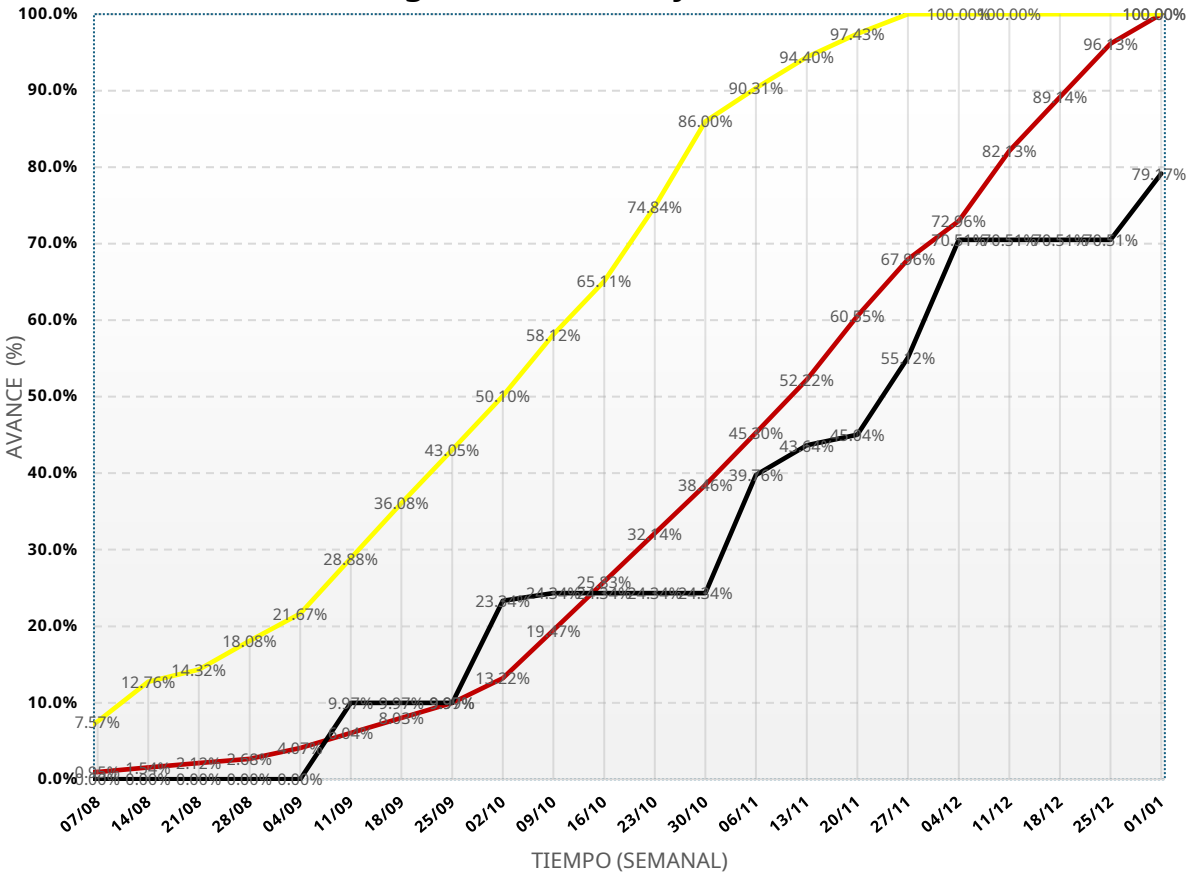

	19 al 25 de diciembre	26 de diciembre de 2025 al 01 de enero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	176	176
Maquinaria	60	60
Fuerza de trabajo	00	11
