

Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo



Inversión total: 484 MDP

Avance físico

- Programado: 46.95%
- Real: 17.87%
- Semanal: 3.76%
- Financiero : 0.00%



Meta total: 1.92 km longitud total.
• 0.77 km puente



Inicio: 27 Abril de 2026
Término: 21 Octubre 2026



Más de 1,320,00 de habitantes beneficiados

2,890 empleos generados



5 minutos ahorro en tiempo



Beneficios:

- Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes.
- Optimiza la capacidad y eficiencia del flujo vehicular en el acceso y salida del Puente Vehicular Nichupté.
- Fortalecer la seguridad de los residentes y turistas de la zona turística ante situaciones de contingencias ambientales
- Población beneficiada: 20 millones de turistas al año
- Es un distribuidor vial que cuenta con un paso superior con dos cuerpos separados para alojar dos carriles de circulación en un sentido y el otro un solo carril, además de calles laterales para servicios locales.


Tramo	Empresas
Construcción distribuidor vial Kukulcán.	• Contratista: Grupo Formado por las empresas: Consorcio de Ingenieros Constructores y consultores, S.A. de C.V y ASCH, S.A. de C.V.
	• Supervisión: Grupo formado por las empresas: Triada Geotecnia, S.A.P.I. de C.V. Triada Consultores, S.A.P.I. de C.V. Triada Diseño y Gerencia Construcción S.A.P.I. de C.V. .



Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado		Faltante	Ejecutado del 05 al 11 de junio de 2026
Pilas de cimentación (pza)	104	50	48%	54	11
Zapatas (pza)	18	0	0%	18	0
Columnas (pza)	30	0	0%	30	0
Cabezales (pza)	19	0	0%	19	0
Fabricación de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Montaje de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Losas (pza)	17	0	0%	17	0
M.M.E. (m³)	6,176	0	0%	6,176	0

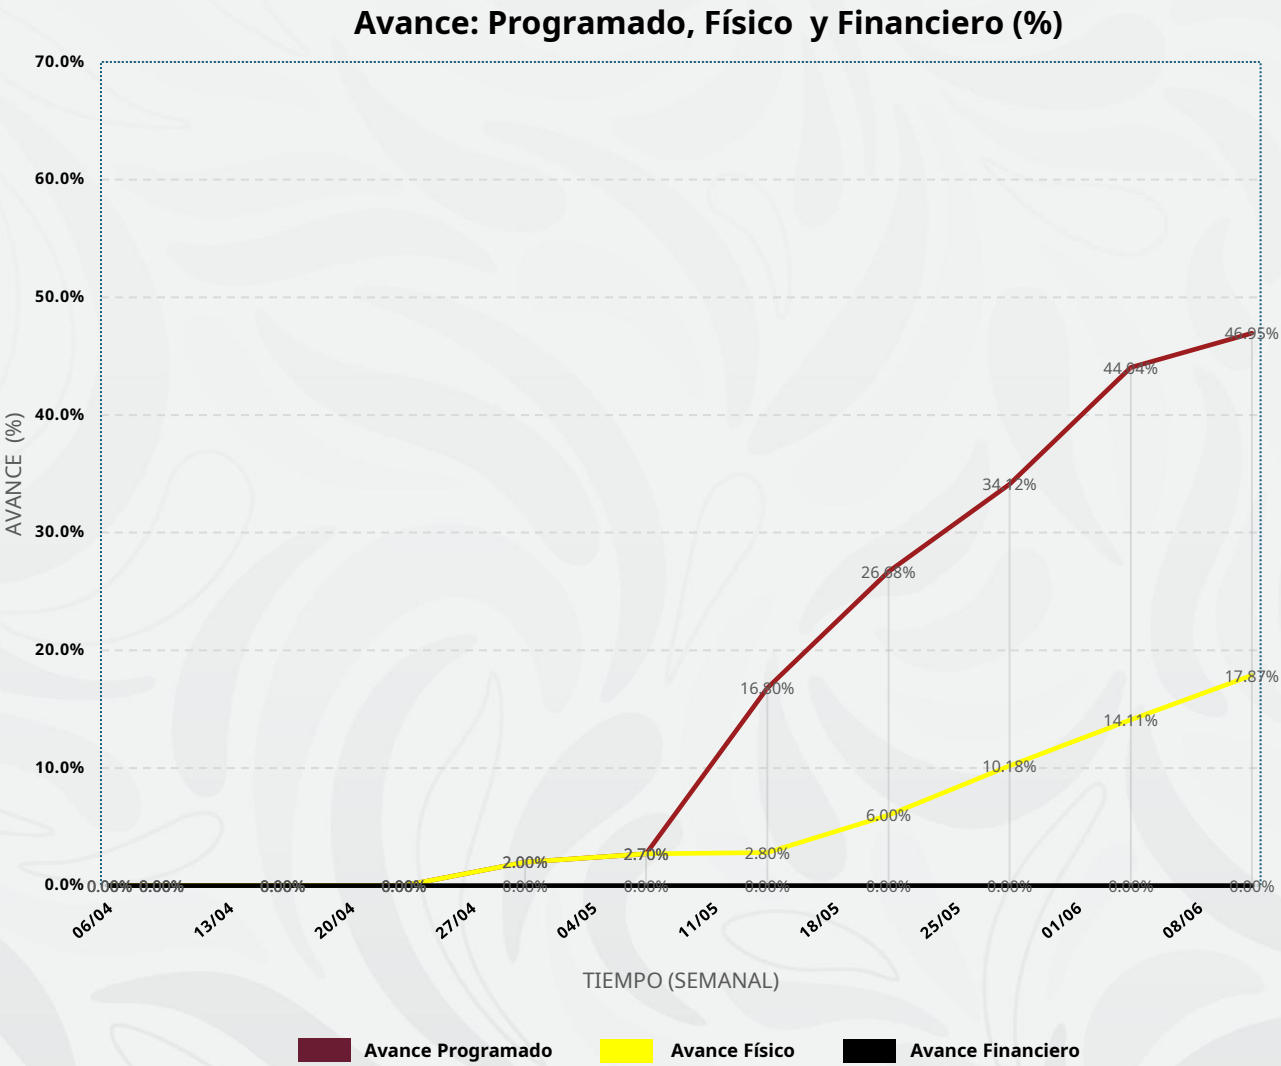

	29 de mayo al 04 de junio 2026	05 al 11 de junio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	71	69
Maquinaria	18	24
Frentes de trabajo	5	5
