

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 53.95%
- Real: 64.10%
- Semanal: 0.10%
- Financiero: 64.00%



Inversión total 2025-2026: 720 mdp

Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inversión 2025: 140 mdp

Meta 2025: 38% de 1 Distribuidor Vial

Inversión 2026: 580 mdp

Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial



Inicio: 16 de julio de 2025

Término meta 2025: Diciembre 2025

Término meta total: Julio de 2026



73,215 habitantes beneficiados




2,220 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

Beneficios Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.

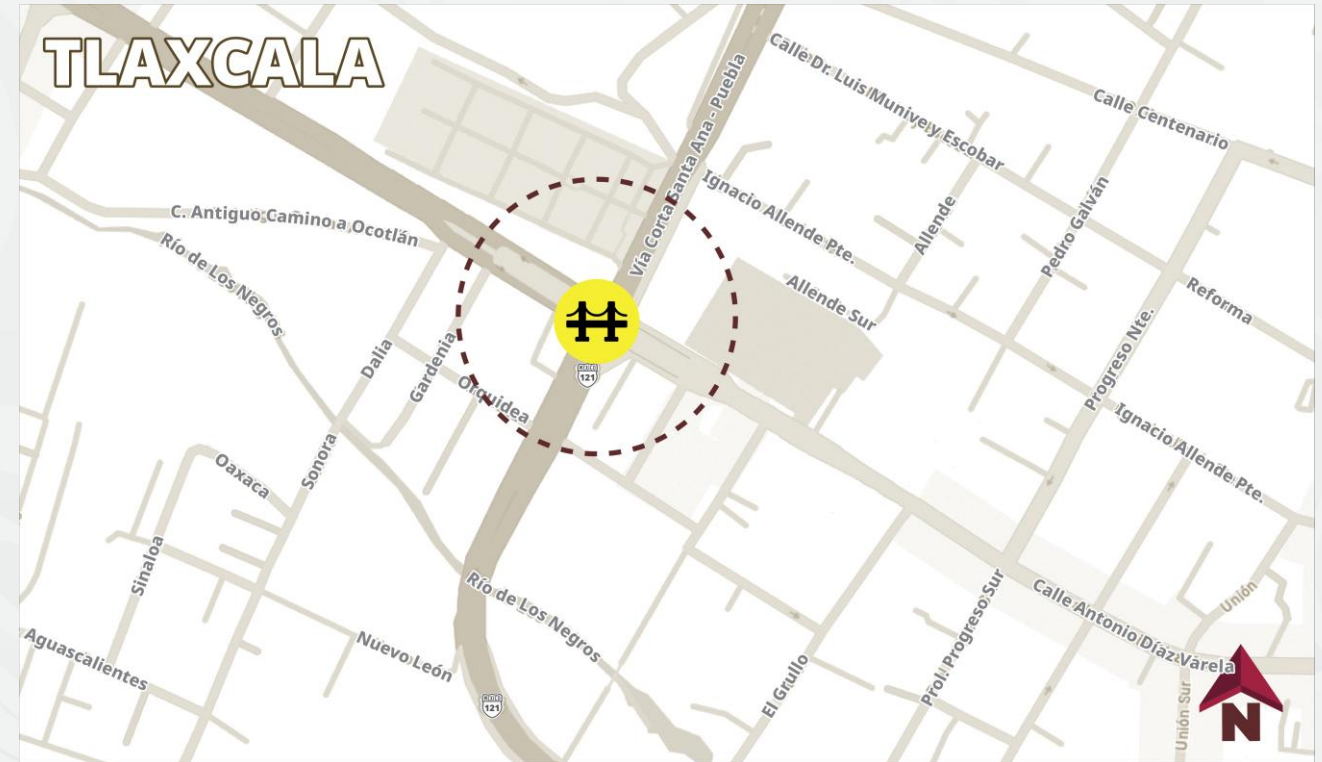

Nivel de Servicio E

Nivel de Servicio B

Tramo

Empresas

KM 29+980 AL
KM 30+183.58

- Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.,
- Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.


Situación actual

Proyecto

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	Del 05-06-26 al 11-06-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	64.10% 1 Distribuidor Vial	35.90% de 1 Distribuidor Vial	1.77%	0.10%	Se trabaja en: Diafragmas, Losas, drenaje pluvial, construcción cabezal eje 19, fabricación de trabes, montaje de trabes y fabricación de paneles de concreto para muros de tierra armada.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

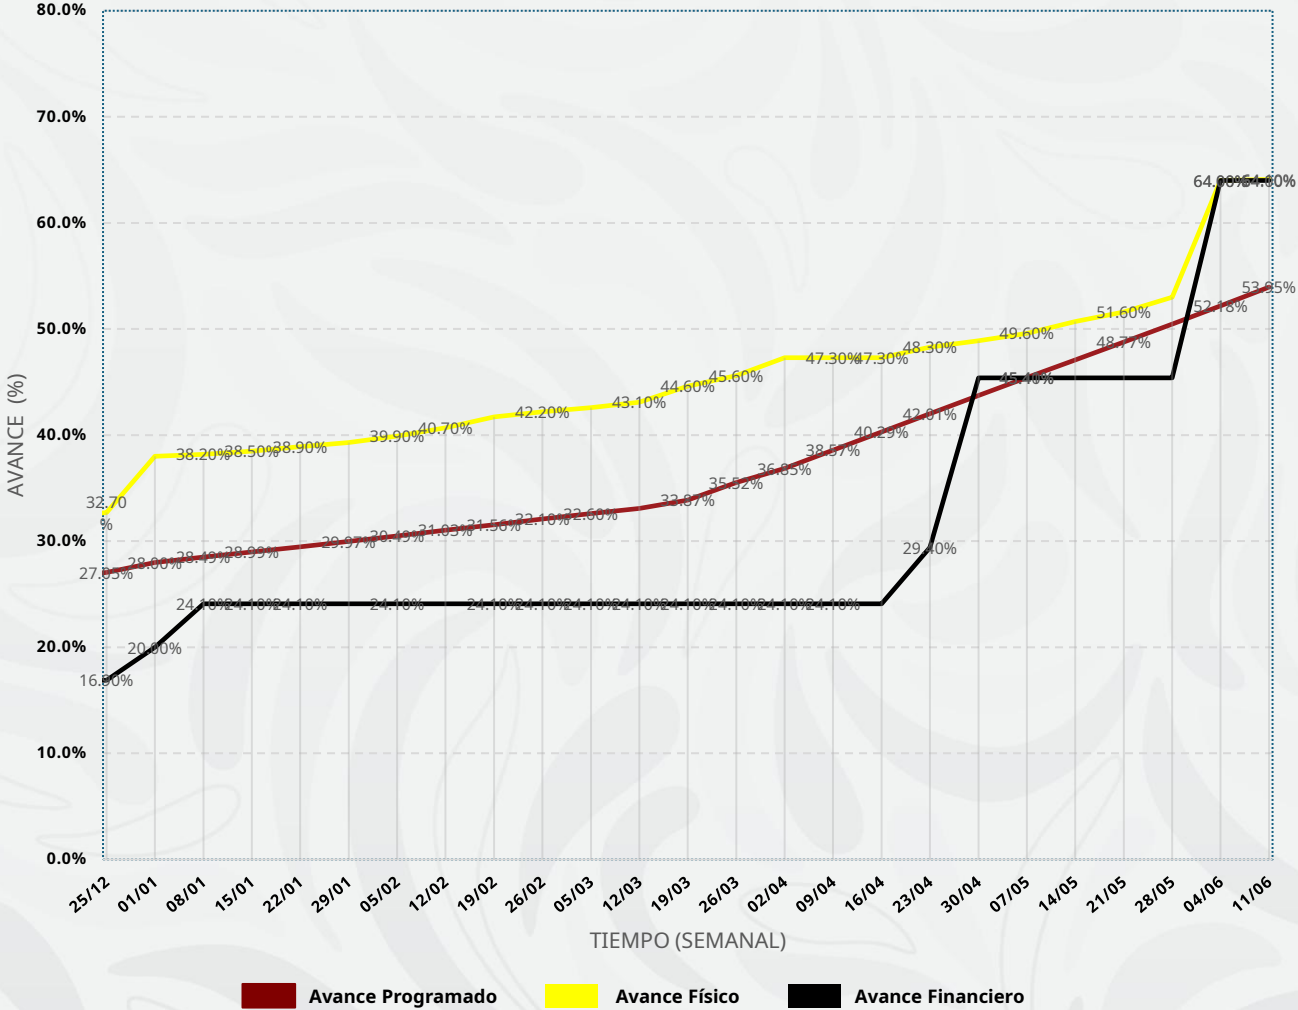

	29 al 04 de junio	05 al 11 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	105	107
Maquinaria	20	20
Frente de trabajo	9	11
