



Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo



Inversión total: 484 MDP



Meta total: 0.77 km longitud total.
• 0.65 km puente
• 0.12 km accesos



Inicio: 06 Abril de 2026
Término: Octubre 2026



Más de 1,320,00 de habitantes beneficiados



2,890 empleos generados



5 minutos ahorro en tiempo

Beneficios:

- Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes.
- Fortalecer la seguridad de los residentes y turistas de la zona turística ante situaciones de contingencias ambientales
- Población beneficiada: 20 millones de turistas al año
- Es un distribuidor vial que cuenta con un paso superior con dos cuerpos separados para alojar dos carriles de circulación en un sentido y el otro un solo carril, además de calles laterales para servicios locales

Avance físico

- Programado: 16.8%
- Real: 2.8%
- Semanal: 0.1%
- Financiero: 2.8%



SITUACIÓN ACTUAL



IMAGEN OBJETIVO


Tramo	Empresas
Construcción distribuidor vial Kukulcán.	• Contratista: Grupo Formado por las empresas: Consorcio de Ingenieros Constructores y consultores, S.A. de C.V y ASCH, S.A. de C.V. • Supervisión: Grupo formado por las empresas: Triada Geotecnia, S.A.P.I. de C.V. Triada Consultores, S.A.P.I. de C.V. Triada Diseño y Gerencia Construcción S.A.P.I. de C.V. .

Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

Elemento	Intervención	Ejecutado o acumulado		Faltante	Ejecutado del 08 al 14 de mayo de 2026
Pilas de cimentación (pza)	104	7	7%	97	7
Zapatas (pza)	18	0	0%	18	0
Columnas (pza)	30	0	0%	30	0
Cabezales (pza)	19	0	0%	19	0
Fabricación de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Montaje de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Losas (pza)	17	0	0%	17	0
M.M.E. (m³)	6,176	0	0%	6,176	0

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

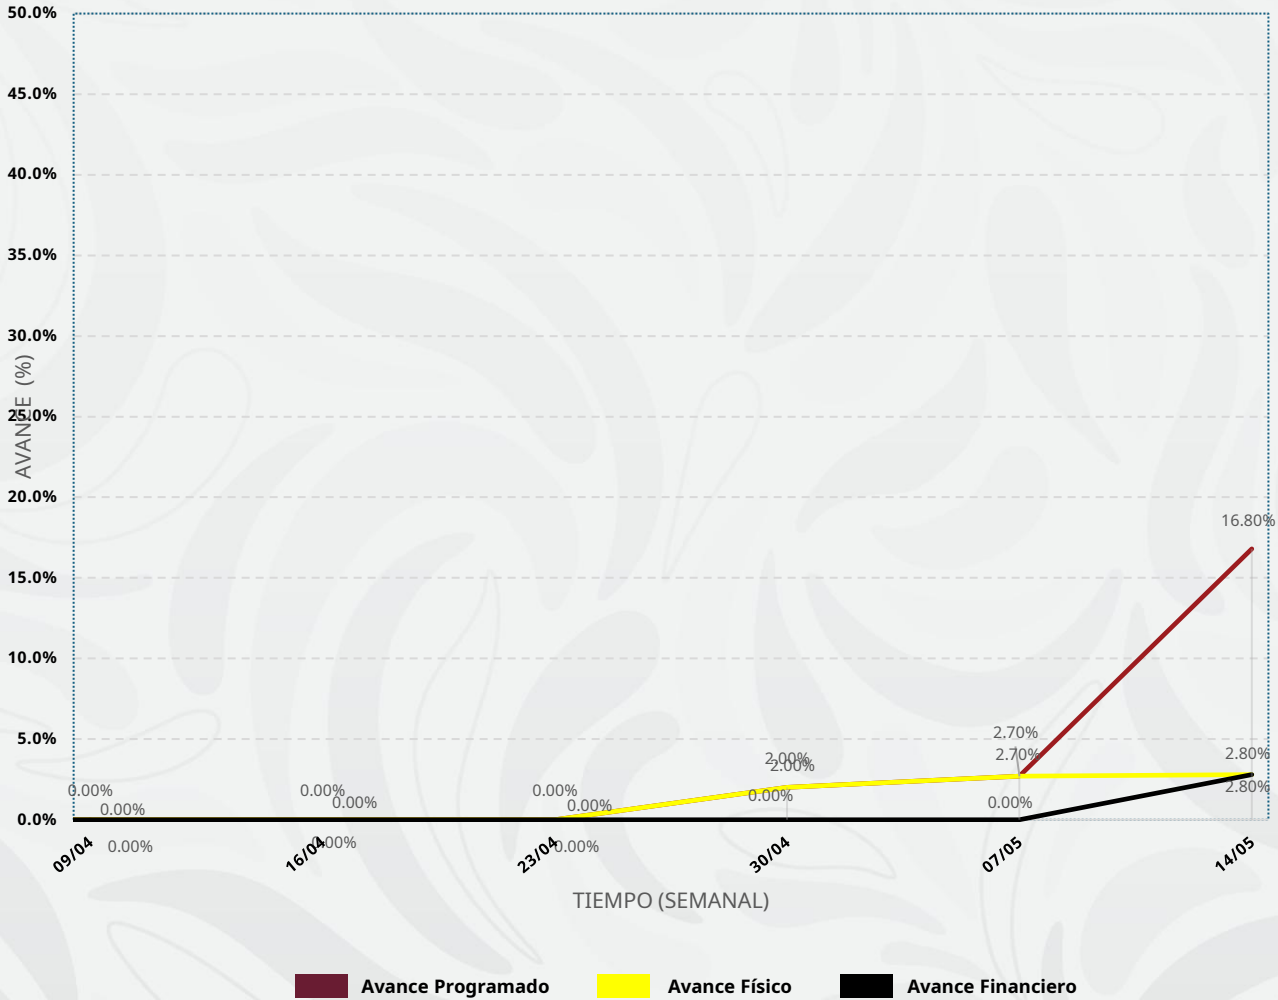

Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Perforación para pilas, cuerpo B



Suministro de acero, cuerpo B



Armado de acero para pilas, cuerpo B



Armado de acero para pilas, cuerpo B
