

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance global

- Programado: 47.09%
- Real: 50.70%
- Semanal: 1.10%
- Financiero: 45.40%



Inversión total 2025-2026: 740 mdp

Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inversión 2025: 140 mdp

Meta 2025: 38% de 1 Distribuidor Vial

Inversión 2026: 600 mdp

Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial



Inicio: 16 de julio de 2025

Término meta 2025: Diciembre 2025

Término meta total: Julio de 2026



73,215 habitantes beneficiados



2,220 empleos generados




20 min ahorro en tiempo

Beneficios Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.

Paso superior con dos carriles por sentido


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

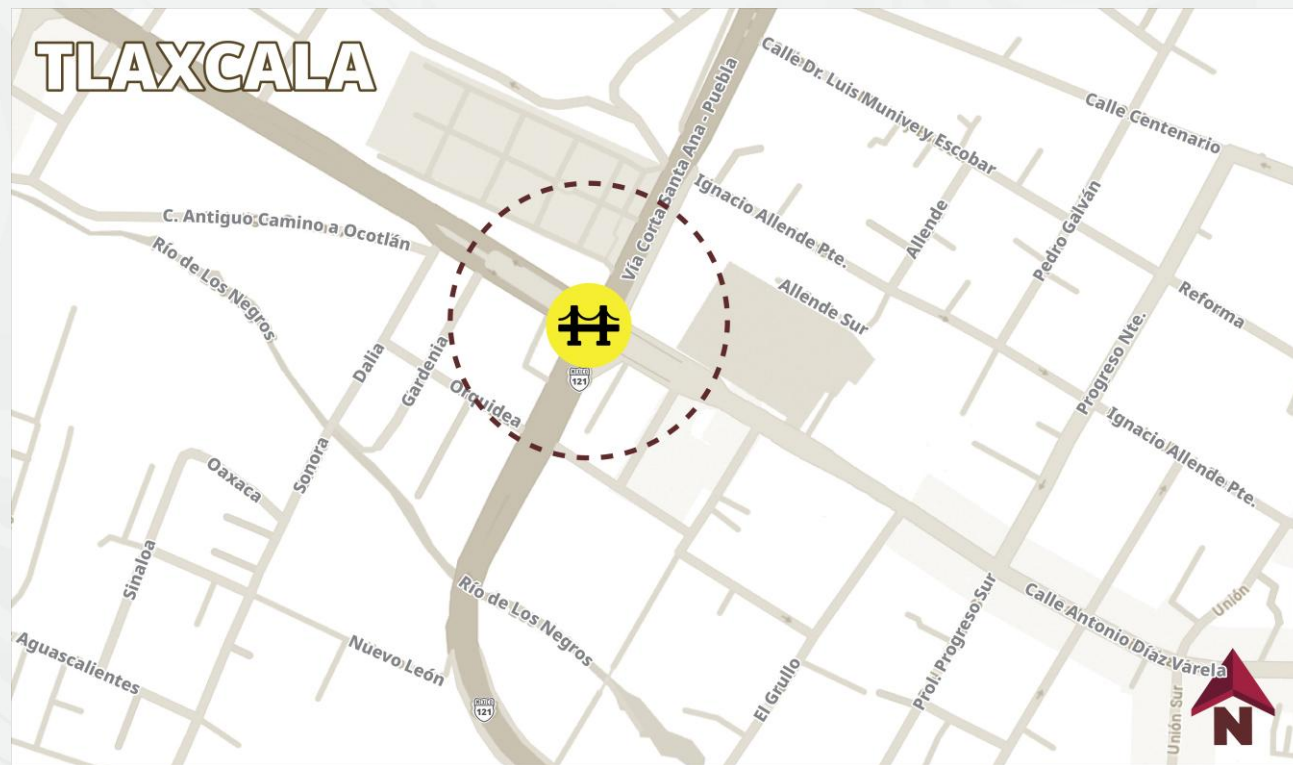

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	Del 08-05-26 al 14-05-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	50.70% 1 Distribuidor Vial	49.30% de 1 Distribuidor Vial	1.68%	1.10%	Se trabaja en: Montaje de traves, diafragmas, cabezal y construcción de pilas de 1.50 m de φ.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

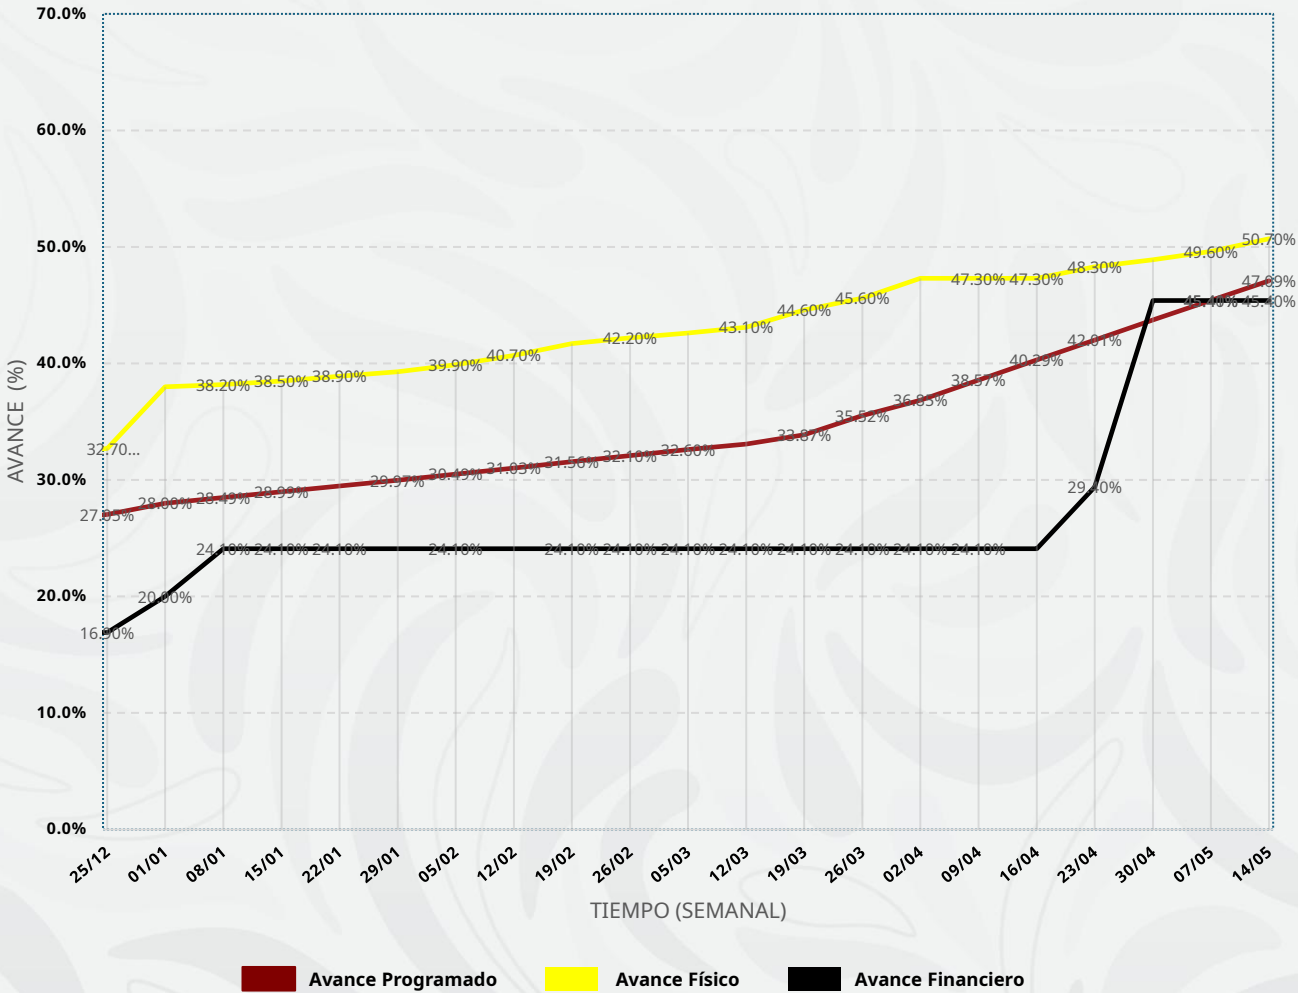

	01 al 07 de mayo	08 al 14 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	53	56
Maquinaria	20	13
Frente de trabajo	7	8
