

Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo



Inversión total: 484 MDP

Avance físico

- Programado: 55.28%
- Semanal: 2.80%
- Real: 27.15%
- Financiero: 0%



Meta total: 1.92 km longitud total.
• 0.77 km puente



Inicio: 27 Abril de 2026
Término: 21 Octubre 2026



Más de 1,320,00 de habitantes beneficiados
2,890 empleos generados




5 minutos ahorro en tiempo



- Beneficios:**
- Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes.
 - Optimiza la capacidad y eficiencia del flujo vehicular en el acceso y salida del Puente Vehicular Nichupté.
 - Fortalecer la seguridad de los residentes y turistas de la zona turística ante situaciones de contingencias ambientales
 - Población beneficiada: 20 millones de turistas al año
 - Es un distribuidor vial que cuenta con un paso superior con dos cuerpos separados para alojar dos carriles de circulación en un sentido y el otro un solo carril, además de calles laterales para servicios locales.

Tramo	Empresas
Construcción distribuidor vial Kukulcán.	• Contratista: Grupo Formado por las empresas: Consorcio de Ingenieros Constructores y consultores, S.A. de C.V y ASCH, S.A. de C.V.
	• Supervisión: Grupo formado por las empresas: Triada Geotecnia, S.A.P.I. de C.V. Triada Consultores, S.A.P.I. de C.V. Triada Diseño y Gerencia Construcción S.A.P.I. de C.V. .

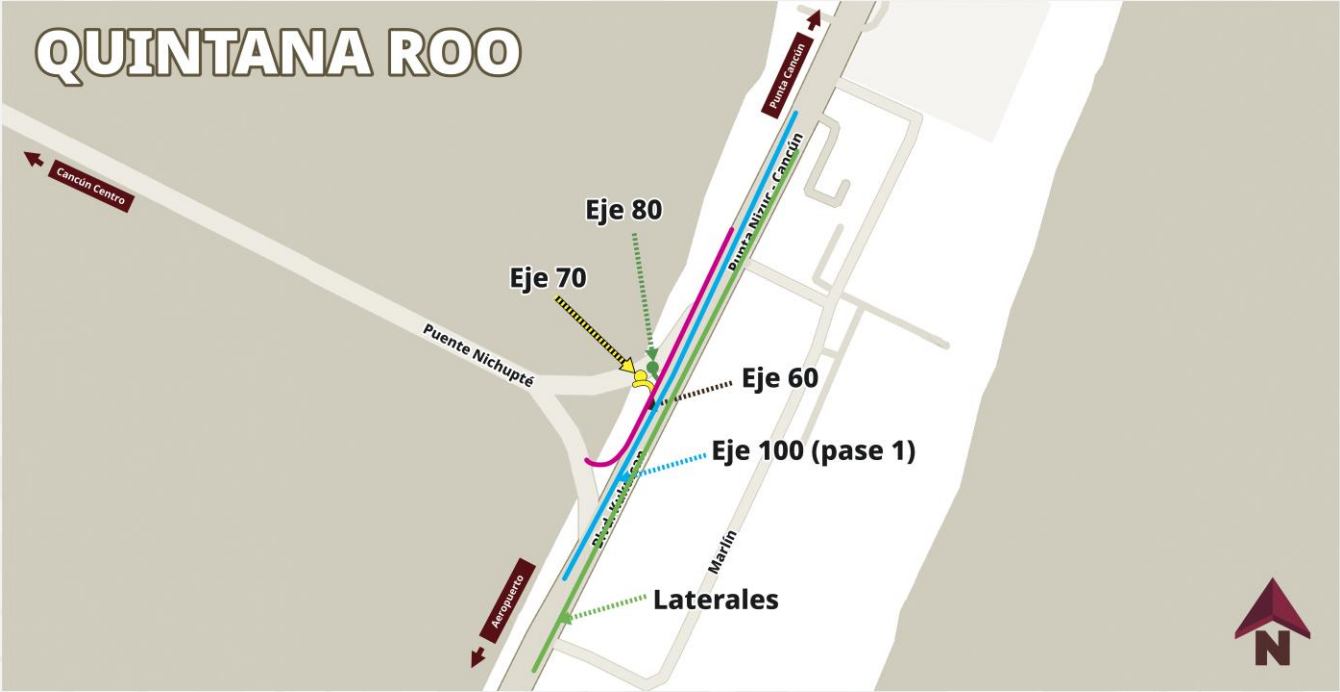


Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado		Faltante	Ejecutado del 26 de junio al 2 de julio 2026
Pilas de cimentación (pza)	103	77	75%	26	8
Zapatas (pza)	18	1.00	6%	17	0.25
Columnas (pza)	30	0	0%	30	0
Cabezales (pza)	19	0	0%	19	0
Fabricación de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Montaje de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Losas (pza)	17	0	0%	17	0
M.M.E. (m³)	6,176	0	0%	6,176	0

•Nota: se tienen 212.03 mdp de obra ejecutada no pagada por trámites ante FONADIN

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

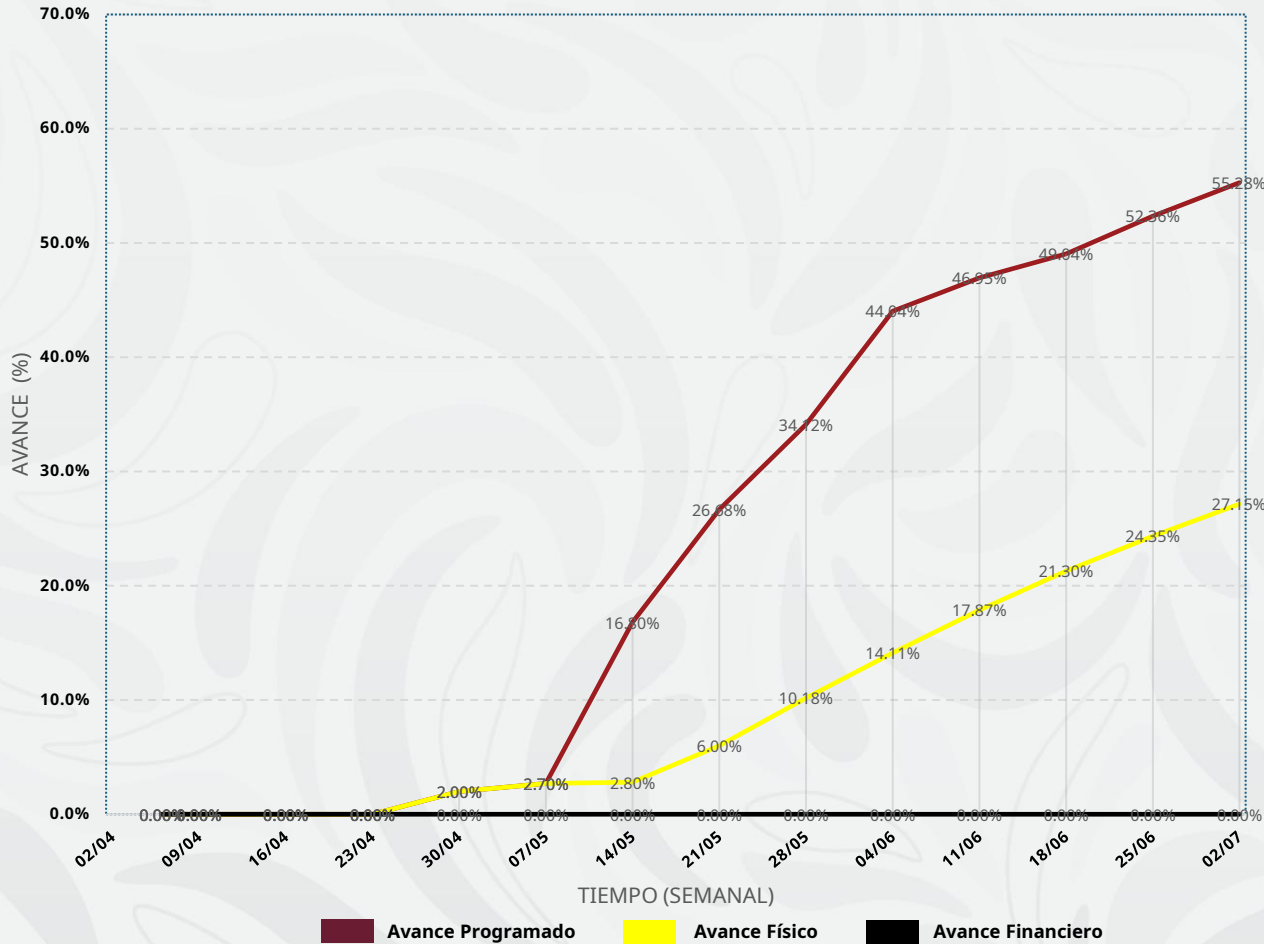

	19 al 25 de junio 2026	26 de junio al 2 de julio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	106	90
Maquinaria	33	33
Frentes de trabajo	6	6
