

Puente UAEM Morelos

ACTUALIZADA 22/06/2026



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Se ajusta el % de avance real, derivado de que el Centro SICT realizó ajuste en los volúmenes ponderados que determina el avance real

- Avance global**
- Programado: 14.00%
 - Real: **7.10%**
 - Semanal: 1.2%
 - Financiero: 0.00%



Inversión total: 400.0 MDP



Meta total: 1.0 km.

- 0.3 km puente y viaducto
- 0.7 km accesos (4 gazas principales)



	Original	Modificado
Inicio:	Marzo 2026	Mayo 2026
Término:	Noviembre 2026	Diciembre 2026



450,000 habitantes beneficiados



1,200 empleos generados




45 min ahorro en tiempo

Beneficios:

- Acceso continuo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

Acceso vehicular a la UAEM con estructura principal de 2 carriles de circulación y ramal de acceso principal de 4 carriles de circulación.

Tramo	Empresas
Construcción Puente UAEM	• Contratista: Grupo Constructor TRANSPORTIEREN, S.A. de C.V., en participación conjunta con JAVA Soluciones Energéticas y Construcción, S.A. de C.V. • Supervisión: ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.

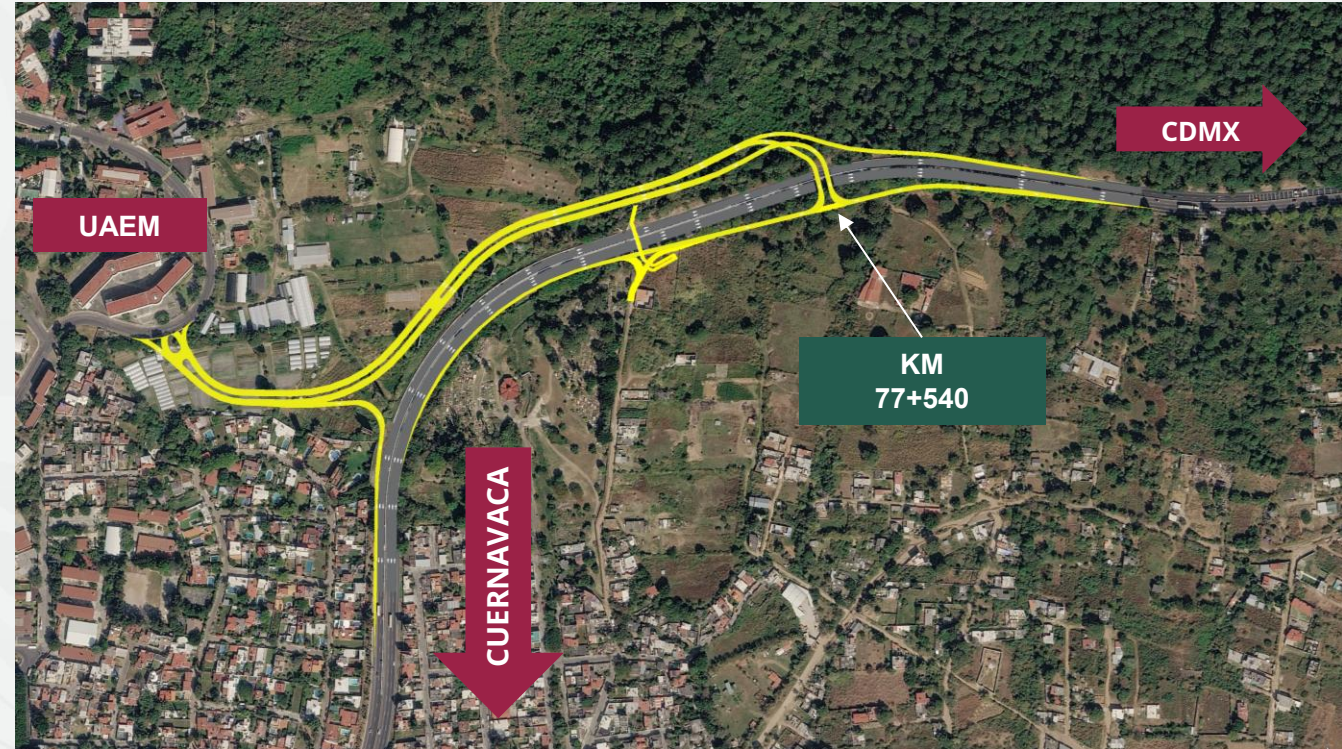


No se iniciaron trabajos el 17 de marzo, debido a falta de liberación de Derecho de Vía UAEM, Ejidos Ocoatepec y Chamilpa.



Puente UAEM Morelos

Avance: Programado, Físico y Financiero

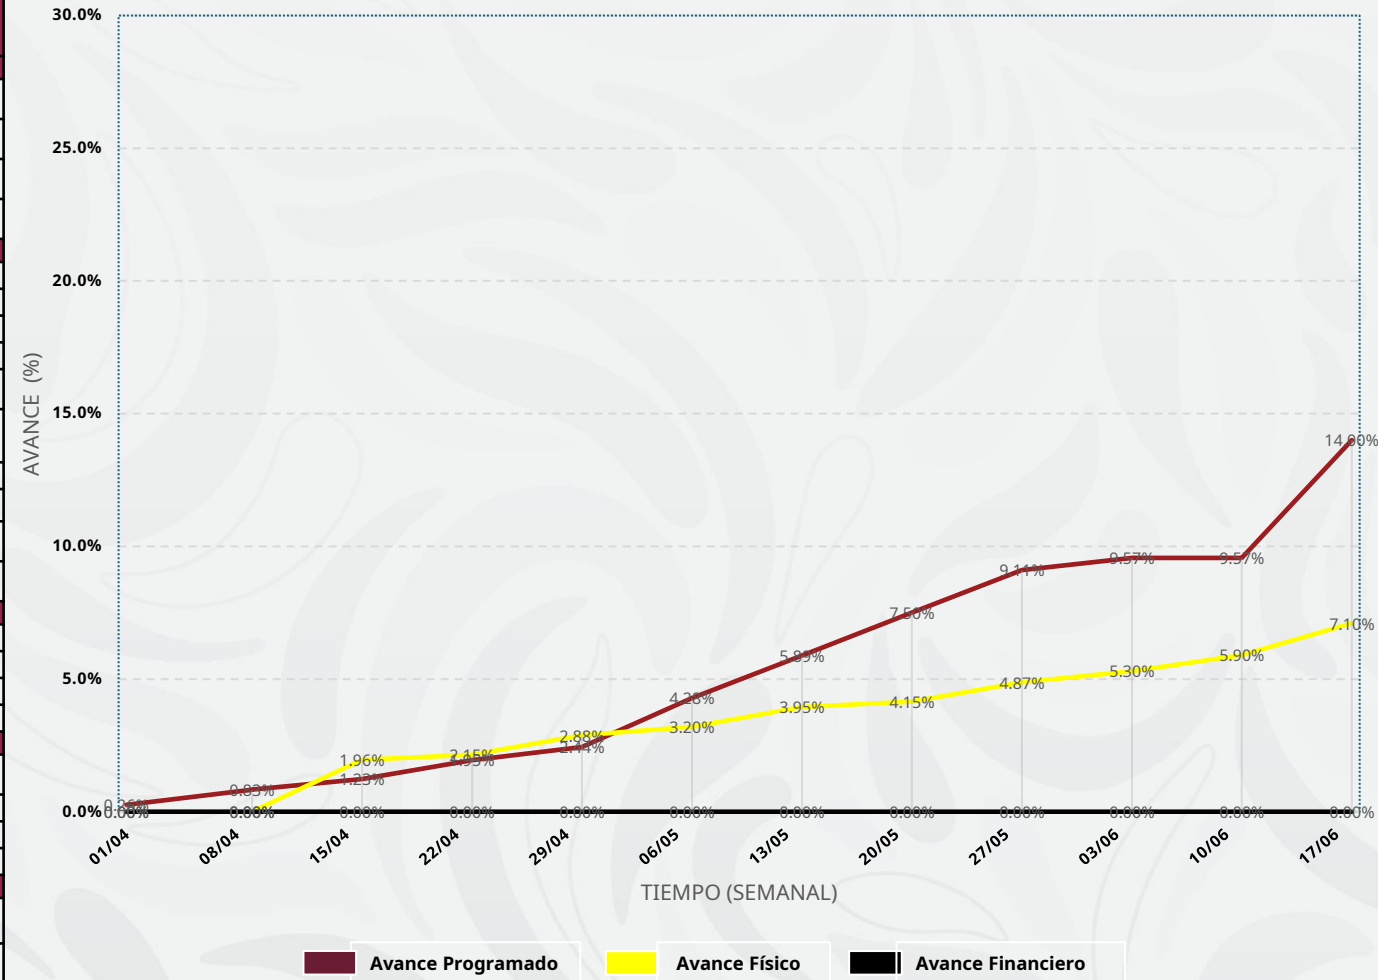

	05 al 11 de junio	12 al 18 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	13	25
Maquinaria	4	15
Frentes de trabajo	2	3

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	12/06/26 al 18/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terracerías y Pavimentos						
Terracerías (m3)	111,176.4	11,251.0	99,925.4	681.0	-	En ejecución
Base hidráulica (m3)	5,024.8	0.0	5,024.8	-	-	Sin iniciar
Base asfáltica (m3)	2,261.2	0.0	2,261.2	-	-	Sin iniciar
Carpeta asfáltica (m3)	1,739.1	0.0	1,739.1	-	-	Sin iniciar
Estructura Paso Inferior Vehicular						
MME (M3)	568.1	0	568.10	-	-	Sin iniciar
Zapatas (pzas)	12	0	12.00	-	-	Sin iniciar
Pilas (pzas)	36	0	36.00	-	-	Sin iniciar
Trabes (pzas)	74.00	0.00	74.00	-	-	Sin iniciar
Montaje trabes (pzas)	74	0	74.00	-	-	Sin iniciar
Terraplenes de Acceso (m2)	7159.1	0	7,159.10	-	-	Sin iniciar
Losas (pzas)	10.00	0.00	10.00	-	-	Sin iniciar
Parapeto (m)	767.00	0.00	767.00	-	-	Sin iniciar
Guarnición (m3)	110.50	0.00	110.50	-	-	Sin iniciar
Banquetas (m3)	2,848.30	0.00	2,848.30	-	-	Sin iniciar
Estructura Paso Peatonal						
Zapatas (pzas)	6	0	6.00	-	-	Sin iniciar
Pilas (pzas)	3	0	3.00	-	-	Sin iniciar
Trabes (pzas)	1	0	1.00	-	-	Sin iniciar
Losas (pzas)	6	0	6.00	-	-	Sin iniciar
Muros de contención						
Excavación (m3)	1261.15	0	1,261.15	-	-	Sin iniciar
Relleno (m3)	949.19	0	949.19	-	-	Sin iniciar
Acero (ton)	68.1043	0	68.10	-	-	Sin iniciar
Concreto (m3)	726.96	0	726.96	-	-	Sin iniciar
Obras de drenaje						
Tubo de concreto (pza)	3	0	3.00	-	-	Sin iniciar
Losa de concreto (pza)	5.00	0.00	5.00	-	-	Sin iniciar
Boveda (pza)	4	0	4.00	-	-	Sin iniciar
Señalamiento						
Horizontal (m)	12,515.00	0.00	12,515.00	-	-	Sin iniciar
Vertical (pza)	183	0	183.00	-	-	Sin iniciar
Obra complementaria						
Defensa metalica (ml)	963	0	963.00	-	-	Sin iniciar
Cunetas (ml)	509.6	0	509.60	-	-	Sin iniciar
