

Puente El Chical

Colima

Avance global

• Programado: 98.24 %

• Semanal: 0.15 %

• Real: 96.00%

• Financiero: 15.6 %



Inversión total 2025-2026: 137.0 mdp

Meta total: 0.736 km (0.360 km estructuras y 0.376 km accesos)



Inversión 2025: 21.4 mdp

Meta 2025: 71.12 % del Puente

Inversión 2026: 115.6 mdp

Meta 2026: 28.88 % del Puente

De acuerdo al cierre de SHCP 2025



Fecha de inicio: 11 de agosto 2025

Fecha de término: abril 2026



4,053 habitantes beneficiados




411 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Beneficios: La obra representa una mejora significativa en la seguridad vial y una reducción de riesgos durante eventos pluviales, garantizando además la conectividad permanente del poblado El Chical con el municipio de Coquimatlán y las zonas cercanas. Asimismo, contribuye a la reducción de los tiempos de traslado para habitantes y usuarios de la vía, facilita un mayor acceso a servicios básicos como hospitales, escuelas y comercios, e impulsa el desarrollo social y económico de la región mediante una infraestructura más confiable y segura.

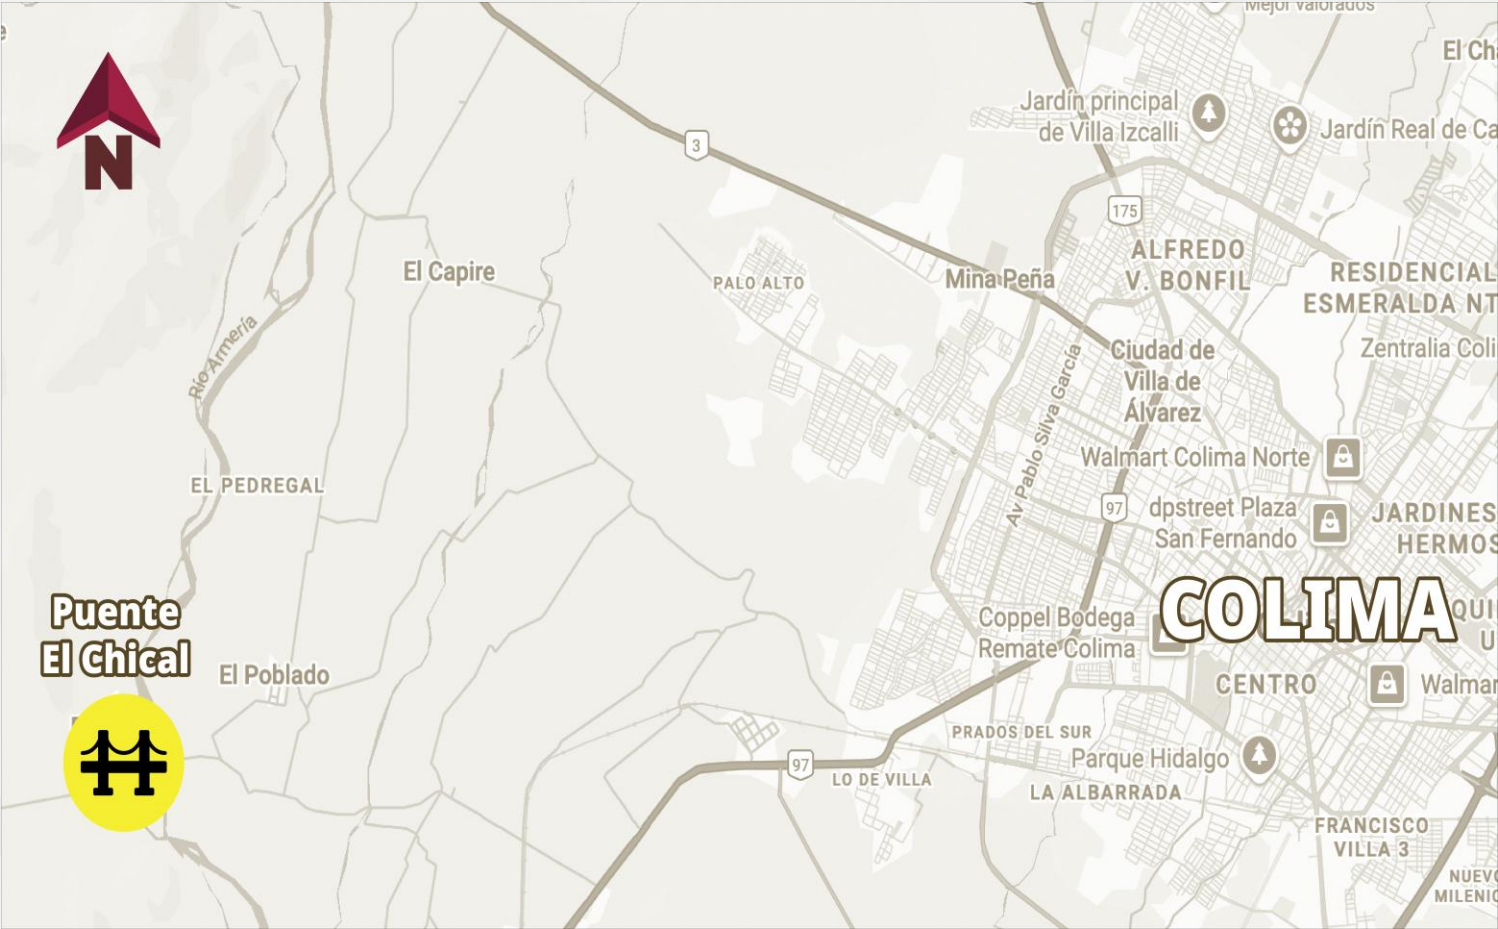

Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLA COMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERIA, S.A DE C.V

Puente El Chical

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	27/03/26 al 02/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Columnas (Pza)	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Montaje de trabes (Pza)	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	648.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Carpeta Asfáltica (m3)	416.8	0.0	416.8	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	720.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	40.0	99.0	8.0	8.0	
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	125,000.0	0.0	0.0	0.0	Trabajos concluidos

