

CDMX

Alameda Oriente

Avance global

- Programado: 23.77%

• Real: 18.76%
- Semanal: 0.18%

• Financiero: 15.79%



Inversión total 2025-2027: 1,979 mdp
Inversión 2025: 317 mdp | (16.02% de 2 puentes)
Inversión 2026: 670 mdp | (33.86 % de 2 puentes)



Meta total: 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.



Inicio: 17 de junio de 2025
Término: Octubre 2027
Término meta 2026: Diciembre



1,798,474 habitantes beneficiados




5,937 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.

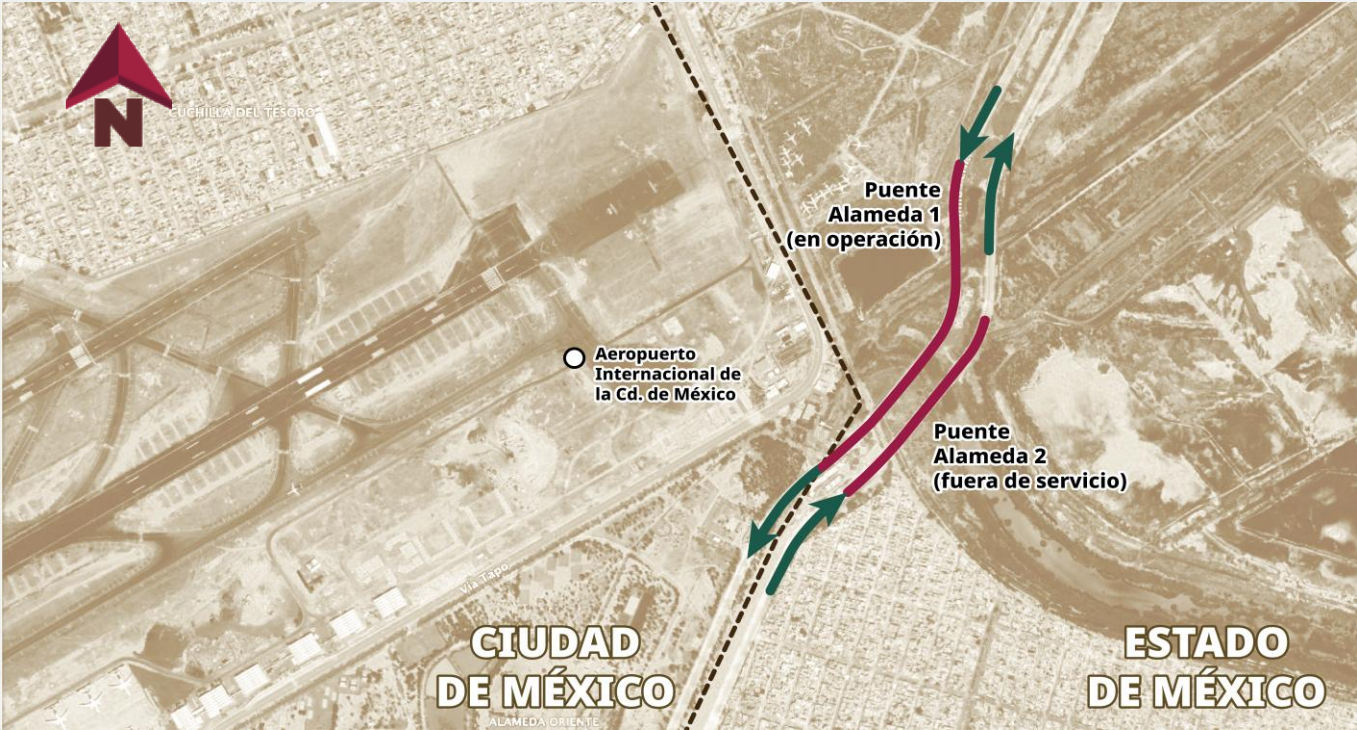

Nivel de Servicio en estudio



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio




Proyecto

Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado		23/ene/26 al 29/ene/26	
			Acumulado	Faltante	Programado	Ejecutado
Estudios (Puentes 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puentes 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Demolición y retiro de estructura (Puentes 1 y 2)	500	m	450	50	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puentes 1 y 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento de señal tipo puente (Puentes 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	4,740.4	m3	4,169.54	570.86	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	58,115.16	m3	9,663.09	48,452.07	0	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	42,615.03	m3	13,841.09	28,773.94	0	0
Construcción de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puentes 1 y 2)	1,892	Pzs	1,892	0	0	210
Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puentes 1 y 2)	1,892	Pzs	699	1,193	92.62	82
Excavación para desplante de Zapatas (Puentes 1 y 2)	1,984.10	m3	0	1,984.1	165.34	0
Construcción de Zapatas (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0	3	0.3	0
Excavación para desplante de Cajones (Puentes 1 y 2)	1,984.10	m3	1,539.15	444.95	152.62	0
Construcción de Cajones (Puentes 1 y 2)	8.00	Pzs	0	8	0.64	0
Construcción de Columnas (Puentes 1 y 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Construcción de Cabezales (Puentes 1 y 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Fabricación de trabes pretensadas (Puentes 1 y 2)	44.00	Pzs	5	39	0	5
Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puentes 1 y 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Fabricación de trabes de Acero (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0	3	0.04	0
Traslado y montaje de trabes de Acero (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0	3	0.04	0
Construcción de Losas de calzada (Puentes 1 y 2)	10.00	Claros	0	10	0	0
Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puentes 1 y 2)	960.00	m	0	960	0	0
Construcción de Accesos (Puentes 1 y 2)	1.00	Accesos	0	1	0	0
Construcción de línea de alumbrado público (Puentes 1 y 2)	1.00	Línea	0	1	0	0
Señalamiento Horizontal y Vertical (Puentes 1 y 2)	1.00	Lote	0	1	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	5,222.6	m3	4,546	676.6	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	64,026.84	m3	10,051.18	53,975.66	0	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	46,949.97	m3	12,180	34,769.97	0	0

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

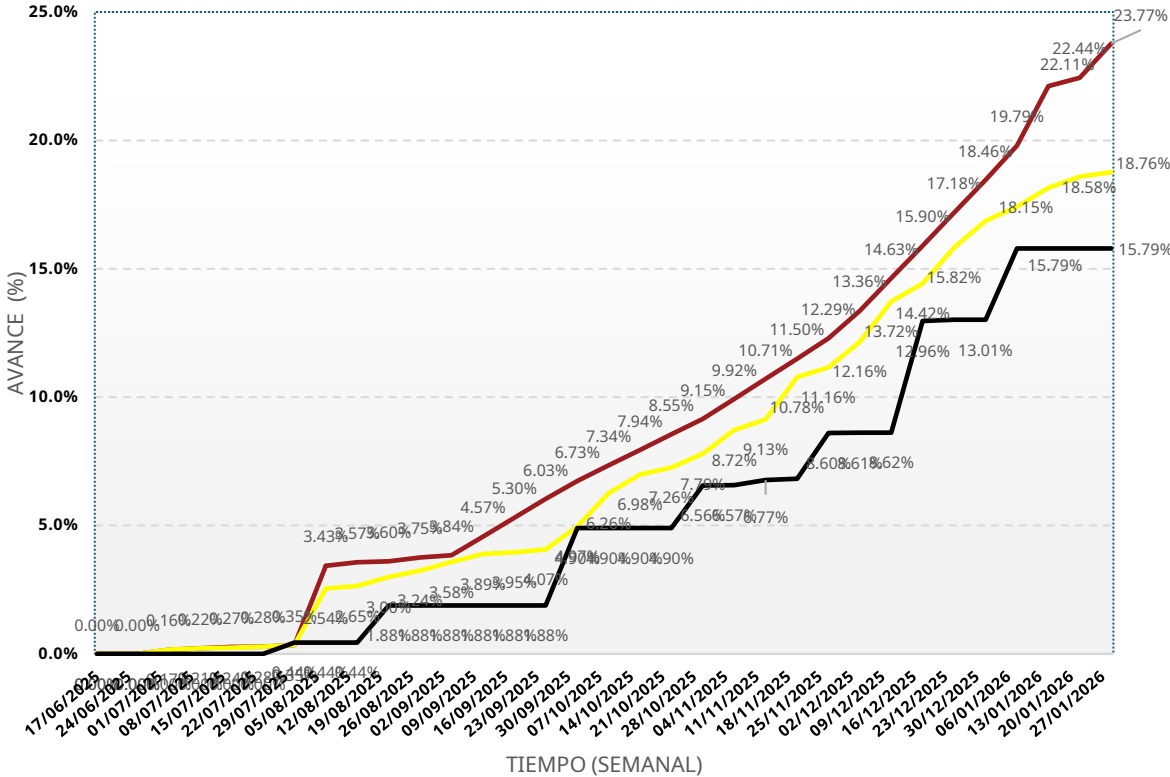

	Del 16 al 22 de enero de 2026		Del 23 al 29 de enero de 2026	
	Programado	Físico	Programado	Físico
Fuerza de Trabajo (personas)	60	60	60	60
Maquinaria	16	15	15	15
Frentes de trabajo	5	6	6	6
