

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance global

- Programado: 65.50 %
- Real: 54.07 %
- Semanal: 1.99 %
- Financiero: 29.98 %

 **Inversión total 2025-2026:** 86.0 mdp
Meta total: 0.601 km

 **Inversión 2025:** 31.0 mdp
Meta 2025: 38.6 % del Puente
Inversión 2026: 55.0 mdp
Meta 2026: 61.4 % del Puente


 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: Marzo, 2026

 **4,053** habitantes beneficiados

 **258** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

Beneficios: Con la construcción del Puente se garantizará que la comunidad de la Presa tenga acceso a los servicios básicos ininterrumpidos en épocas de lluvias, mismos que en la actualidad se ven afectados por las crecientes del Río El Salado.

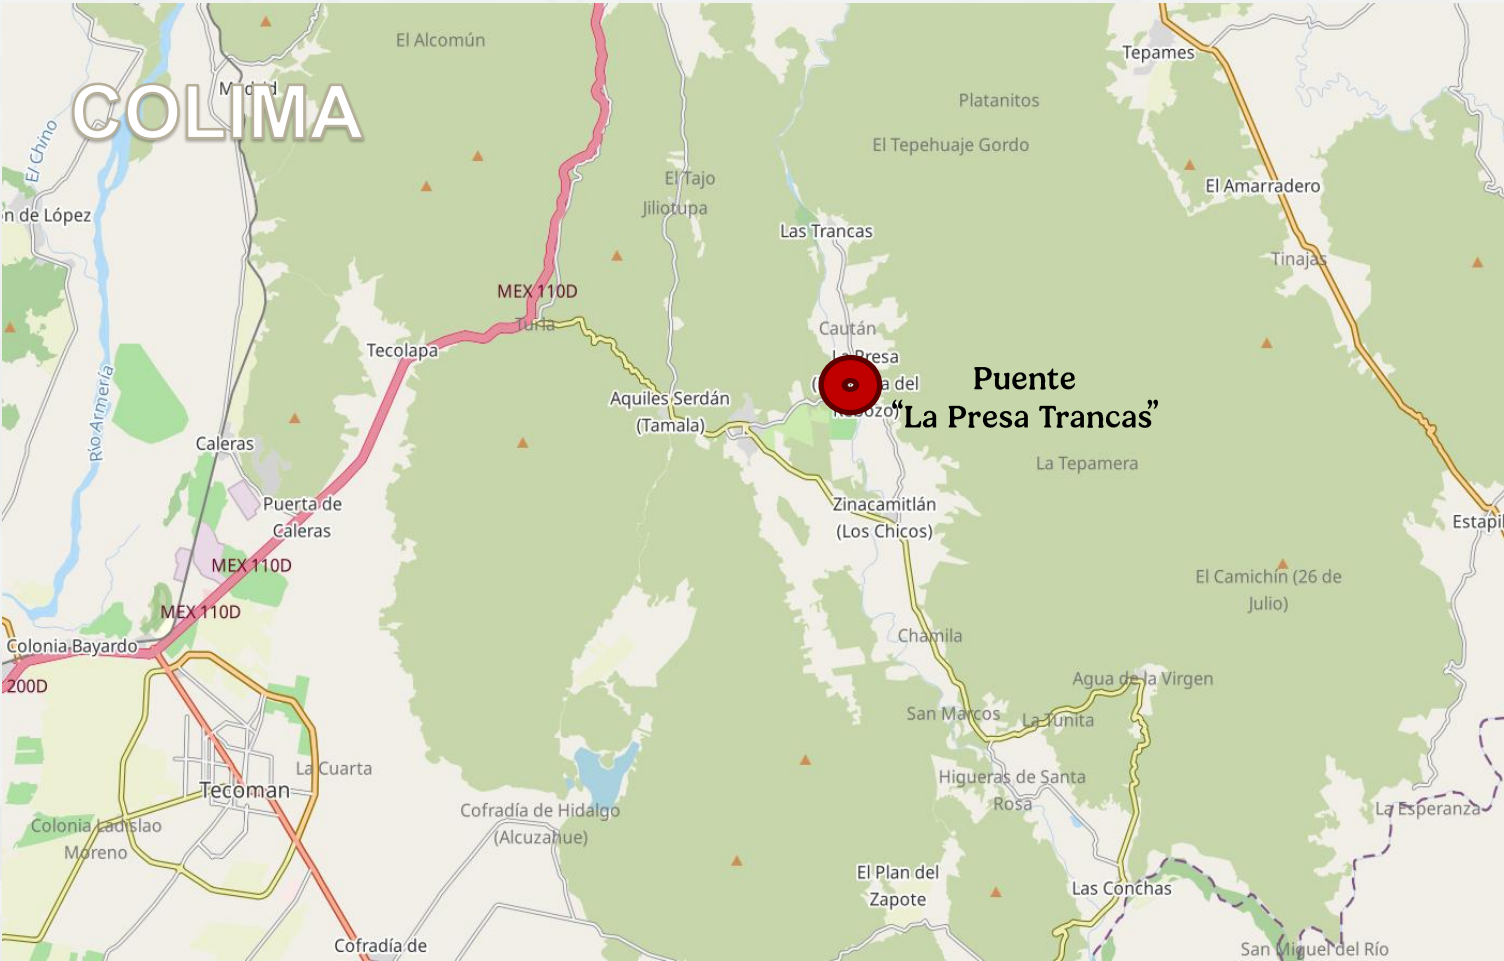


Tramo	Empresas
Construcción del Puente La Presa Trancas	• Contratista: GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERÍA, SA DE CV

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	06/02/26 al 12/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Desmonte y Despalme (Ha)	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	
Subestructura						
Pilas de cimentación (Perforación). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
Pilas de cimentación (Armado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
Pilas de cimentación (Colado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
Columnas. Pza.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Construcción de cabezales y bancos. Pza.	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00	
Superestructura						
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Fabricación)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)	18.00	0.00	18.00	6.00	0.00	
Colado de diafragma y losa. M3	197.1	0.00	197.1	0.00	0.00	
Carpeta asfáltica. M3.	220	0.00	220	0.00	0.00	
Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.	43.8	0.00	43.8	0.00	0.00	
Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.	182	0.00	182	0.00	0.00	

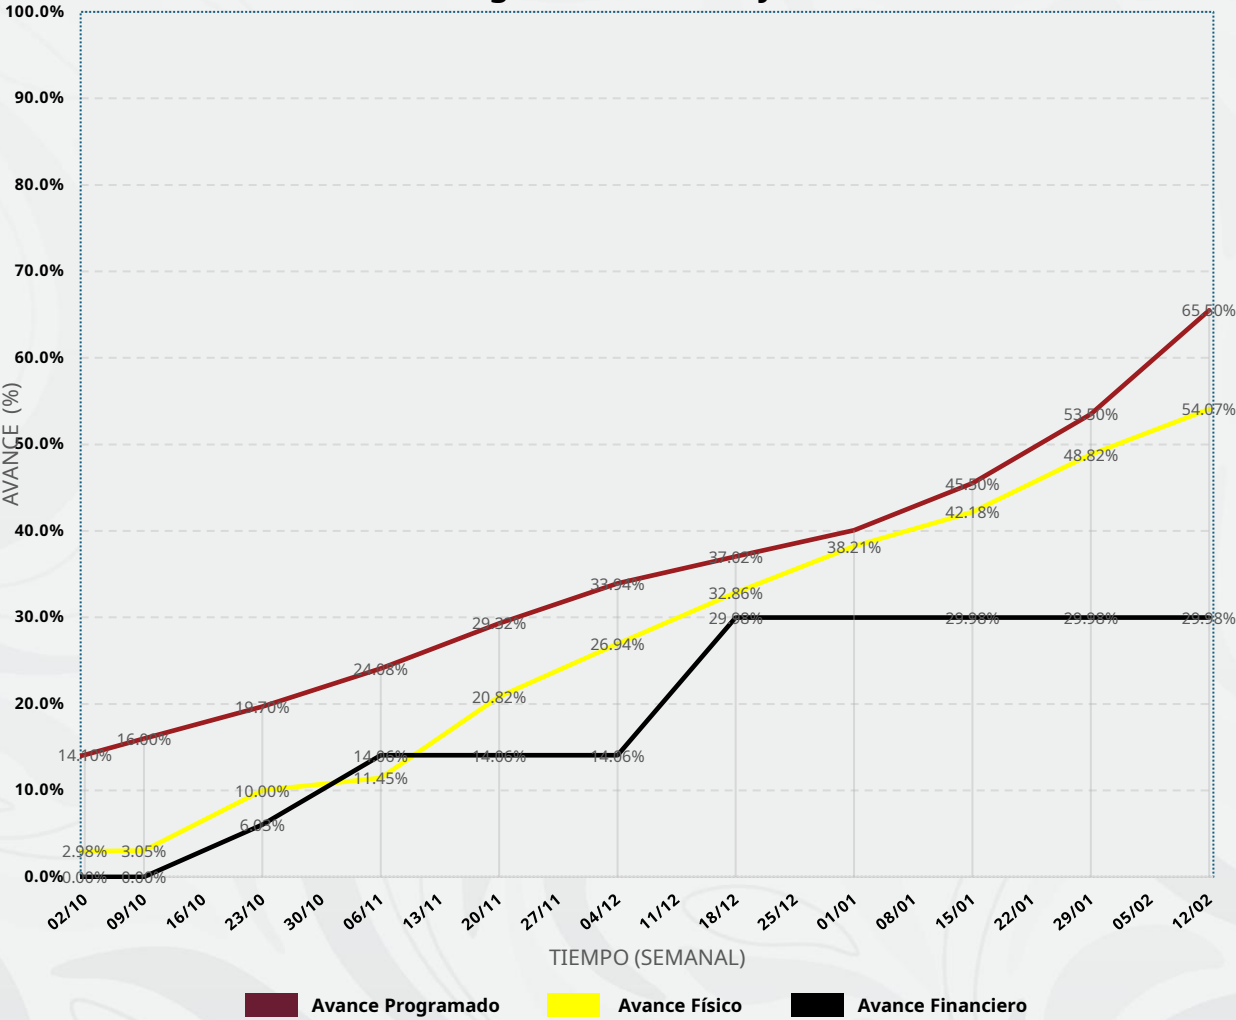

	30 enero al 05 de febrero	06 febrero al 12 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	58	59
Maquinaria	9	5
Frentes de trabajo	7	6
