

CDMX

Alameda Oriente

Avance global

- Programado: 12.29%
- Real: 11.16%
- Semanal: 0.38%
- Financiero: 8.60%

Avance 2025

- Programado: 76.81%
- Real: 67.75%
- Semanal: 2.37%
- Financiero: 64.42%

Inversión total 2025-2027: 2,000 mdp
Inversión 2025: 267 mdp | (16% de 2 puentes)

Meta total: 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.

Inicio: 17 de junio de 2025
Término: Octubre 2027
Término meta 2025: Diciembre

1,798,474 habitantes beneficiados

6,000 empleos generados

15 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Nivel de Servicio en estudio



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado Acumulado	Faltante	21/nov/25 al 27/nov/25 Programado	Ejecutado
Estudios (Puentes 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puentes 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Demolición y retiro de estructura (Puentes 2)	500	m	450	50	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puentes 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento de señal tipo puente (Puentes 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puentes 2)	4,740.4	m3	4,169.54	570.86	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puentes 2)	58,115.16	m3	9,076.71	49,038.45	2,181.67	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puentes 2)	42,615.03	m3	11,813.99	30,801.04	1,782.13	0
Construcción de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puentes 2)	2,292	Pzs	871	1,421	106.7	93
Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puentes 2)	2,292	Pzs	324	1,968	78.07	0
Excavación para desplante de Zapatas (Puentes 2)	1,984.10	m3	0	1,984.1	0	0
Construcción de Zapatas (Puentes 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Excavación para desplante de Cajones (Puentes 2)	1,984.10	m3	0	1,984.1	0	0
Construcción de Cajones (Puentes 2)	8.00	Pzs	0	8	0	0
Construcción de Columnas (Puentes 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Construcción de Cabezales (Puentes 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Fabricación de trabes pretensadas (Puentes 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puentes 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Fabricación de trabes de Acero (Puentes 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Traslado y montaje de trabes de Acero (Puentes 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Construcción de Losas de calzada (Puentes 2)	10.00	Claros	0	10	0	0
Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puentes 2)	960.00	m	0	960	0	0
Construcción de Accesos (Puentes 2)	1.00	Accesos	0	1	0	0
Construcción de línea de alumbrado público (Puentes 2)	1.00	Línea	0	1	0	0
Señalamiento Horizontal y Vertical (Puentes 2)	1.00	Lote	0	1	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puentes 1)	5,222.6	m3	1,057.41	4,165.19	0	79.49
Excavación en caminos de servicio (Puentes 1)	64,026.84	m3	7,108.37	56,918.47	0	1,378.33
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puentes 1)	46,949.97	m3	7,643.24	39,306.73	0	564.47

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

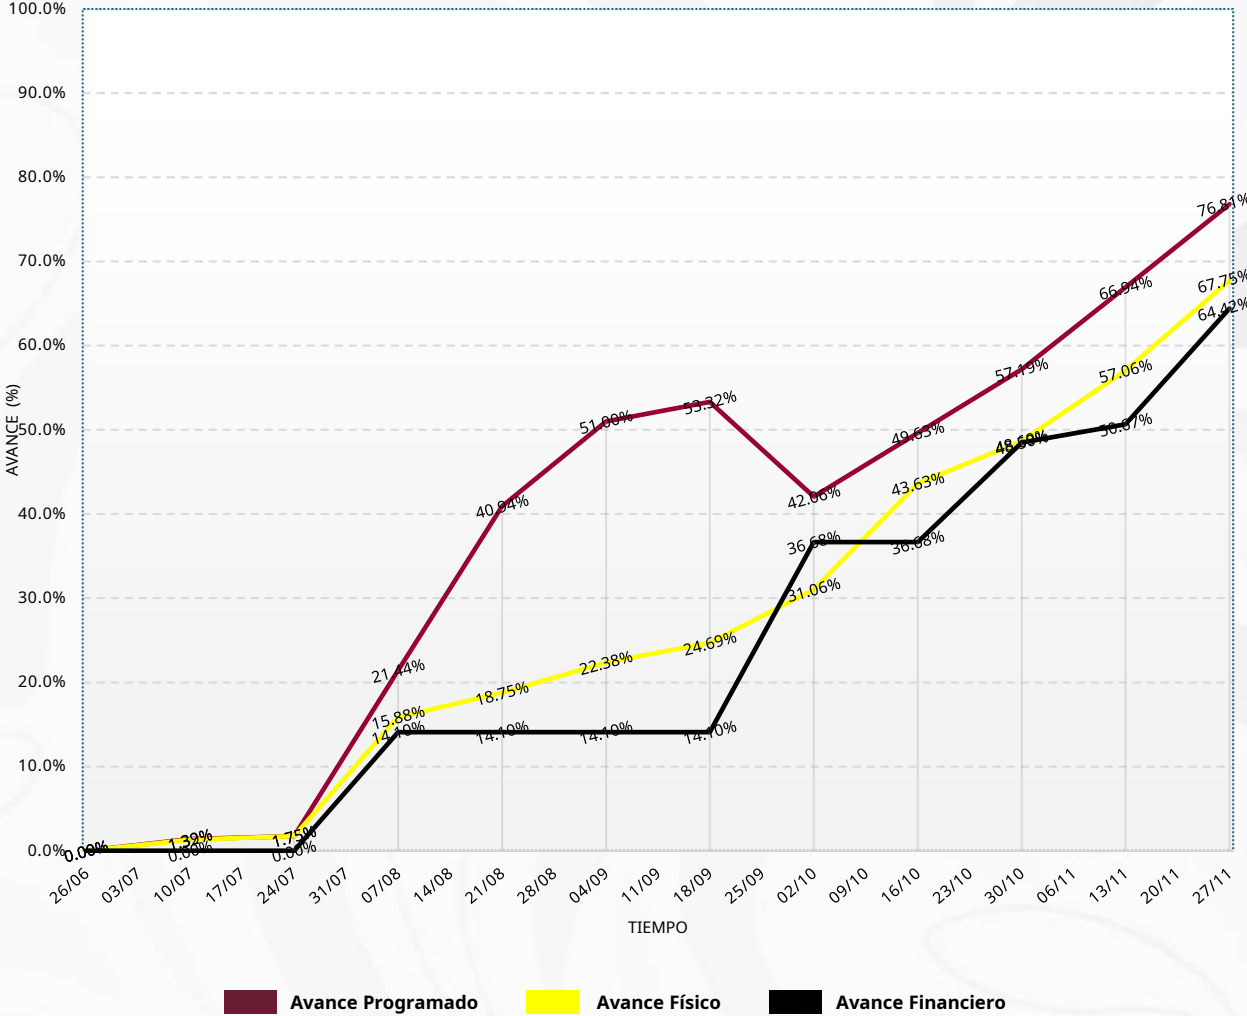

	Del 14 al 20 de noviembre de 2025	Del 21 al 27 de noviembre de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	71	70
Maquinaria	18	18
