

PSV Arco Norte

Colima



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 23.31%
- Real: 49.0%
- Semanal: 13.5%
- Financiero: 25.92%

Avance 2025

- Programado: 68.34%
- Real: 100.00%
- Semanal: 39.67%
- Financiero: 76.00%



Inversión total 2025-2026: 369.7 mdp
Inversión 2025: 127.4 mdp



Meta total: 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.
Meta 2025: 200.6 m (34.1% (cimentación y subestructura))



Inicio: 10 de junio de 2025
Término: Abril de 2026
Término meta 2025: diciembre




306,810 habitantes beneficiados



1,109 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

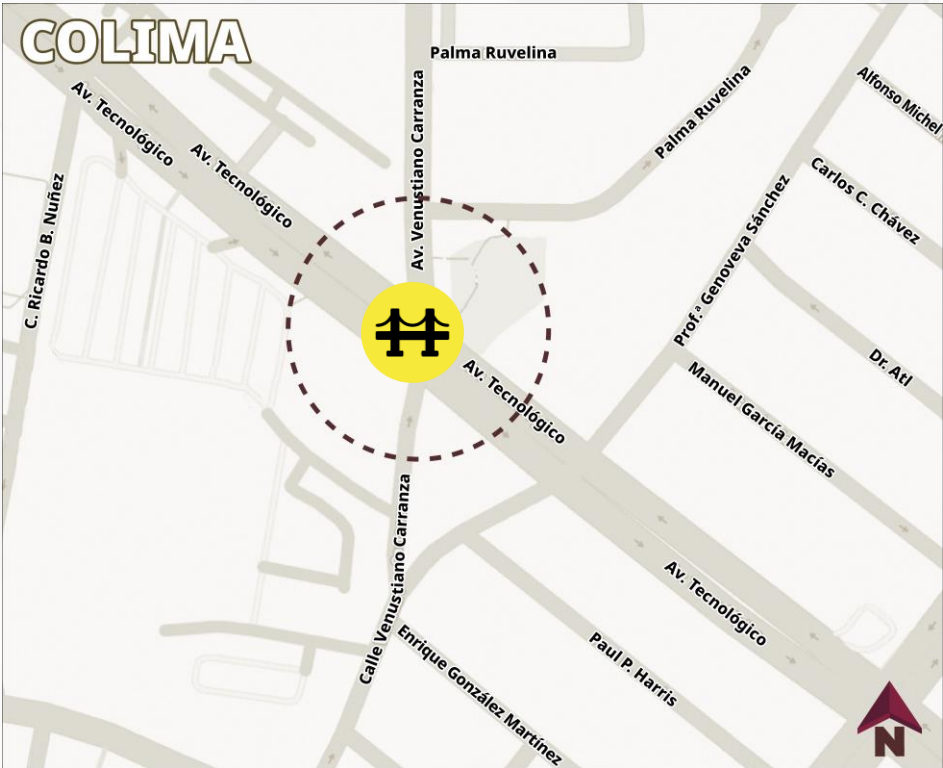

Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte"	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V • Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V

PSV Libramiento Arco Norte

Colima


Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/11/25 al 27/11/25	
				Programado	Ejecutado
Trabajos diversos					
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00
Terracerías					
Corte (m³)	9,295.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00
Terraplén (m³)	9,292.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00
Subyacente (m³)	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00
Subrasante (m³)	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
Subestructura					
Pilas (pza)	76.00	76.00	1.00	4.13	10.00
Zapatas (pza)	20.00	18.00	2.00	1.25	2.00
Columnas (pza)	42.00	34.00	8.00	2.63	2.00
Cabezales (pza)	22.00	18.00	4.00	1.38	2.00



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

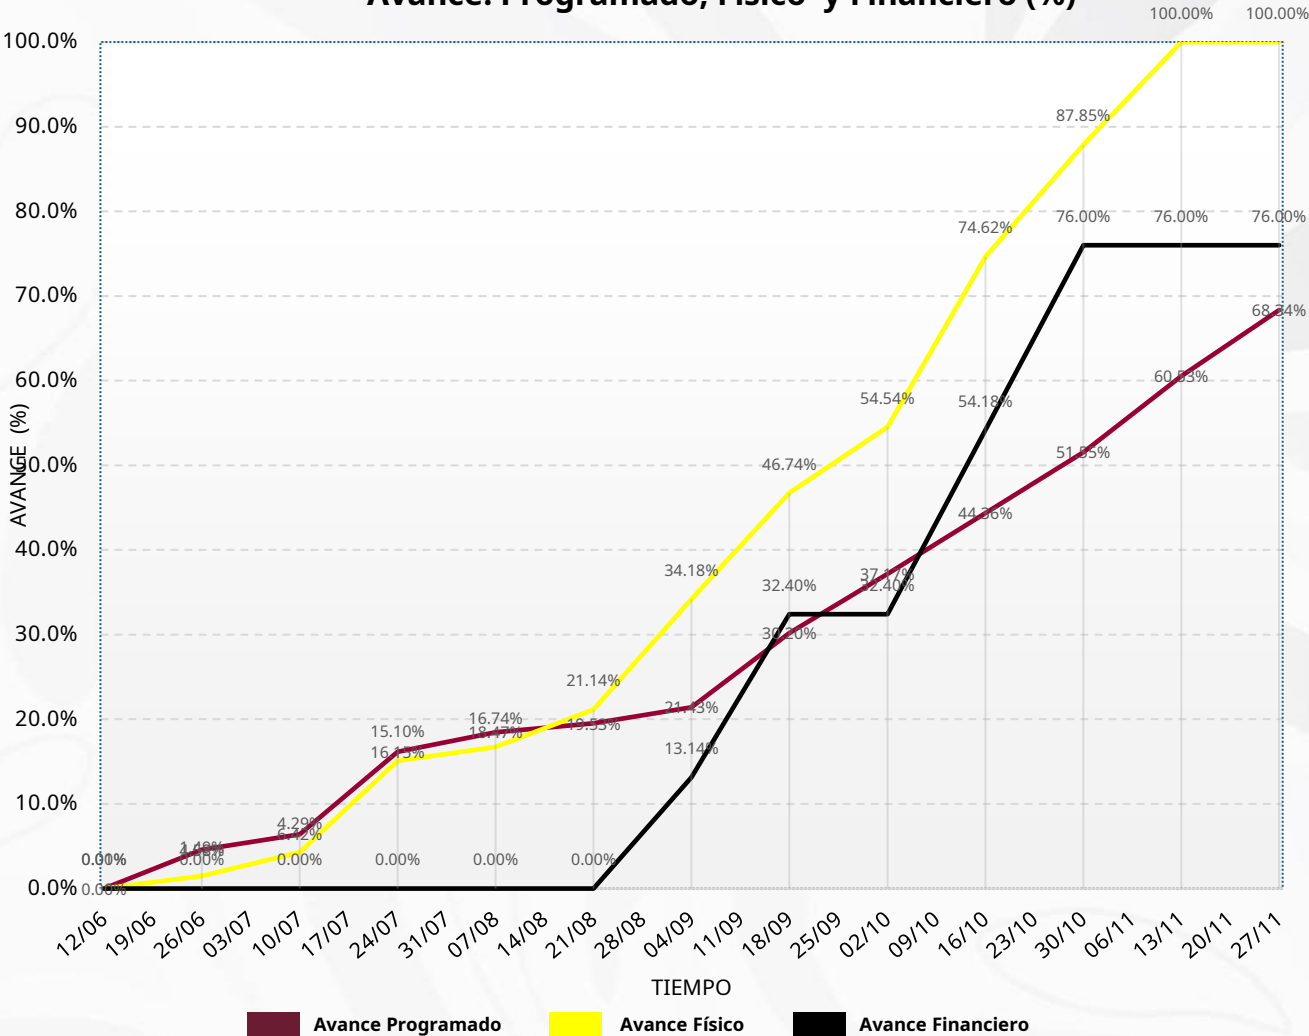

	14 de noviembre al 20 de noviembre	21 de noviembre al 27 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	85	85
Maquinaria	18	18
