

PSF Arco Sur

Colima



Avance global • Programado: 56.29%
• Real: 61.55%
• Semanal: 1.99%
• Financiero: 37.77%



Inversión total 2025-2026: 630.0 mdp
Meta total: 1.2 km (puente y accesos)



Inversión 2026: 350 mdp
Meta 2026: 0.65 km (54% del puente (superestructura y accesos))



Inicio: 03-Julio de 2025
Término: abril de 2026




157,048 habitantes beneficiados



1,890 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

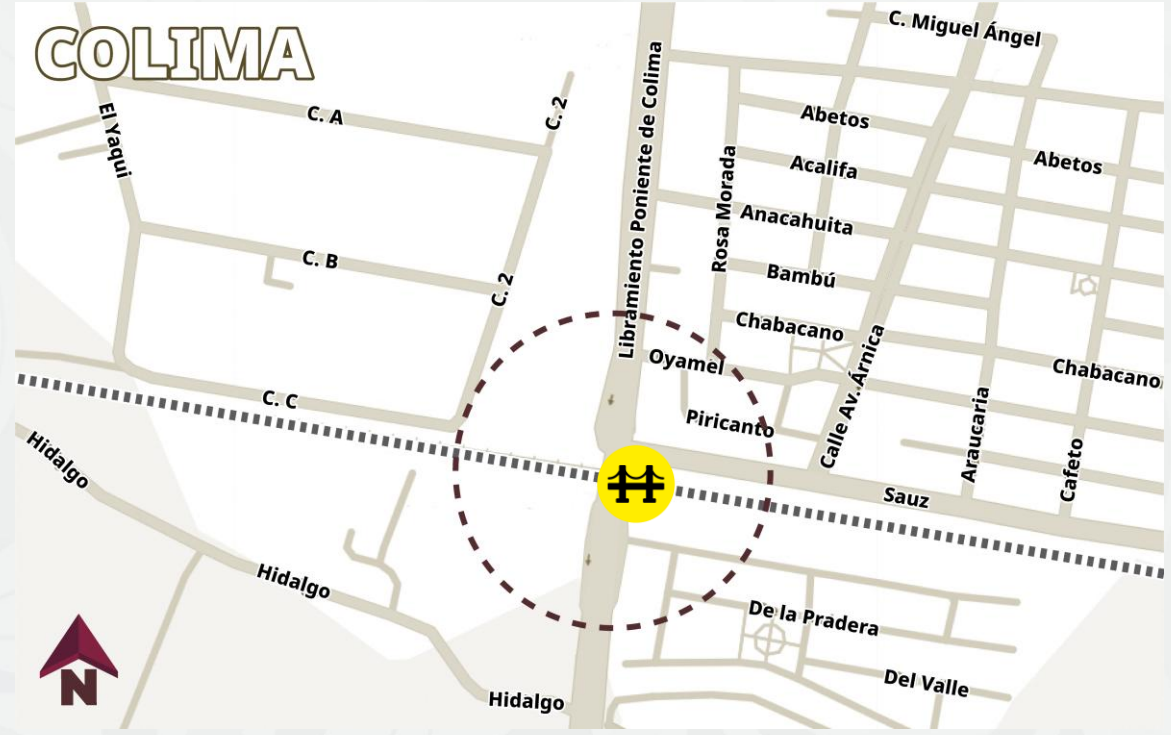

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	- Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V - Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V


PSF Arco Sur
Colima

ACTUALIZADA



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

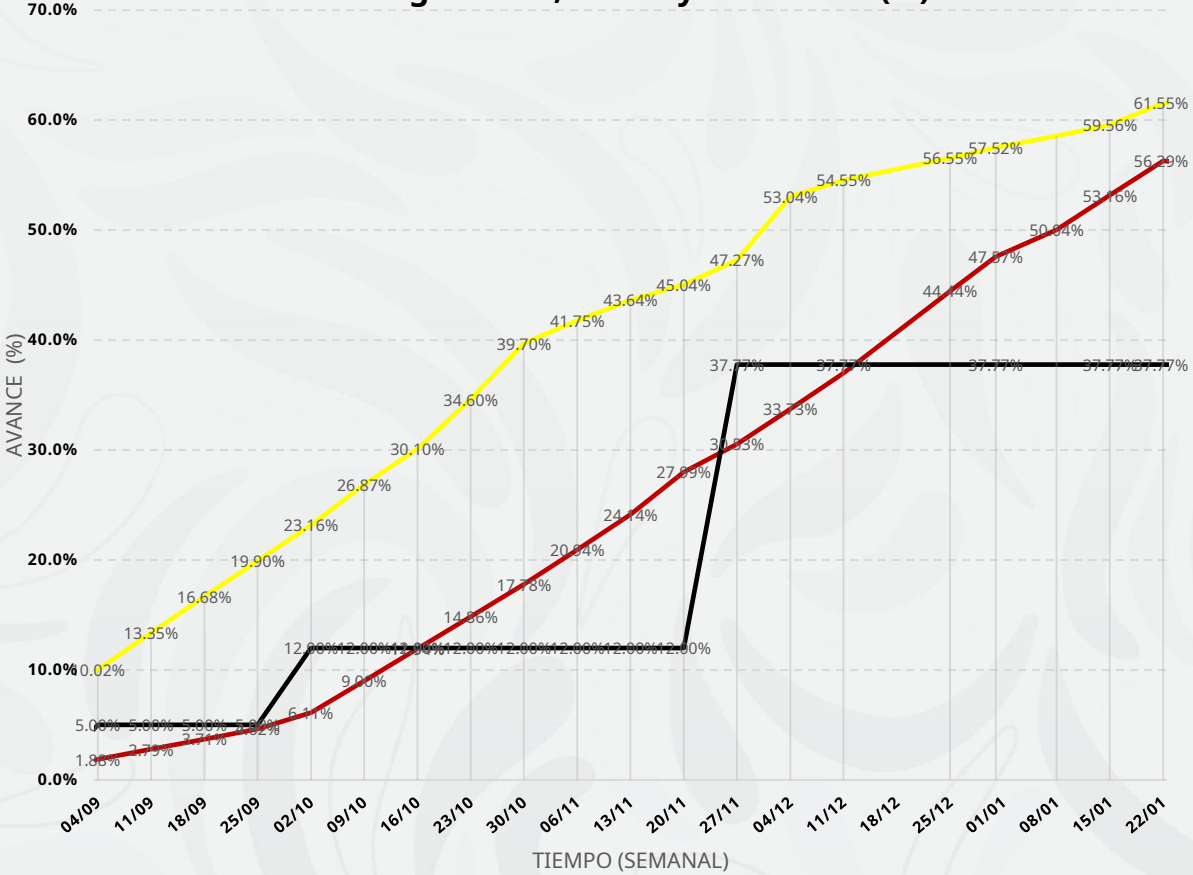

	09 al 15 de enero de 2026	16 al 22 de enero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	163	163
Maquinaria	54	54
Fuerza de trabajo	11	11
