

Puente La Presa Trancas

Colima



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 24.08 %
- Real: 11.45 %
- Semanal: 0.55 %
- Financiero: 11.45 %

Avance 2025

- Programado: 60.20 %
- Real: 28.63 %
- Semanal: 1.38 %
- Financiero: 28.62 %

 **Inversión total 2025-2026:** 90.0 mdp
Inversión 2025: 30.0 mdp


 **Meta total:** 0.601 km
Meta 2025: 38.6 % del Puente

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: 10 de agosto, 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre

 **4,053** habitantes beneficiados

 **225** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

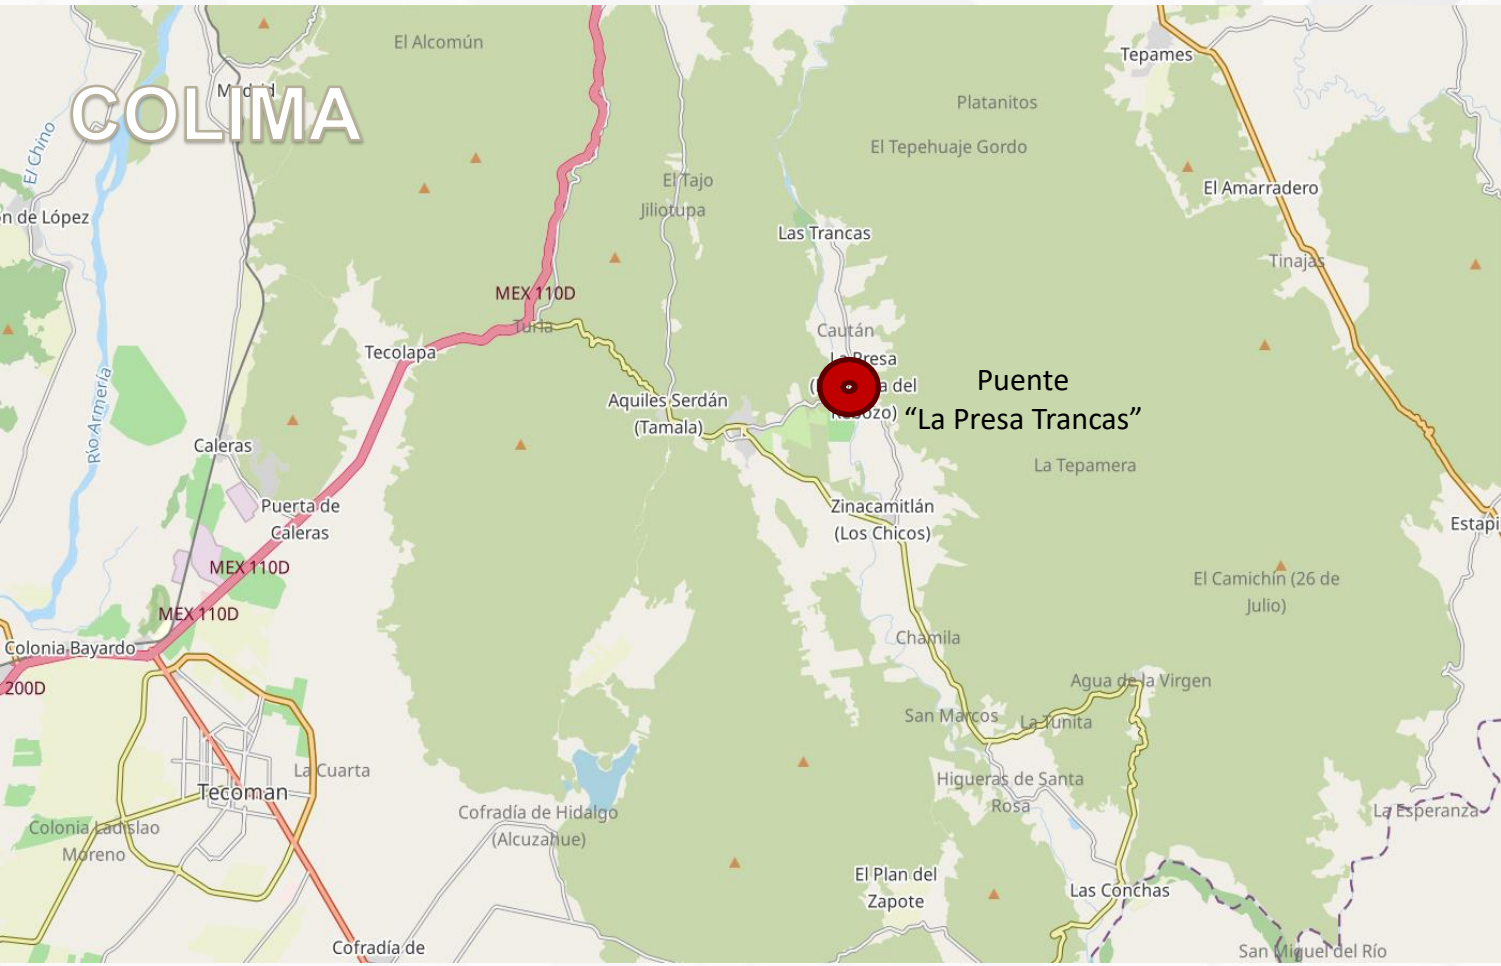

Tramo	Empresas
Construcción del Puente La Presa Trancas	• Contratista: GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERÍA, SA DE CV

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	31/10/25 al 06/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Desmonte y Despalme (Ha)	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	
Subestructura						
Pilas de cimentación (Perforacion). Pza.	26.00	9.0	17.0	2.1	4.00	
Pilas de cimentación (Armado). Pza.	26.00	20.0	6.00	1.2	2.00	
Pilas de cimentación (Colado). Pza.	26.00	9.00	17.00	2.1	4.00	
Columnas. Pza.	2.00	0.00	2.00	0.3	0.00	
Cnstruccion de cabezales y bancos. Pza.	4.00	0.00	4.00	1.3	0.00	
Superestructura						
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza)	18.00	1.7	16.3	2.3	1.7	
Colado de diafragma y losa. M3	197.1	0.00	197.1	0.00	0.00	
Carpeta asfáltica. M3.	220	0.00	220	0.00	0.00	
Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.	43.8	0.00	43.8	0.00	0.00	
Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.	182	0.00	182	0.00	0.00	

