

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance global

• Programado: 32.10%

• Semanal: 0.50%

• Real: 42.20%

• Financiero: 24.10%



Inversión total 2025-2026: 740 mdp

Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inversión 2025: 140 mdp

Meta 2025: 38% de 1 Distribuidor Vial

Inversión 2026: 600 mdp

Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial



Inicio: 16 de julio de 2025

Término meta 2025: Diciembre 2025

Término meta total: Julio de 2026



73,215 habitantes beneficiados




2,220 empleos generados



20 min ahorro en tiempo


Beneficios Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.

Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

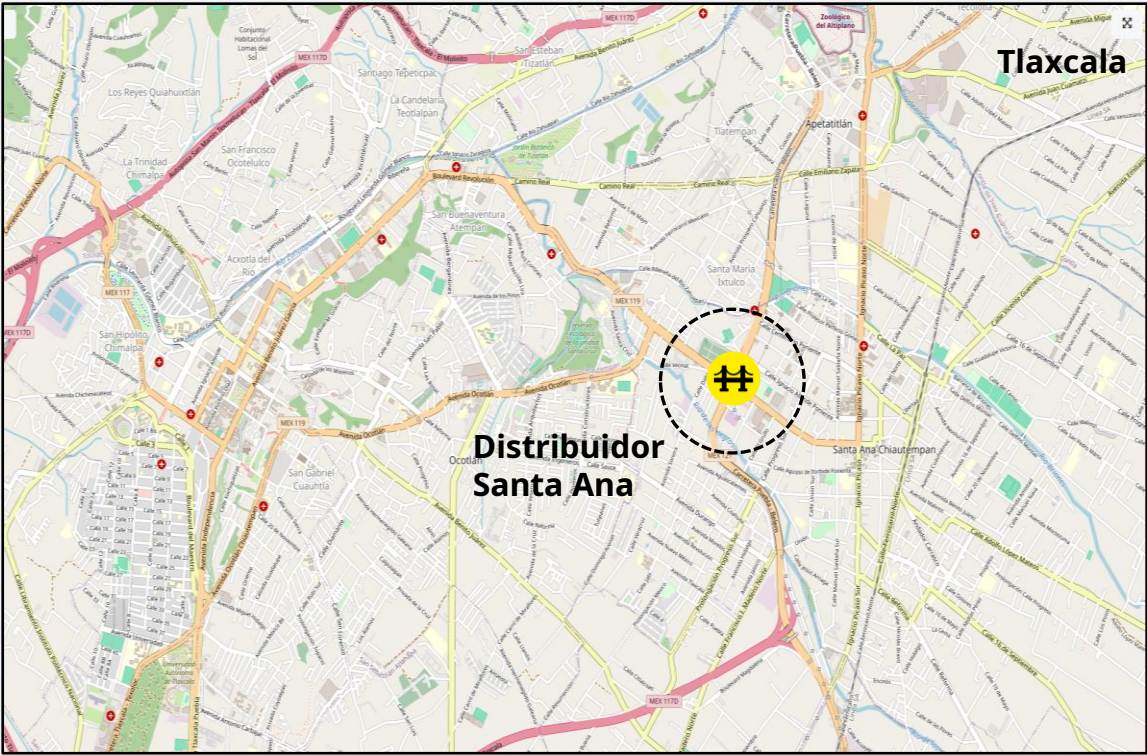

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	20 al 26-02-26		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	42.20% 1 Distribuidor Vial	57.80% de 1 Distribuidor Vial	0.54%	0.50%	Se trabaja en: Construcción de columnas eje #6, traes Aashto VI y Nebraska, cabezales metálicos y de diafragmas concreto.

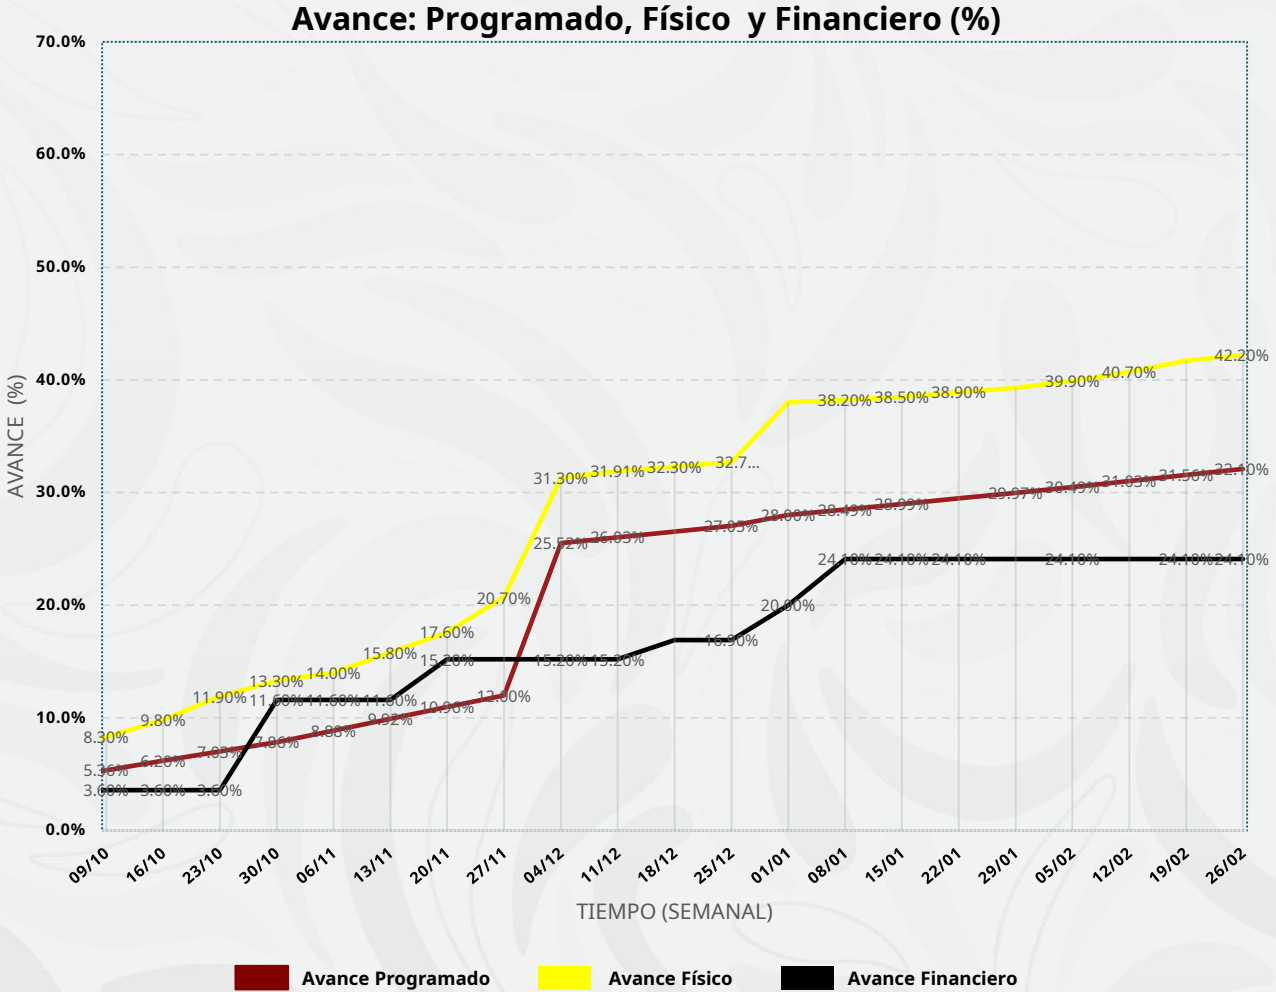

	13 al 19 de febrero	20 al 26 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	68	65
Maquinaria	19	14
Frente de trabajo	6	5
