

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Gobierno de México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 32.64%
- Real: 46.53%
- Semanal: 2.77%
- Financiero: 38.07%

Avance 2025

- Programado: 59.35%
- Real: 84.60%
- Semanal: 5.04%
- Financiero: 85.70%

Inversión total 2025-2026: 450 mdp
Inversión 2025: 200 mdp | 1.35 km del Deprimido

Meta total: 1 Deprimido | **1.5 km**
Gasas | 4.1 km

Inicio: 12 de mayo de 2025
Término: Junio de 2026
Término meta 2025: Diciembre

351,000 habitantes beneficiados

1,350 empleos generados

25 min ahorro en tiempo



Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Baja California Sur

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur
Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	10/10/25 al 16/10/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Retiro de vegetación	500 pzas	480 pzas	20 pzas	0 pzas	0 pzas	
Reubicación de Monumento FONATUR	1 pza	0.7 pza	0.3 pza	0 pzas	0 pza	
Canal Tipo Cajón						
Canal tipo cajón	1,099.4 m	1,099.4 m	-	-	-	Concluido
Terracerías						
Terracerías	14,112 m3	4,200 m3	9,912 m3	0 m3	0 m3	
Subbase	4,776 m3	0 m3	4,776 m3	0 m3	0 m3	
Base hidráulica	11,840 m3	2,800 m3	9,040 m3	0 m3	510 m3	
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas	20 pzas	4 pzas	16 pzas	1.8 pzas	0 pzas	
Muros de 2 a 7 m	20 pzas	4 pzas	16 pzas	1.4 pzas	0 pzas	
Pilas tangentes	1,100 pzas	710 pzas	390 pzas	55 pzas	30 pzas	
Trabes de liga	1,597.2 m	330 m	1,267.2 m	228.17 m	0 m	
Fabricación de cabezal	8 pzas	0 pzas	8 pzas	1 pzas	0 pzas	
Fabricación trabes AASHTO tipo III	52 pzas	17 pzas	35 pzas	6.5 pzas	2 pzas	
Montaje trabes AASHTO tipo III	52 pzas	0 pzas	52 pzas	0 pzas	0 pzas	
Guarnición y banquetas	3,629.2 m3	0 m3	3,629.2 m3	0 m3	0 m3	
Pavimento rígido	5,227 m3	0 m3	5,227 m3	0 m3	0 m3	
Pavimento flexible	34,720 m3	142.08 m3	34,577.92 m3	0 m3	0 m3	
Parapeto	1,795.2 m	0 m	1,795.2 m	0 m	0 m	
Semaforización						
Semaforización	100%	0%	100%	0%	0%	
Obra inducida						
Reubicación de línea de media tensión de CFE	2,275 m	1,630 m	645 m	78.69 m	0 m	
Reubicación de acueducto	1,023 m	1,023 m	-	-	-	Concluido
Reubicación de línea de distribución	910 m	810 m	100 m	0 m	0 m	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Glorieta Fonatur km 30+300

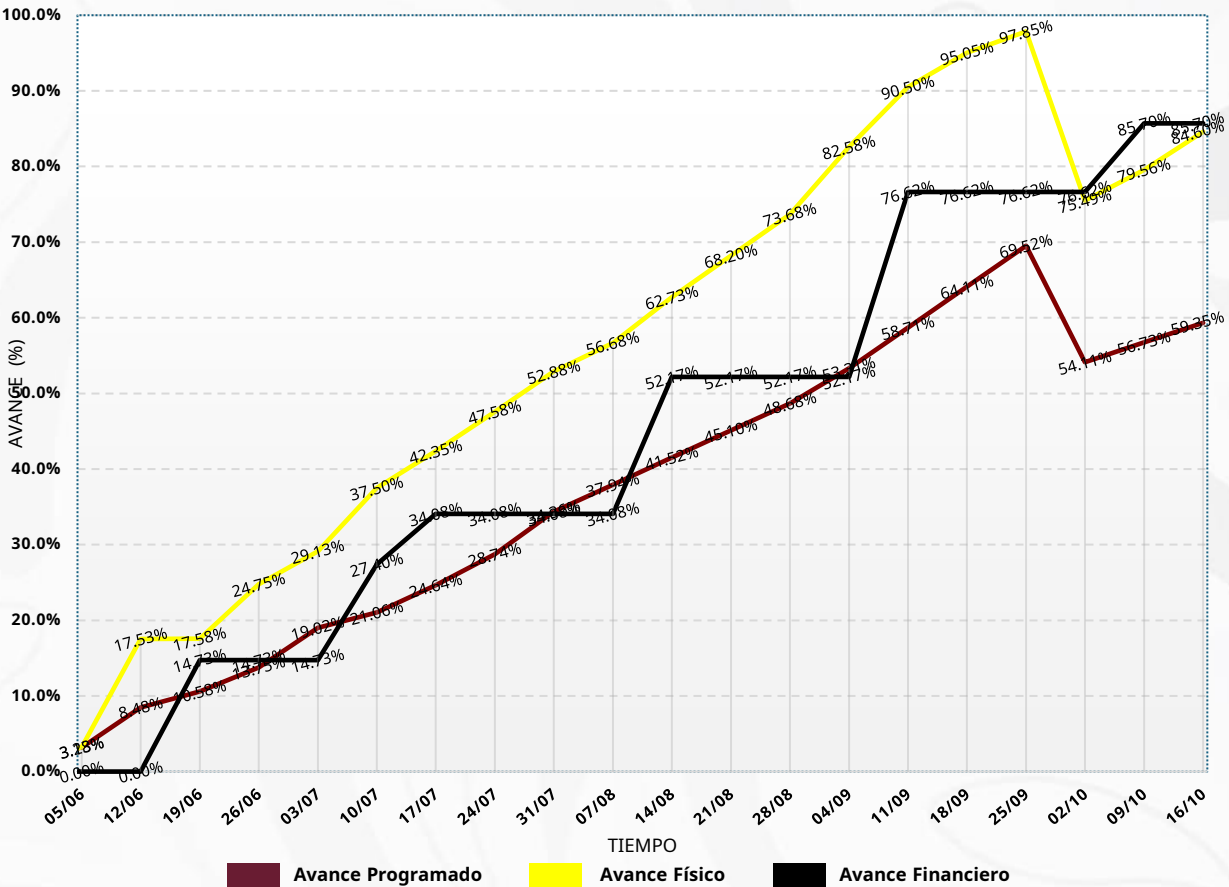

	03 de octubre al 09 de octubre	10 de octubre al 16 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	101	101
Maquinaria	16	16
