

# CDMX

## Alameda Oriente



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

### Avance global

- Programado: 21.11%
- Real: 18.15%
- Semanal: 0.74%
- Financiero: 15.79%



**Inversión total 2025-2027:** 2,000 mdp  
**Inversión 2025:** 317 mdp | (16.86% de 2 puentes)  
**Inversión 2026:** -- mdp | (--% de 2 puentes)



**Meta total:** 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.



**Inicio:** 17 de junio de 2025  
**Término:** Octubre 2027  
**Término meta 2026:** Diciembre



**1,798,474** habitantes beneficiados




**6,000** empleos generados



**15 min** ahorro en tiempo

### Empresas

- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.

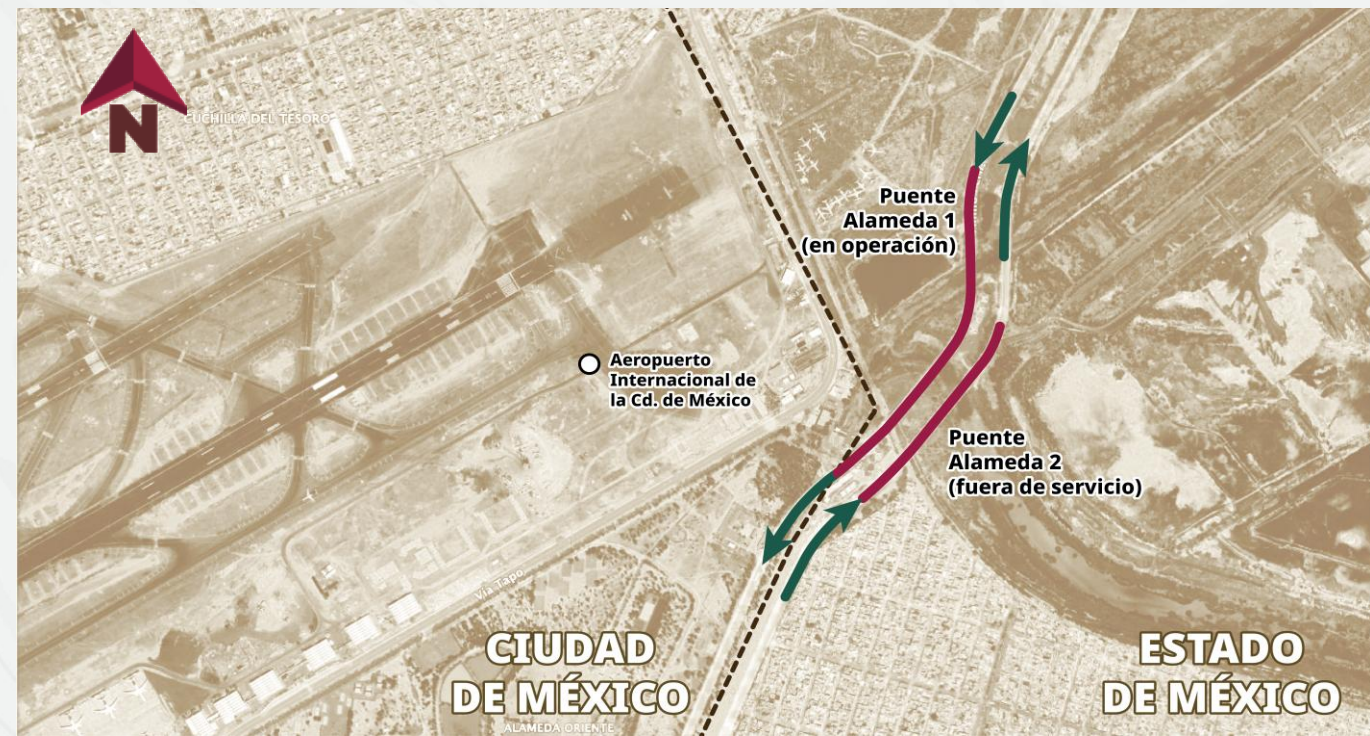

Situación actual



Proyecto

# Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

## (Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)

| Elemento                                                            | Intervención | Unidad    | Ejecutado |           | 09/ene/26 al 15/ene/26 |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
|                                                                     |              |           | Acumulado | Faltante  | Programado             | Ejecutado |
| Estudios (Puente 1 y 2)                                             | 1            | Actividad | 1         | 0         | 0                      | 0         |
| Proyectos (Puente 1 y 2)                                            | 1            | Actividad | 1         | 0         | 0                      | 0         |
| Demolición y retiro de estructura (Puente 2)                        | 500          | m         | 450       | 50        | 0                      | 0         |
| Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)                  | 18           | Pzs       | 18        | 0         | 0                      | 0         |
| Desmantelamiento de señal tipo puente (Puente 1 y 2)                | 2            | Pzs       | 2         | 0         | 0                      | 0         |
| Despalme en caminos de servicio (Puente 2)                          | 4,740.4      | m3        | 4,169.54  | 570.86    | 0                      | 0         |
| Excavación en caminos de servicio (Puente 2)                        | 58,115.16    | m3        | 9,663.09  | 48,452.07 | 1,539.47               | 0         |
| Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 2)         | 42,615.03    | m3        | 13,690.88 | 28,924.15 | 1,033.09               | 0         |
| Construcción de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puente 2) | 1,892        | Pzs       | 1,607     | 285       | 98.71                  | 227       |
| Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puente 2)                | 1,892        | Pzs       | 572       | 1,320     | 92.62                  | 56        |
| Excavación para desplante de Zapatas (Puente 2)                     | 1,984.10     | m3        | 0         | 1,984.1   | 165.34                 | 0         |
| Construcción de Zapatas (Puente 2)                                  | 3.00         | Pzs       | 0         | 3         | 0.3                    | 0         |
| Excavación para desplante de Cajones (Puente 2)                     | 1,984.10     | m3        | 1,539.15  | 444.95    | 152.62                 | 655.15    |
| Construcción de Cajones (Puente 2)                                  | 8.00         | Pzs       | 0         | 8         | 0.64                   | 0         |
| Construcción de Columnas (Puente 2)                                 | 11.00        | Pzs       | 0         | 11        | 0                      | 0         |
| Construcción de Cabezales (Puente 2)                                | 11.00        | Pzs       | 0         | 11        | 0                      | 0         |
| Fabricación de trabes pretensadas (Puente 2)                        | 44.00        | Pzs       | 0         | 44        | 0                      | 0         |
| Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puente 2)                 | 44.00        | Pzs       | 0         | 44        | 0                      | 0         |
| Fabricación de trabes de Acero (Puente 2)                           | 3.00         | Pzs       | 0         | 3         | 0                      | 0         |
| Traslado y montaje de trabes de Acero (Puente 2)                    | 3.00         | Pzs       | 0         | 3         | 0                      | 0         |
| Construcción de Losas de calzada (Puente 2)                         | 10.00        | Claros    | 0         | 10        | 0                      | 0         |
| Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puente 2)          | 960.00       | m         | 0         | 960       | 0                      | 0         |
| Construcción de Accesos (Puente 2)                                  | 1.00         | Accesos   | 0         | 1         | 0                      | 0         |
| Construcción de línea de alumbrado publico (Puente 2)               | 1.00         | Línea     | 0         | 1         | 0                      | 0         |
| Señalamiento Horizontal y Vertical (Puente 2)                       | 1.00         | Lote      | 0         | 1         | 0                      | 0         |
| Despalme en caminos de servicio (Puente 1)                          | 5,222.6      | m3        | 4,546     | 676.6     | 0                      | 0         |
| Excavación en caminos de servicio (Puente 1)                        | 64,026.84    | m3        | 10,051.18 | 53,975.66 | 0                      | 0         |
| Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 1)         | 46,949.97    | m3        | 12,180    | 34,769.97 | 0                      | 0         |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

