

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

• Programado: 53.16%


• Real: 59.56%

• Semanal: 1.01%


• Financiero: 37.77%

- **Inversión total 2025-2026:** 630.0 mdp
Inversión 2025: 280 mdp
- **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)
Meta 2026: 0.65 km **(54% del puente (superestructura y accesos))**
- **Inicio:** 03-Julio de 2025
Término: abril de 2026
Término meta 2025: Diciembre
- **157,048** habitantes beneficiados
- **1,431** empleos generados
- **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V

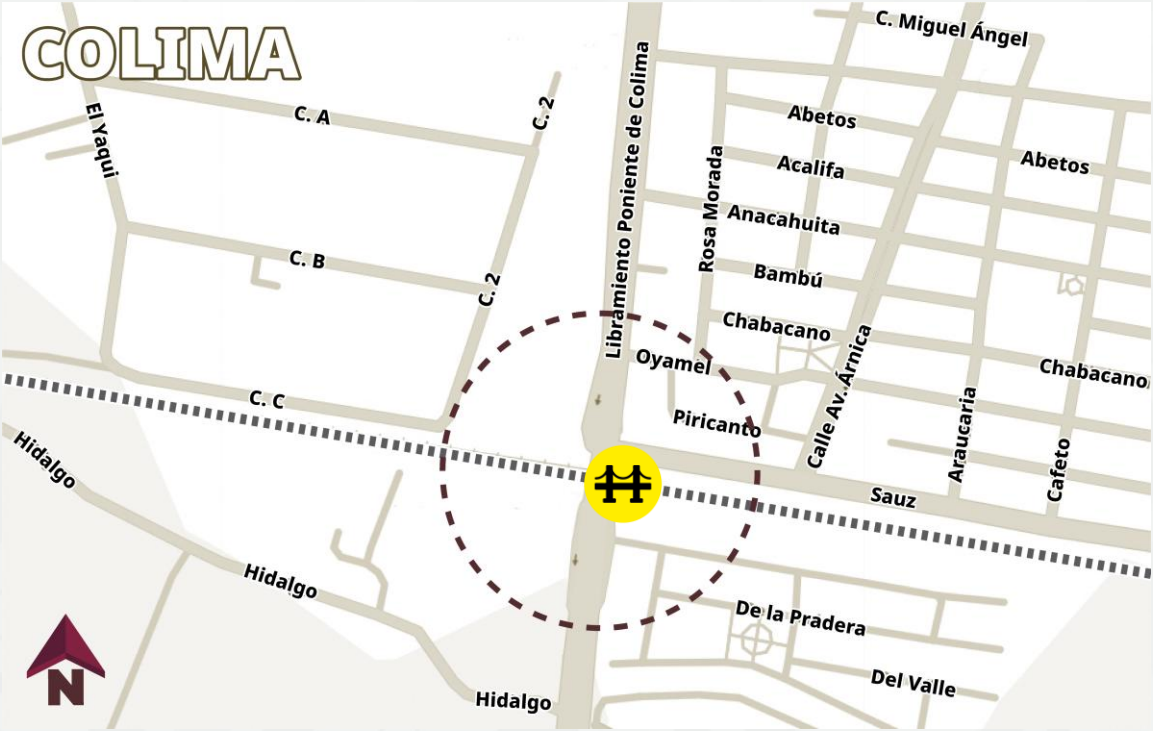

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

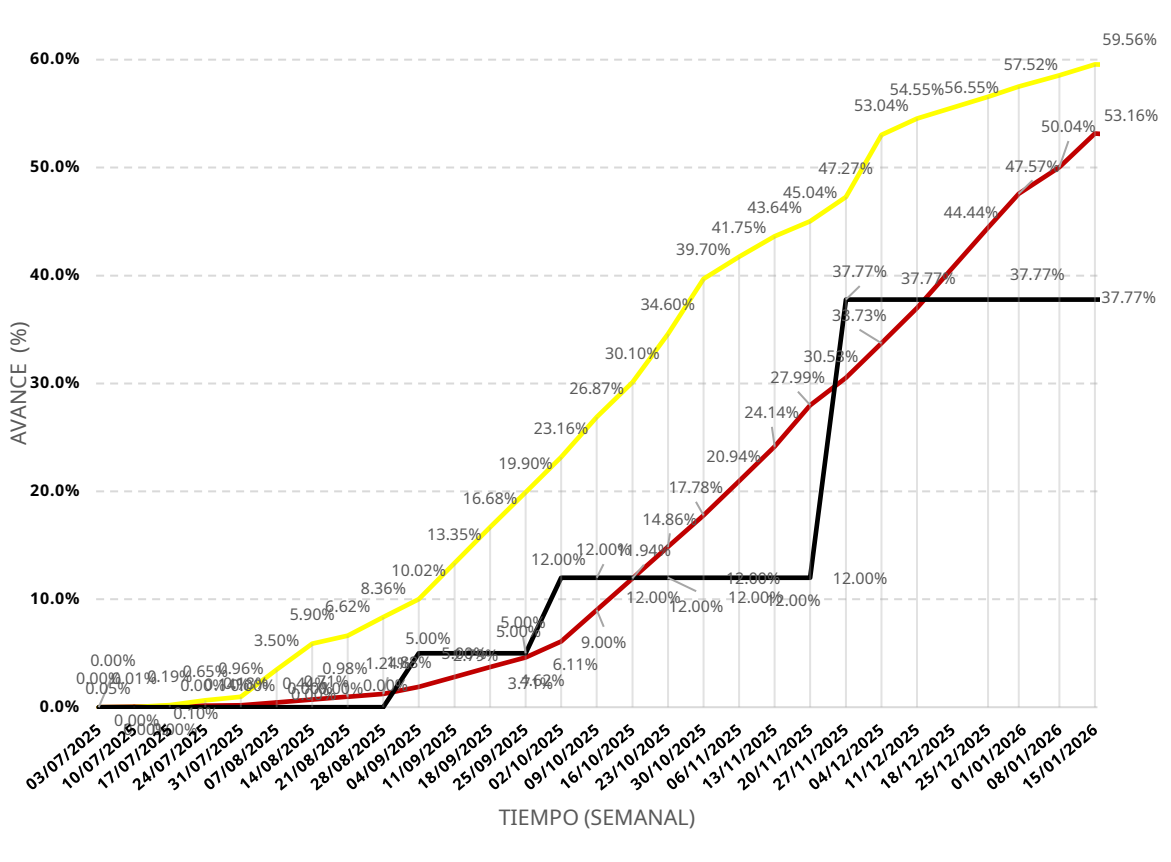

	02 al 08 de enero de 2026	09 al 15 de enero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	176	163
Maquinaria	60	54
Fuerza de trabajo	11	11
