

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance global

- Programado: 40.06 %
- Real: 38.21 %
- Semanal: 3.03 %
- Financiero: 29.98 %

Avance 2025

- Programado: 100.0 %
- Real: 95.53 %
- Semanal: 7.58 %
- Financiero: 100.0 %

 **Inversión total 2025-2026:** 86.0 mdp
Inversión 2025: 31.0 mdp


 **Meta total:** 0.601 km
Meta 2025: 38.6 % del Puente

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: Abril, 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre

 **4,053** habitantes beneficiados

 **225** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

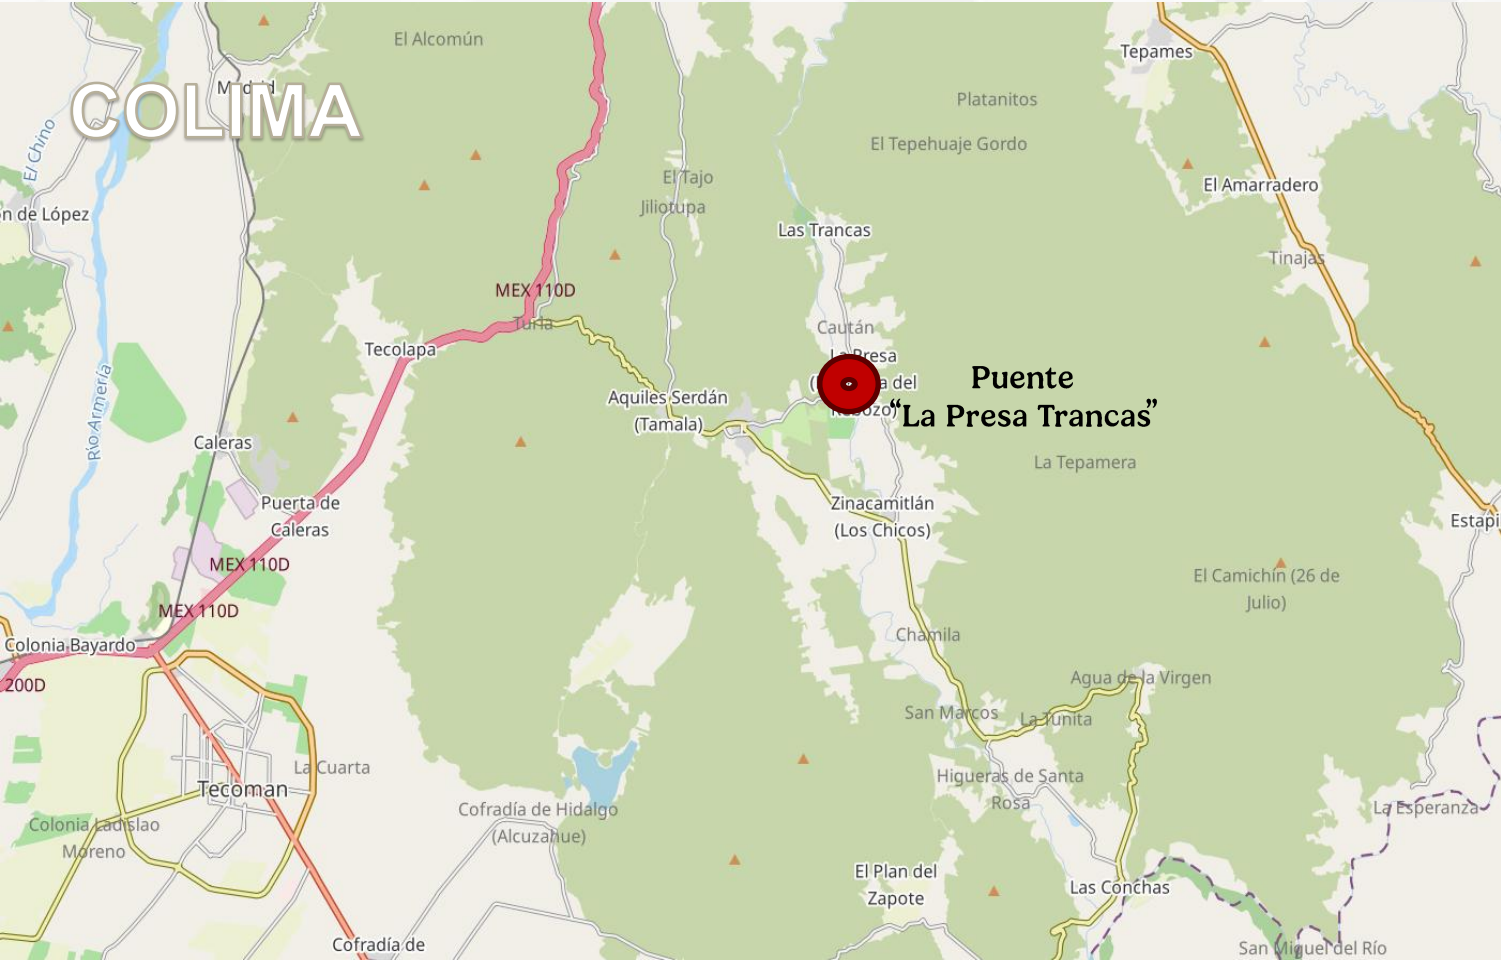

Tramo	Empresas
Construcción del Puente La Presa Trancas	• Contratista: GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERÍA, SA DE CV

Puente La Presa Trancas

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	26/12/25 al 01/01/26	
				Programado	Ejecutado
Preliminares					
Desmonte y Despalme (Ha)	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
Subestructura					
Pilas de cimentación (Perforacion). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Armado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Colado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Columnas. Pza.	2.00	0.00	2.00	0.30	0.00
Cnstruccion de cabezales y bancos. Pza.	4.00	0.00	4.00	0.80	0.00
Superestructura					
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Fabricación)	18.00	13.00	5.00	3.00	0.00
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00
Colado de diafragma y losa. M3	197.1	0.00	197.1	0.00	0.00
Carpeta asfáltica. M3.	220	0.00	220	0.00	0.00
Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.	43.8	0.00	43.8	0.00	0.00
Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.	182	0.00	182	0.00	0.00

