

CDMX

Alameda Oriente



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global


- Programado: 47.33%
- Real: 38.52%
- Semanal: 1.21%
- Financiero: 29.75%

- Inversión total 2025-2027:** 2,000 mdp
Meta total: 2 puentes | 1.2 km longitud total.
- Inversión 2025:** 315.81 mdp
Meta 2025: 16.86% de 2 puentes
Inversión 2026: 670 mdp
Meta 2026: 33.86% de 2 puentes
- Inicio:** Puente 2: 17 de junio de 2025 | Puente 1: Noviembre 2026
Término: Puente 2: Octubre 2026 | Puente 1: Octubre 2027
- 1,798,474** habitantes beneficiados
- 6,000** empleos generados
- 15 min** ahorro en tiempo

Beneficios: Contribuye a mejorar la conectividad de la zona oriente de la CDMX y EDO. MEX. mejorando el nivel de servicio, actualmente el Puente 1 opera en doble sentido de circulación (2 carriles en sentido Sur-Norte y 1 sentido Norte-Sur) debido al daño estructural en el Puente 2 ocasionado por los sismos de los años 2017, 2020 y 2021, reduciendo la capacidad de movilidad de 6 a 3 carriles.

Empresas

- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.

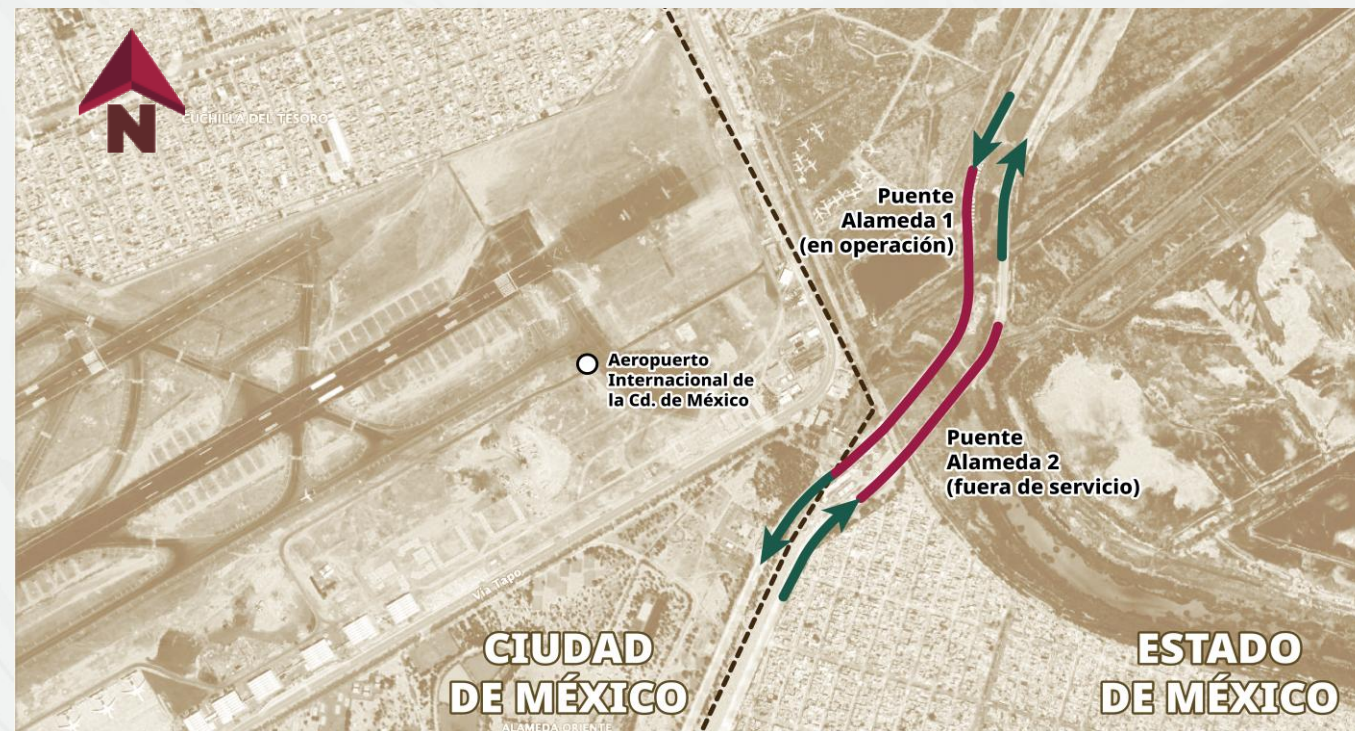

Situación actual




Proyecto

Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado Acumulado	Faltante	03/jul/26 al 09/jul/26	
					Programado	Ejecutado
Estudios (Puentes 1 y 2)	1.00	Actividad	1.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos (Puentes 1 y 2)	1.00	Actividad	1.00	0.00	0.00	0.00
Demolición y retiro de estructura (Puentes 1 y 2)	500.00	m	500.00	0.00	0.00	0.00
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puentes 1 y 2)	18.00	Pzs	18.00	0.00	0.00	0.00
Desmantelamiento de señal tipo puente (Puentes 1 y 2)	2.00	Pzs	2.00	0.00	0.00	0.00
Despalme en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	8,941.38	m3	7,333.75	1,607.63	0.00	0.00
Excavación en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	44,810.84	m3	39,516.75	5,294.09	0.00	1,923.62
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	65,681.44	m3	45,950.01	19,731.43	0.00	355.83
Fabricación de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puentes 1 y 2)	1,892.00	Pzs	1,892.00	0.00	0.00	0.00
Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puentes 1 y 2)	1,892.00	Pzs	1,853.00	39.00	21.92	58.00
Excavación para desplante de Zapatas (Puentes 1 y 2)	1,984.10	m3	1,470.73	513.37	0.00	0.00
Construcción de Zapatas (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	2.00	1.00	0.12	0.00
Excavación para desplante de Cajones (Puentes 1 y 2)	4,159.81	m3	3,879.86	279.95	0.00	0.00
Construcción de Cajones (Puentes 1 y 2)	8.00	Pzs	2.80	5.20	0.31	0.10
Construcción de Columnas (Puentes 1 y 2)	11.00	Pzs	4.00	7.00	0.80	0.00
Construcción de Cabezales (Puentes 1 y 2)	11.00	Pzs	3.00	8.00	0.54	0.00
Fabricación de trabes pretensadas (Puentes 1 y 2)	44.00	Pzs	11.00	33.00	2.00	1.00
Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puentes 1 y 2)	44.00	Pzs	10.00	34.00	2.07	2.00
Fabricación de trabes de Acero (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0.00	3.00	0.14	0.00
Traslado y montaje de trabes de Acero (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0.00	3.00	0.14	0.00
Construcción de Losas de calzada (Puentes 1 y 2)	10.00	Claros	0.00	10.00	0.50	0.00
Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puentes 1 y 2)	960.00	m	0.00	960.00	49.78	0.00
Construcción de Accesos (Puentes 1 y 2)	2.00	Accesos	0.00	2.00	0.10	0.00
Construcción de línea de alumbrado público (Puentes 1 y 2)	1.00	Línea	0.00	1.00	0.00	0.00
Señalamiento Horizontal y Vertical (Puentes 1 y 2)	1.00	Lote	0.00	1.00	0.00	0.00

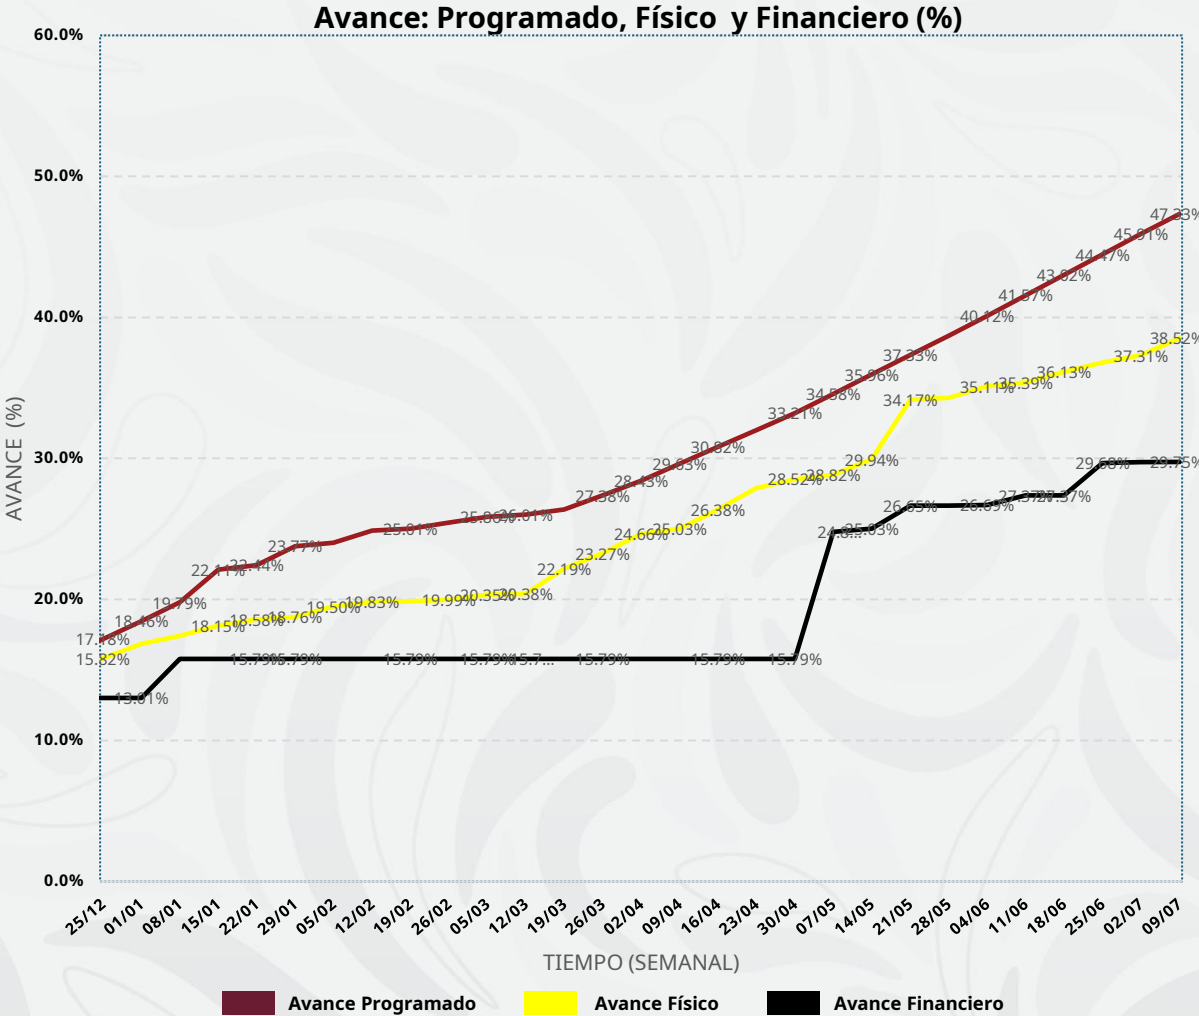

	Del 26 de junio al 02 de julio de 2026	Del 03 al 09 de julio de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	153	161
Maquinaria	16	16
Frentes de trabajo	10	10
