

Avance global

- Programado: 61.11%
- Real: 65.40%
- Semanal: 0.40%
- Financiero: 64.00%

 **Inversión 2025:** 140 mdp
Meta 2025: 38% de 1 Distribuidor Vial
Inversión 2026: 580 mdp
Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial

 **Inicio:** 16 de julio de 2025
Término meta 2025: Diciembre 2025
Término meta total: 15 de agosto de 2026


 **73,215** habitantes beneficiados

 **2,160** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo

Beneficios Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.

Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	- Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., - Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

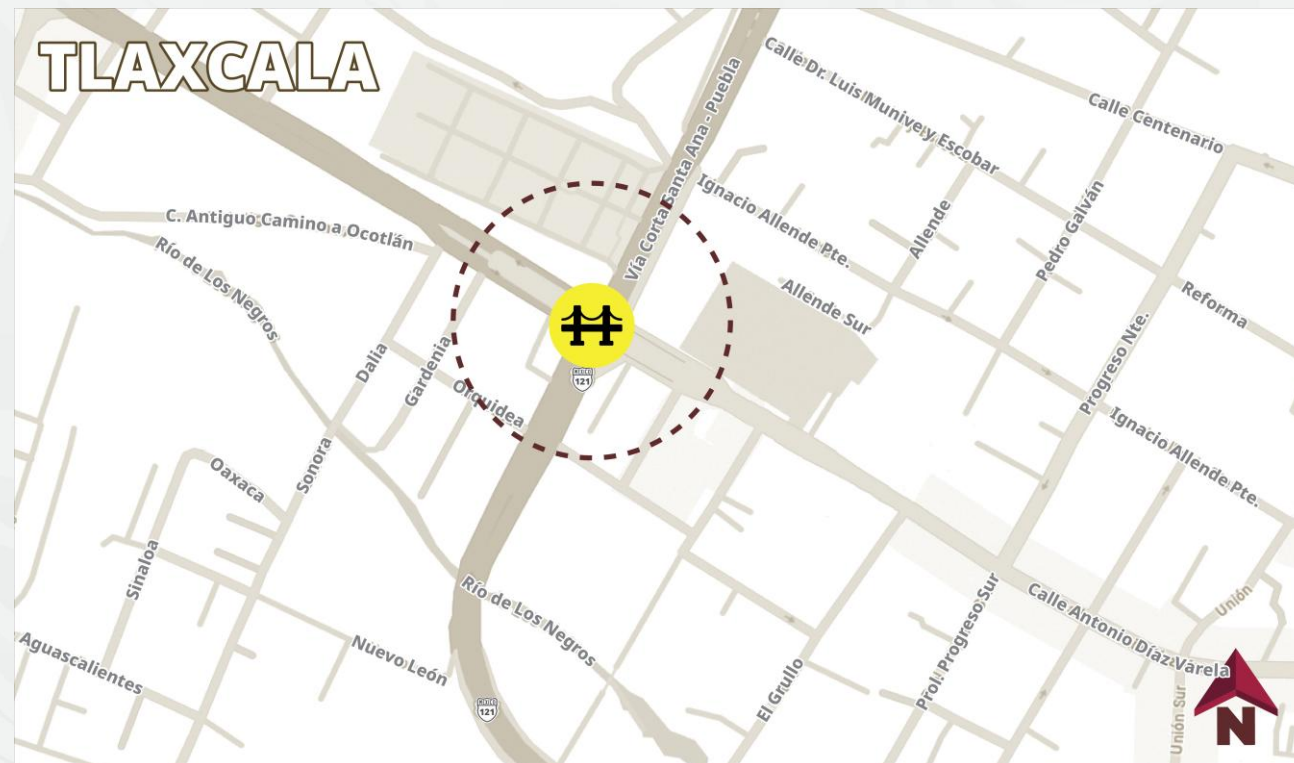


Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	03 al 09/07/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	65.40% 1 Distribuidor Vial	34.60% de 1 Distribuidor Vial	1.84%	0.40%	Se trabaja en: Diafragmas, Losas, drenaje pluvial, montaje de trabes puente de los negros, fabricación de trabes y Muros mecánicamente estabilizados.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

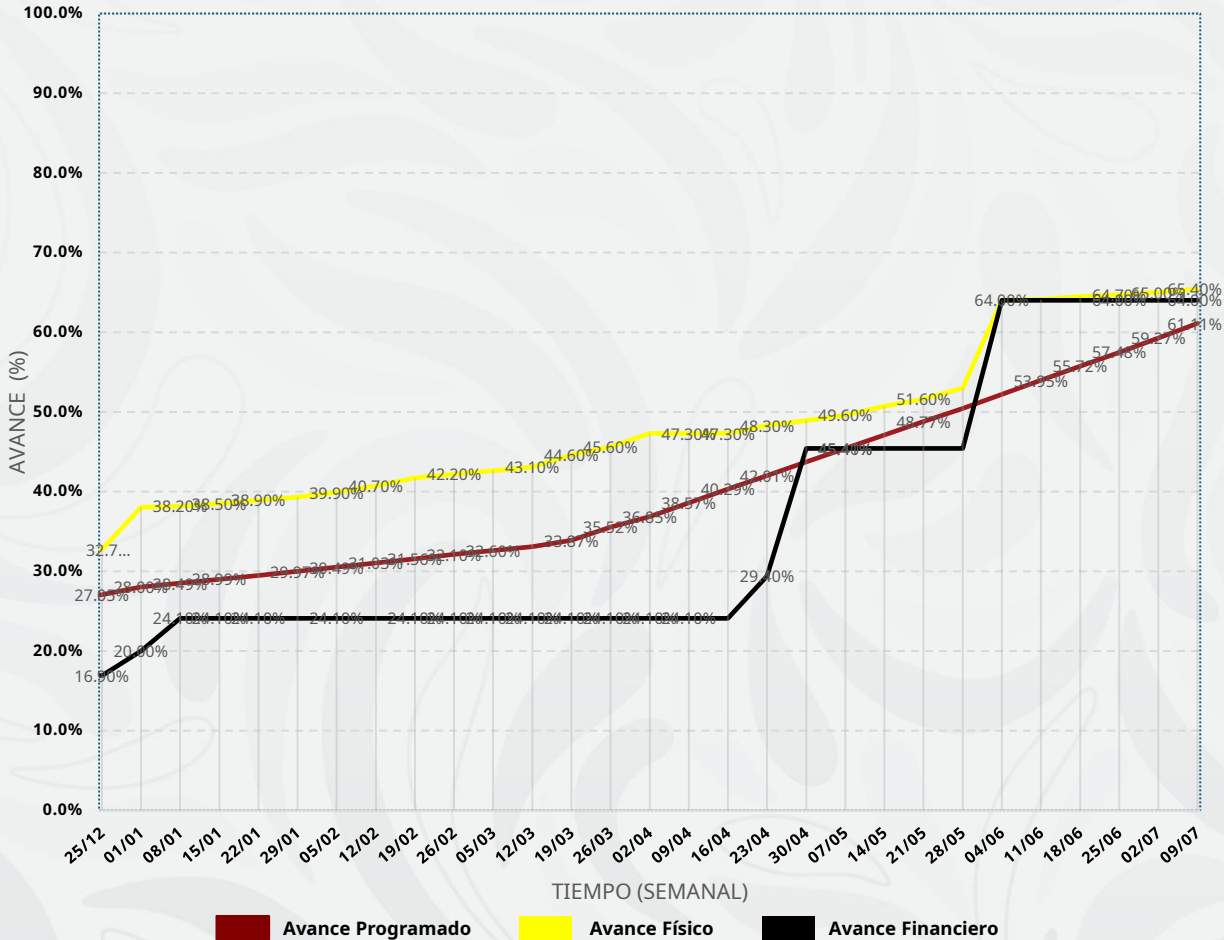

	26 de junio al 02 de julio	03 al 09 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	131	141
Maquinaria	19	19
Frente de trabajo	13	12
