



Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

- Inversión total:** 484 MDP
- Meta total:** 1.92 km longitud total.
 - 0.77 km puente
- Inicio:** 27 Abril de 2026
Término: 21 Octubre 2026
- Más de 1,320,00** de habitantes beneficiados
- 2,890** empleos generados
- 5 minutos** ahorro en tiempo

Beneficios:

- Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes.
- Optimiza la capacidad y eficiencia del flujo vehicular en el acceso y salida del Puente Vehicular Nichupté.
- Fortalecer la seguridad de los residentes y turistas de la zona turística ante situaciones de contingencias ambientales
- Población beneficiada: 20 millones de turistas al año



Tramo	Empresas
Construcción distribuidor vial Kukulcán.	• Contratista: Grupo Formado por las empresas: Consorcio de Ingenieros Constructores y consultores, S.A. de C.V y ASCH, S.A. de C.V. • Supervisión: Grupo formado por las empresas: Triada Geotecnia, S.A.P.I. de C.V. Triada Consultores, S.A.P.I. de C.V. Triada Diseño y Gerencia Construcción S.A.P.I. de C.V. .



SITUACIÓN ACTUAL

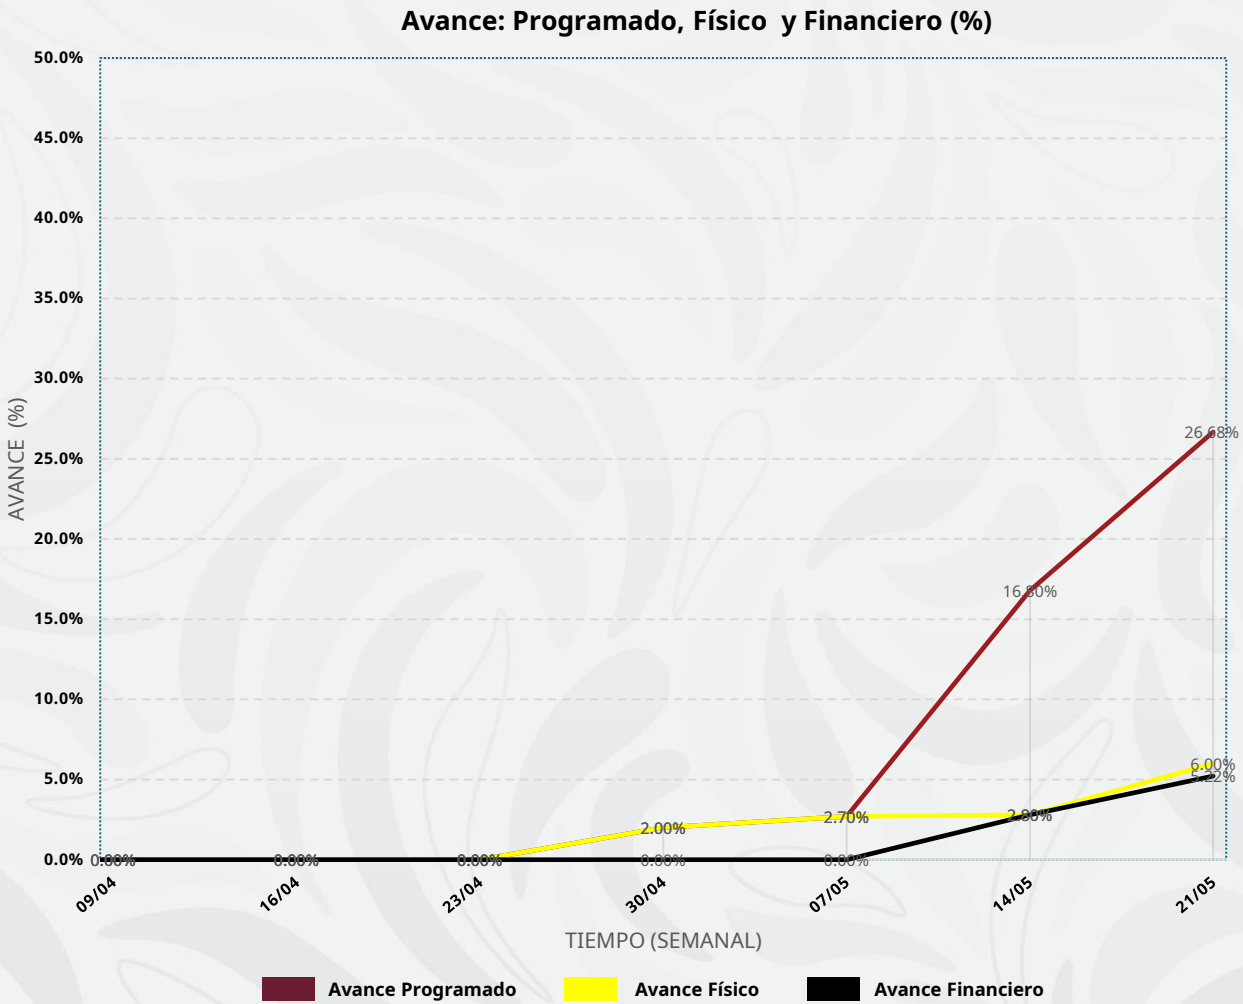


IMAGEN OBJETIVO

Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado		Faltante	Ejecutado del 15 al 21 de mayo de 2026
Pilas de cimentación (pza)	104	17	16%	87	10
Zapatas (pza)	18	0	0%	18	0
Columnas (pza)	30	0	0%	30	0
Cabezales (pza)	19	0	0%	19	0
Fabricación de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Montaje de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Losas (pza)	17	0	0%	17	0
M.M.E. (m³)	6,176	0	0%	6,176	0



Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

ACTUALIZADA 26/05/2026



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Trabajos en obras inducidas
(drenaje, aguas tratadas y fibra óptica)



Colado de pilas de cimentación, rama 100



Armado de acero de refuerzo para pilas, rama 100



Hincado de ademe metálico, rama 100
