

PSV Arco Norte

Colima

Avance global

- Programado: 28.51%
- Real: 50.17%
- Semanal: 0.64%
- Financiero: 34.11%

Avance 2025

- Programado: 84.54%
- Real: 100.00%
- Semanal: 1.90%
- Financiero: 76.00%

 **Inversión total 2025-2026:** 369.7 mdp
Inversión 2025: 127.4 mdp

 **Meta total:** 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.
Meta 2025: 200.6 m (34.1% (cimentación y subestructura))


 **Inicio:** 10 de junio de 2025
Término: 09 de junio de 2026
Término meta 2025: diciembre

 **306,810** habitantes beneficiados

 **1,109** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular “Arco Norte”	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V • Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V

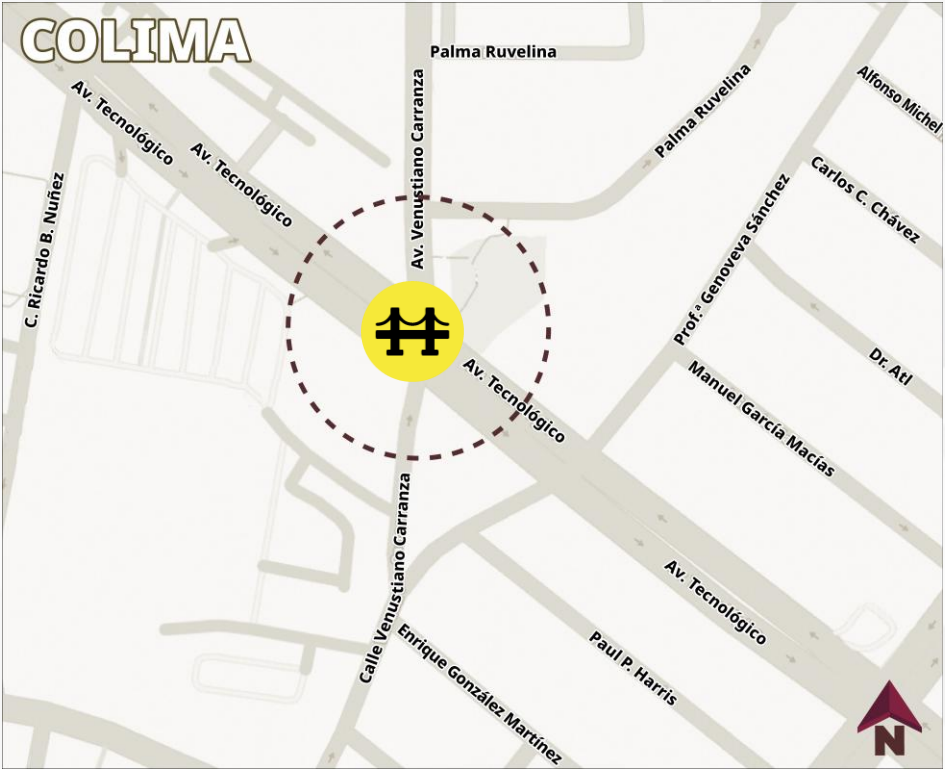

PSV Libramiento Arco Norte

Colima


Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	04/12/25 al 11/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos						
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Terracerías						
Corte (m³)	9,295.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	
Terraplén (m³)	9,292.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	
Subyacente (m³)	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	
Subrasante (m³)	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	
Subestructura						
Pilas (pza)	76.00	76.00	0.00	4.13	0.00	Trabajos concluidos
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	1.25	1.00	Trabajos concluidos
Columnas (pza)	42.00	40.00	2.00	2.63	2.00	
Cabezales (pza)	22.00	20.00	2.00	1.38	1.00	



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

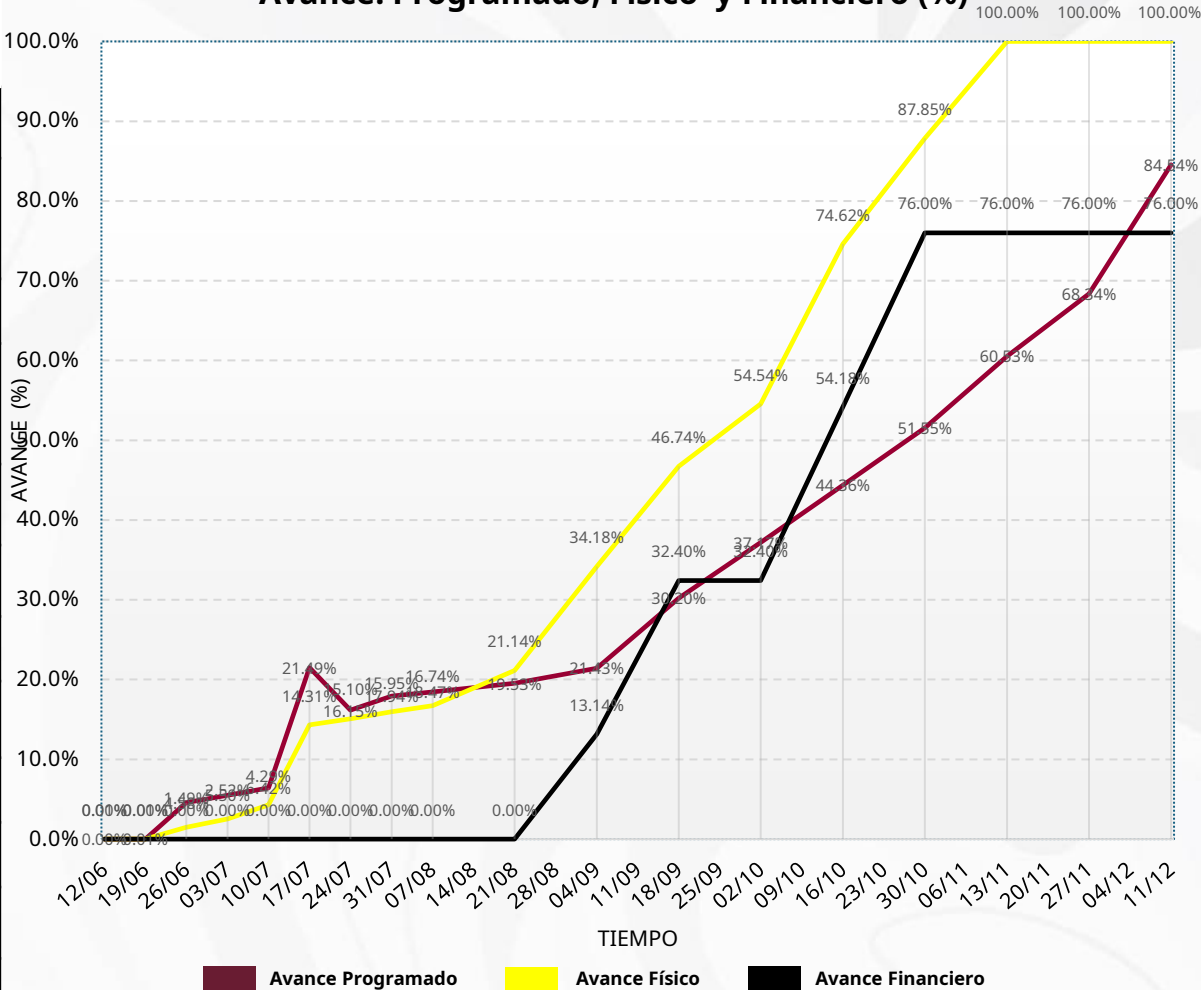

	28 de noviembre al 04 de diciembre	05 al 11 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	85	90
Maquinaria	18	19
Frentes de trabajo	5	6
