

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)

Avance global

- Programado: 45.36%
- Real: 62.10%
- Semanal: 1.01%
- Financiero: 43.84%

Avance 2025

- Programado: 92.25%
- Real: 99.02%
- Semanal: 0.05%
- Financiero: 61.70%

Se recibió una ampliación de recursos en el 2025 por 120 MDP, lo que afectó el % avance financiero 2025.

Inversión total 2025-2026: 450 mdp
Inversión 2025: 319.94 mdp | 1.35 km del Deprimido

Meta total: 1 Deprimido | 1.5 km
Gasas | 4.1 km

Inicio: 12 de mayo de 2025
Término: abril de 2026
Término meta 2025: Diciembre

351,000 habitantes beneficiados

1,350 empleos generados

25 min ahorro en tiempo



Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Baja California Sur

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur


(Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	05/12/25 al 11/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Retiro de vegetación (pzas)	500.0	480.00	20.00	0.0	0.00	
Reubicación de Monumento FONATUR (pza)	1.0	0.80	0.20	0.0	0.10	
Terracerías						
Terracerías (m3)	14,112.0	6,167.4	7,944.6	0.0	250.0	
Excavación núcleo (m3)	100,069.2	64,564.0	35,505.2	7,697.6	1,215.0	
Relleno fluido (m3)	1,680.0	0.0	1,680.0	0.0	0.0	
Base hidráulica (m3)	11,840.0	5,070.3	6,769.7	0.0	135.0	
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas (pzas)	14.0	10.0	4.0	0.0	0.0	Reducción de meta por cambio de proyecto.
Muros de 2 a 7 m (pzas)	14.0	10.0	4.0	0.0	0.0	Reducción de meta por cambio de proyecto.
Pilas tangentes (pzas)	1,311.0	1,210.0	101.0	0.0	63.0	Cambio de meta por cambio de proyecto.
Trabes de liga (m)	1,123.6	434.0	689.6	0.0	24.0	
Fabricación de cabezal (pzas)	8.0	6.0	2.0	0.0	1.0	
Fabricación trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	45.0	7.0	0.0	3.0	
Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	0.0	52.0	7.4	0.0	
Losas puentes (m2)	1,642.8	0.0	1,642.8	410.7	0.0	
Guarnición (m3)	375.0	39.1	335.9	0.0	0.0	
Banquetas (m3)	3,304.2	0.0	3,304.2	0.0	0.0	
Pavimento rígido (m3)	5,227.0	0.0	5,227.0	0.0	0.0	
Pavimento flexible (m3)	34,720.0	142.10	34,577.9	0.0	0.0	
Parapeto (m)	1,795.2	0.0	1,795.2	0.0	0.0	
Semaforización						
Semaforización (%)	100	0.0	100	0.0	0.0	
Obra inducida						
Reubicación de línea de media tensión de CFE (m)	1,723.0	1,630.0	93.0	0.0	0.0	Cambio de meta por actualización de proyecto.

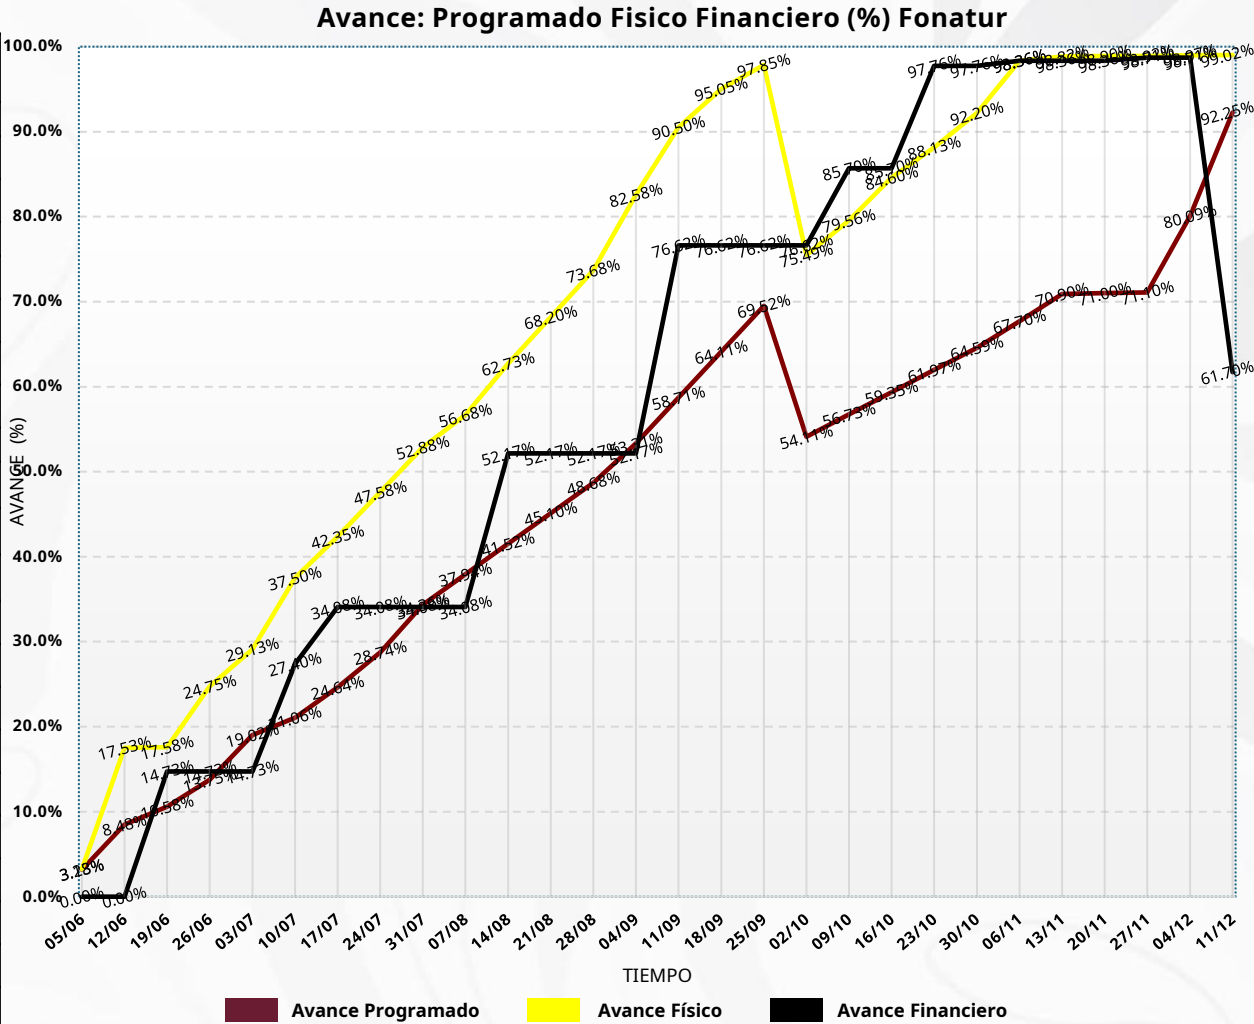

	28 de noviembre al 04 de diciembre	05 de diciembre al 11 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	97	97
Maquinaria	16	16
Frentes de trabajo	8	8
