

Puente "Las Tunas"

Colima



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global


- Programado: 40.05%
- Real: 41.97%
- Semanal: 4.43%
- Financiero: 22.14%

- Inversión total:** 105.0 MDP
- Meta total:** 503.0 m longitud total (0.153 km estructuras y 0.350 km accesos)
- Inicio:** 25 de febrero de 2026
Término: 31 de agosto de 2026
- 157,048** habitantes beneficiados
- 235** empleos generados
- 15 min** ahorro en tiempo

Beneficios:

- Comunicación ininterrumpida en época de lluvias para las comunidades.
- Acceso continuo a los servicios básicos como salud.
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

Tramo	Empresas
Construcción Puente Las Tunas	• Contratista: MARECOMSA, S.A. de C.V • Supervisión: Actualmente no se cuenta con supervisión

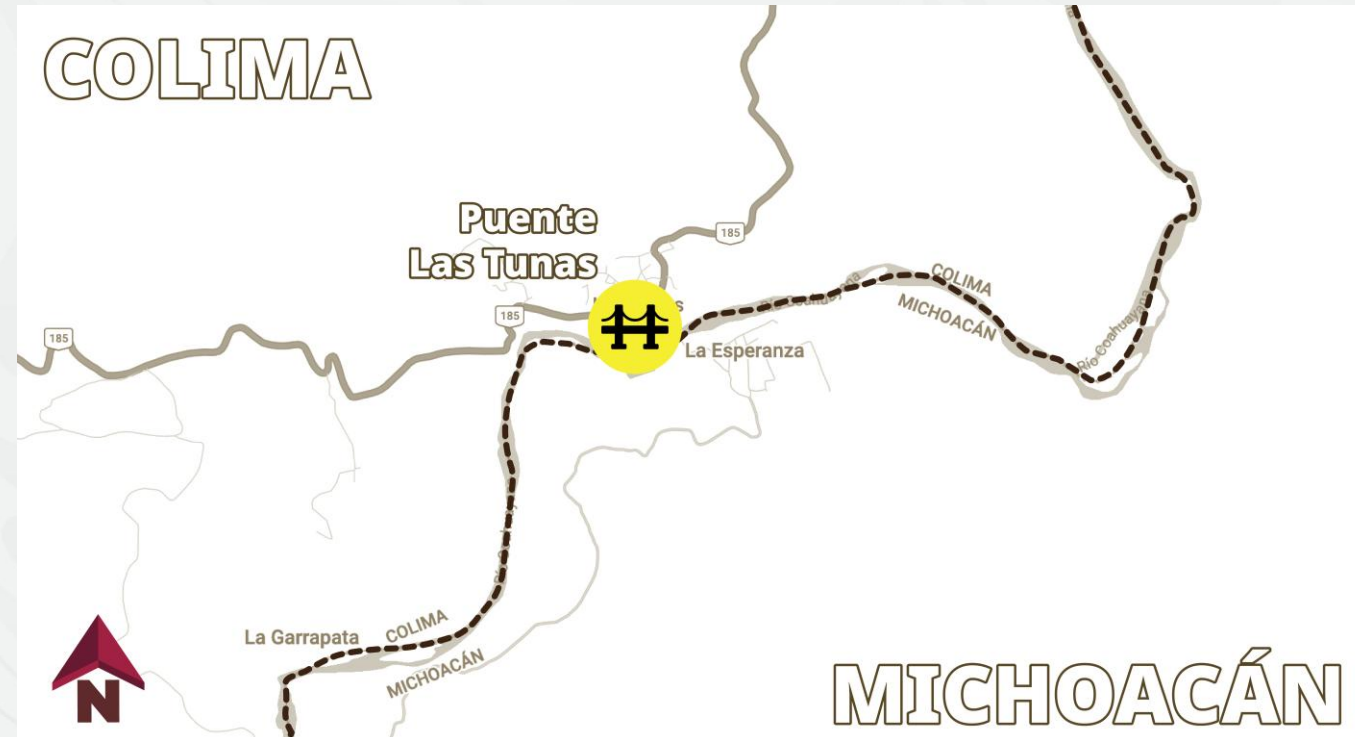

SITUACIÓN ACTUAL



IMAGEN OBJETIVO

Puente “Las Tunas”

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	22/05/26 al 28/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m3)	36,000.0	24,314.06	11,685.94	284.56	0.00	
Pilas de cimentación (Perforación) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Armado) (Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Pilas de cimentación (Colado)(Pza)	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos
Vigas de Atado (Pza)	4.00	3.55	0.45	0.42	0.00	
Columnas (Pza)	12.00	9.00	3.00	2.17	0.00	
Construcción de cabezales y bancos (Pza)	6.00	4.00	2.00	1.00	1.00	
Aleros y Muro de Contención (Pza)	4.00	0.00	4.00	0.50	0.00	
Fabricación de traveses AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	20.00	5.00	1.00	4.00	
Suministro de traveses AASHTO Tipo IV (Pza)	25.0	5.0	20.0	0.0	5.0	
Montaje de traveses AASHTO Tipo IV (Pza)	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
Colado de diafragma y losa (m3)	376.81	0.00	376.81	0.00	0.00	
Carpeta Asfáltica (m3)	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	
Guarniciones y banquetas (m3)	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	
Accesos (ml)	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
Señalamiento (ml)	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	

