

PSV Arco Norte

Colima

Avance global

• Programado: 84.71%

• Real: 94.80%

• Semanal: 3.65%

• Financiero: 42.27%



Inversión total 2025-2026: 436.0 MDP
Meta total: 590.0 m longitud total, 298.0 m estructura, 292.0 m accesos



Inversión 2025: 184.3 MDP
Meta 2025: 323 m (54.8% (subestructura))
Inversión 2026: 251.7 MDP
Meta 2026: 267 m (45.2% (superestructura, pavimentos, accesos, iluminación y obras complementarias bajo puente))



Inicio: 10 de junio de 2025
Término: abril 2026



306,810 habitantes beneficiados




1,109 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

- Beneficios:**
- Mejorará la conexión entre la zona metropolitana del Estado (Colima-Villa de Álvarez)
 - Impulsará el crecimiento económico y social del estado
 - Optimizará el flujo vehicular eliminando un punto critico de congestión vial
 - Reducción de tiempo de recorrido para los usuarios

Paso superior con dos cuerpos de 3 carriles por sentido

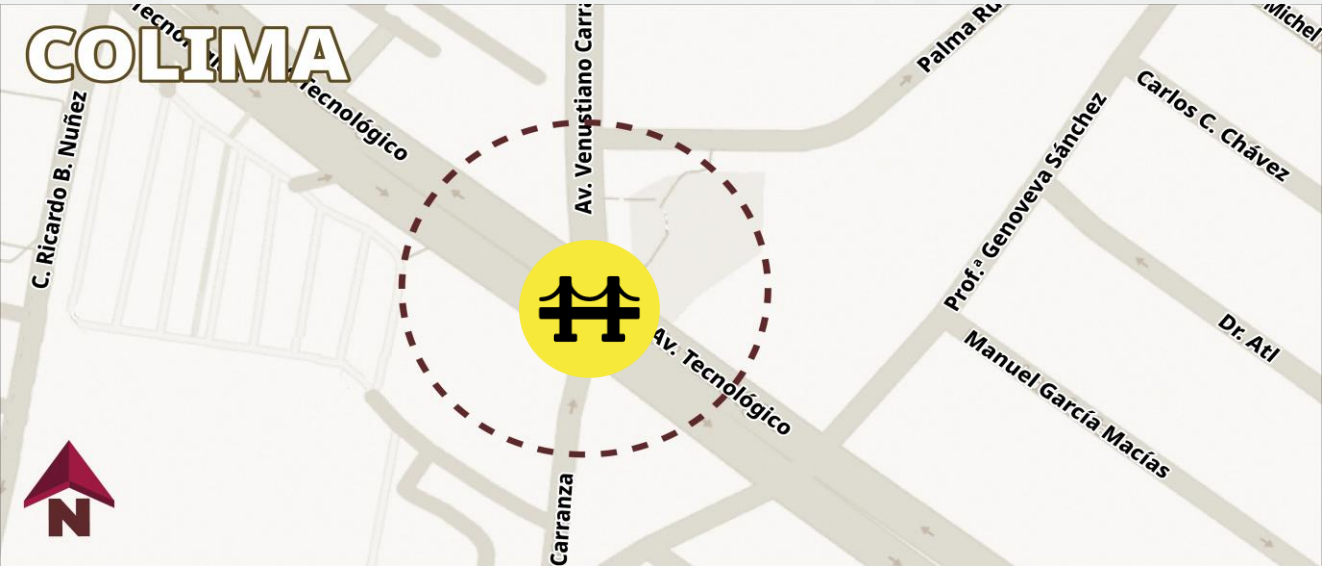

Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte"	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V • Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V

PSV Libramiento Arco Norte

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	10/04/26 al 16/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos						
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Subestructura						
Pilas (pza)	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Columnas (pza)	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Cabezales (pza)	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos

