

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

• Programado: 66.11%

• Semanal: 2.15%

• Real: 67.42%

• Financiero: 47.22%

- 

Inversión total 2025-2026: 630 mdp
Inversión 2025: 280 mdp
Inversión 2026: 350.0 mdp
- 

Meta total: 1.2 km (puente y accesos)
Meta 2025: 0.55 km (46% del puente (superestructura y accesos))
Meta 2026: 0.65 km (54% del puente (superestructura y accesos))
- 

Inicio: 03-Julio de 2025
Término: Marzo de 2026
Término meta 2025: Diciembre
Término meta 2026: Marzo
- 


157,048 habitantes beneficiados
- 

1,431 empleos generados
- 


15 min ahorro en tiempo

Beneficios Reducción de tiempos de traslado al poder realizar el cruce de las vías del tren, evitando tiempos de espera prolongados y “cuellos de botella”, así mismo, permitiendo agilizar el tránsito local.

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN CONTRATO FINALIZADO 31-DIC-2025

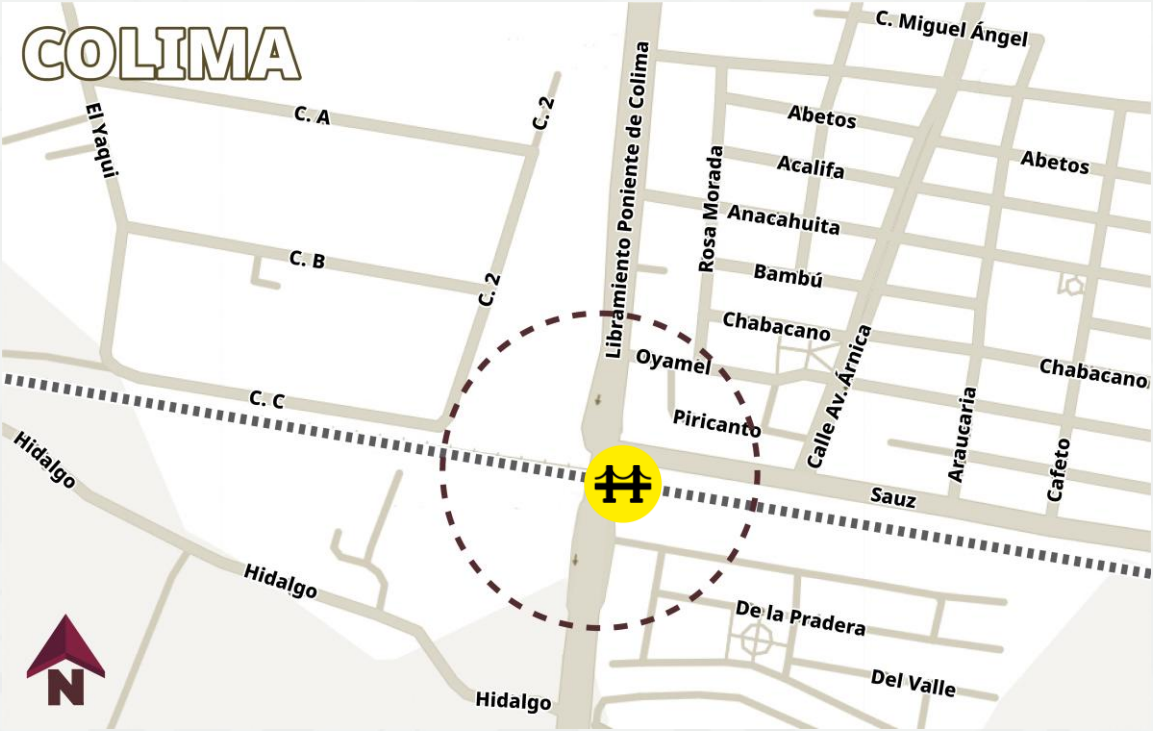

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

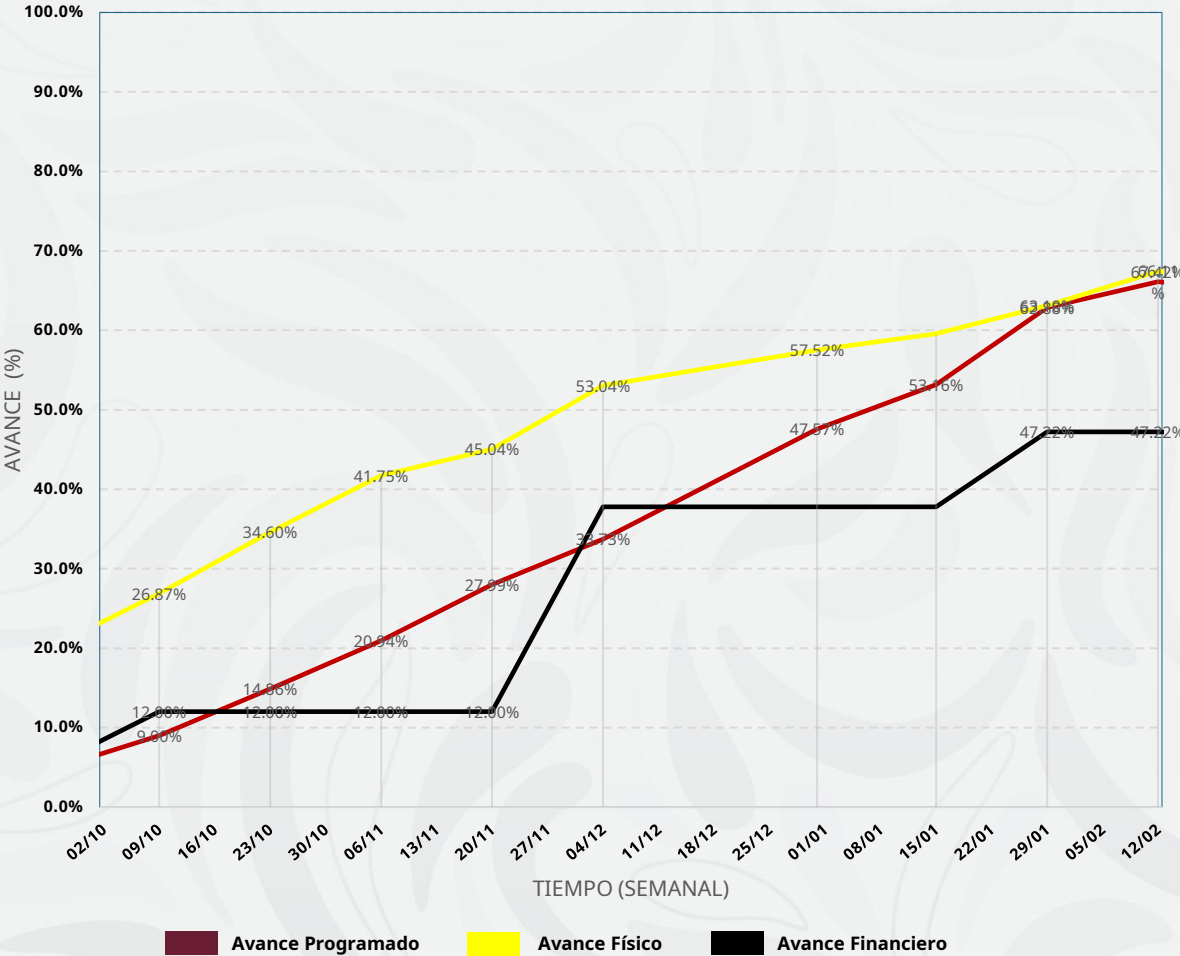

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	06/02/2026 al 12/02/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2, 477.55	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Puente lateral (pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida.
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	994.56	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	790.42	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Accesos al PSF (m)	896.00	517.76	378.84	41.89	80.02	
Subestructura PSF						
Pilas (pza)	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Columnas (pza)	40.00	40.00	0.00	0.00	4.00	Partida concluida
Cabezales (pza)	24.00	24.00	0.00	0.00	2.52	Partida concluida
Apoyos (pza)	168.00	6.52	161.48	8.40	1.36	

	30 de enero al 05 de febrero de 2026	06 al 12 de febrero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	173	173
Maquinaria	43	43
Fuerza de trabajo	10	10
