

PSV Celsa Virgen Pérez (Arco Norte)

Colima

CONCLUIDA

Avance global

- Programado: 100.0%
- Real: 100.0%
- Semanal: 0.95%
- Financiero: 74.32%

 **Inversión total 2025-2026:** 432.8 MDP
Meta total: 590.0 m longitud total, 298.0 m estructura, 292.0 m accesos

Inversión 2025: 184.3 MDP

Meta 2025: 323 m (54.8% (subestructura))

 **Inversión 2026:** 251.7 MDP

Meta 2026: 267 m (45.2% (superestructura, pavimentos, accesos, iluminación y obras complementarias bajo puente))

 **Inicio:** 10 de junio de 2025
Término: 23 abril 2026

 **306,810** habitantes beneficiados


 **1,109** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

Beneficios:

- Mejorará la conexión entre la zona metropolitana del Estado (Colima-Villa de Álvarez)
- Impulsará el crecimiento económico y social del estado
- Optimizará el flujo vehicular eliminando un punto critico de congestión vial
- Reducción de tiempo de recorrido para los usuarios

Paso superior con dos cuerpos de 3 carriles por sentido

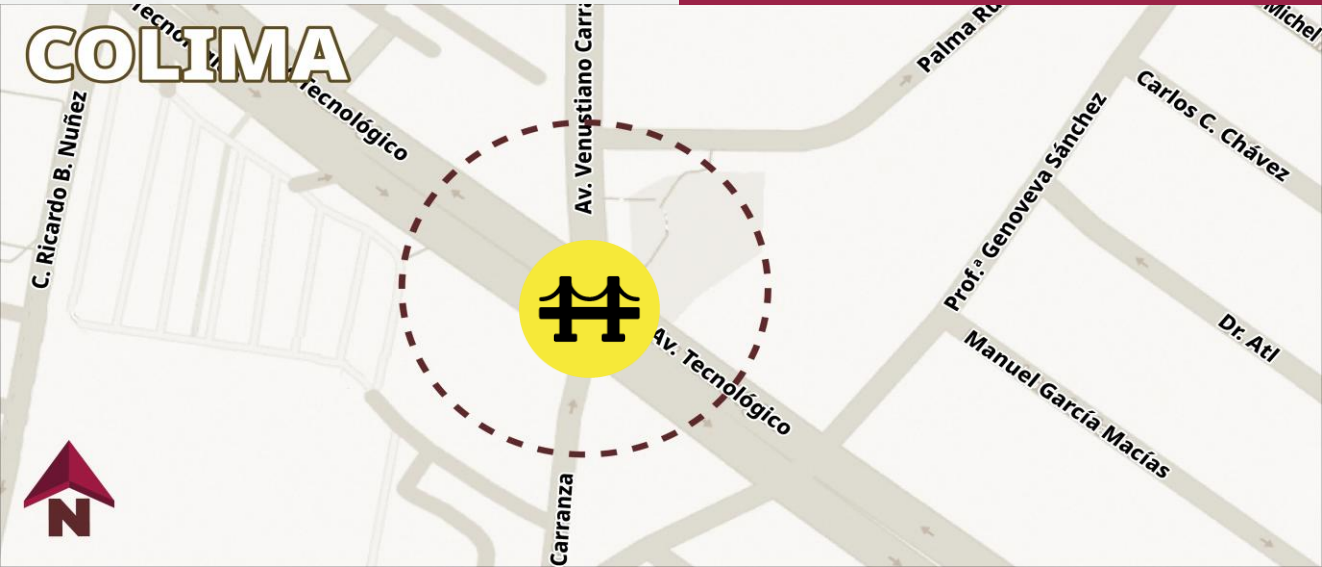

Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte"	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V • Supervisión: IDEVSA INGENIERÍA, S.A
