



Paso Superior Vehicular Santiago Undameo

Michoacán

Avance global

- Programado: 8.95%
- Real: 16.93%
- Semanal: 2.00%
- Financiero: 0.00%

Inversión total 2026: 156.70 mdp
Meta total: 1 Paso Superior Vehicular de 1.10 km (1,046 m de accesos y 54 m de claro).

Inicio: 02 de junio de 2026
Término: 31 de diciembre de 2026

1,193,384 habitantes beneficiados

471 empleos generados

15 min ahorro en tiempo

Beneficios Avanzar en la modernización de la infraestructura vial mediante la construcción del paso superior vehicular en el cruce Km 15+000 del corredor Morelia-Pátzcuaro. Esto permitirá mejorar la seguridad vial, ordenar los movimientos direccionales y agilizar el tránsito de largo itinerario, reduciendo tiempos de recorrido y el riesgo de accidentes en el entronque.

Tramo	Empresas
KM 15+000	• Contratista: PLACOSA, S.A. de C.V. y Construcciones Peñascos 6A, S.A. de C.V. • Supervisión: Constructora SOCOE, S.A. de C.V.



Situación actual




Avance de obra

Paso Superior Vehicular Santiago Undameo

Michoacán

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	17/07/26 al 23/07/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Paso Superior Vehicular (PSV)	1 PSV	16.93% de 1 PSV	83.07% de 1 PSV	8.95%	2.26%	Se trabaja en: Cimentación: 14 pilotes terminados. Superestructura: fabricación de 10 trabes. Terracerías: 9,500 m³ ejecutados. Excavación: 1,500 m³ para cimentaciones. Demolición: 550 m³ de superestructura retirados

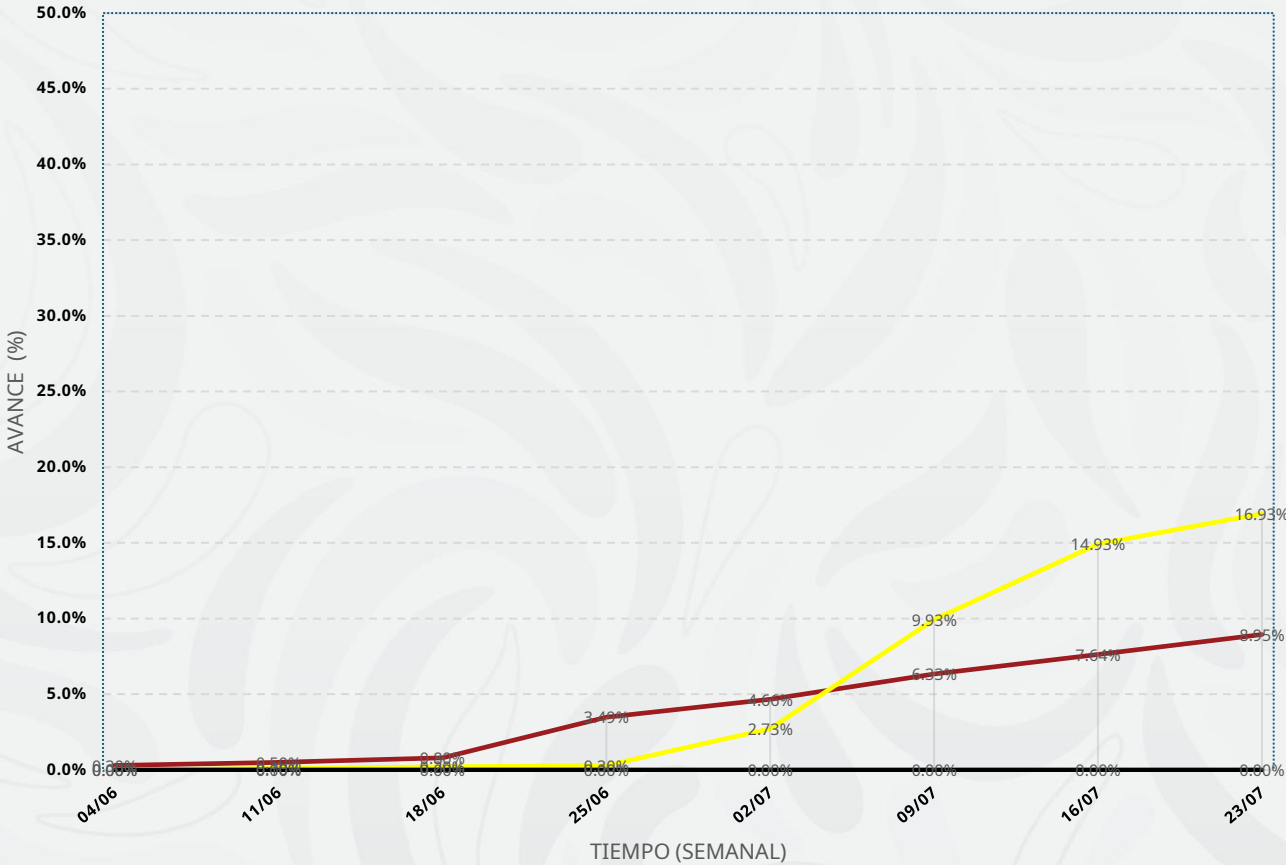

	10 de julio al 16 de julio	17 de julio al 23 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	32	63
Maquinaria	13	18
Frente de trabajo	5	3
