

CDMX

Alameda Oriente

Avance global

- Programado: 13.36%
- Real: 12.16%
- Semanal: 1%
- Financiero: 8.61%

Avance 2025

- Programado: 83.5%
- Real: 76%
- Semanal: 6.25%
- Financiero: 64.46%

Inversión total 2025-2027: 2,000 mdp
Inversión 2025: 267 mdp | (16% de 2 puentes)

Meta total: 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.

Inicio: 17 de junio de 2025
Término: Octubre 2027
Término meta 2025: Diciembre

1,798,474 habitantes beneficiados

6,000 empleos generados

15 min ahorro en tiempo

Empresas	
• Contratista:	CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
• Supervisión:	ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.



Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente


(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

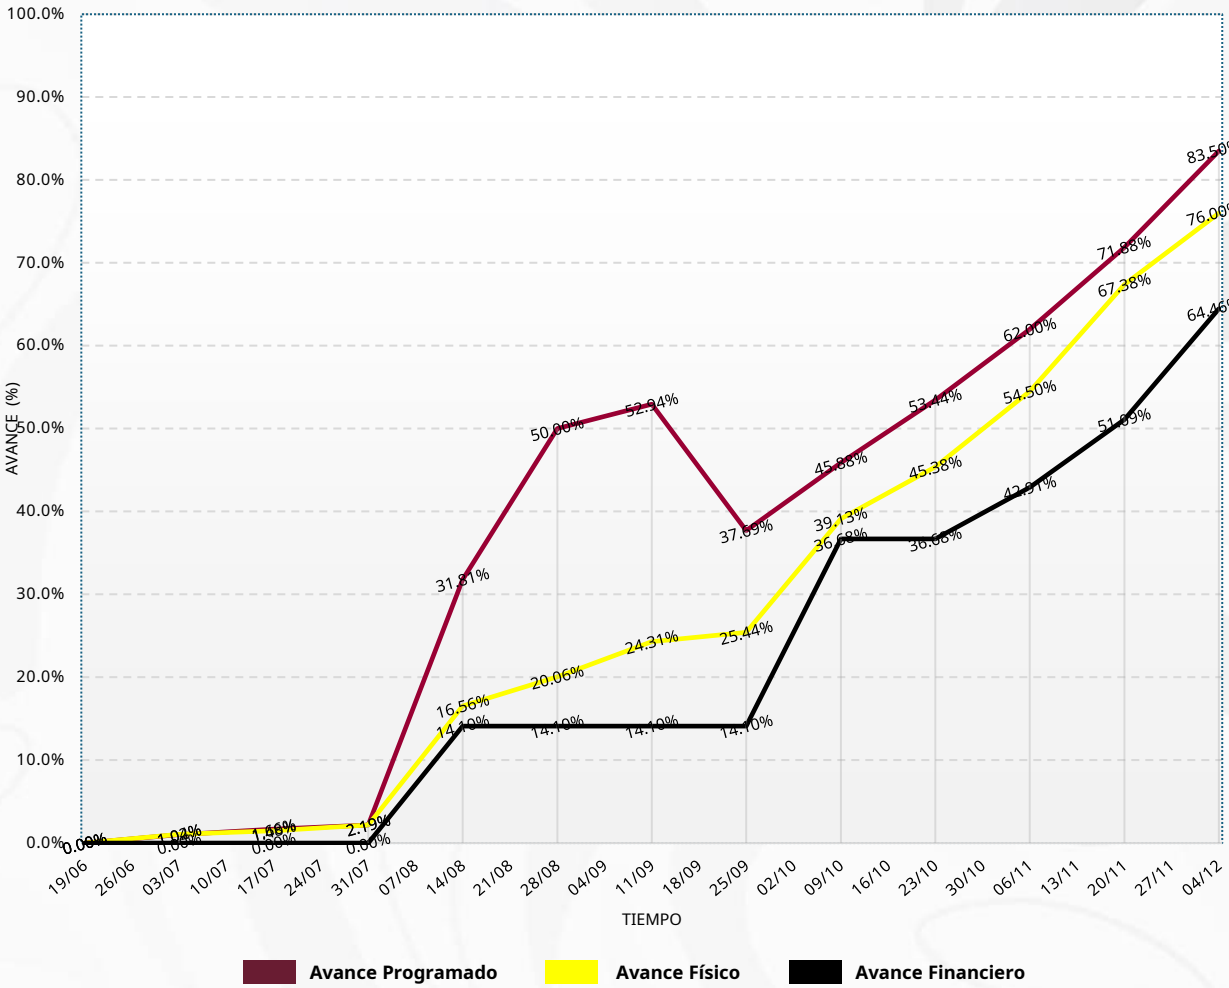

	Del 21 al 27 de noviembre de 2025	Del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	70	70
Maquinaria	18	18
Frentes de trabajo	7	8

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado Acumulado	Faltante	28/nov/25 al 04/dic/25 Programado	Ejecutado
Estudios (Puentes 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puentes 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Demolición y retiro de estructura (Puentes 1 y 2)	500	m	450	50	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puentes 1 y 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento de señal tipo puente (Puentes 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	4,740.4	m3	4,169.54	570.86	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	58,115.16	m3	9,076.71	49,038.45	2,141.45	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	42,615.03	m3	12,180	30,435.03	1,782.13	366.01
Construcción de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puentes 1 y 2)	2,292	Pzs	955	1,337	128.15	84
Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puentes 1 y 2)	2,292	Pzs	324.00	1,968.00	103.86	0.00
Excavación para desplante de Zapatas (Puentes 1 y 2)	1,984.10	m3	0	1,984.1	0	0
Construcción de Zapatas (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Excavación para desplante de Cajones (Puentes 1 y 2)	1,984.10	m3	0	1,984.1	0	0
Construcción de Cajones (Puentes 1 y 2)	8.00	Pzs	0	8	0	0
Construcción de Columnas (Puentes 1 y 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Construcción de Cabezales (Puentes 1 y 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Fabricación de trabes pretensadas (Puentes 1 y 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puentes 1 y 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Fabricación de trabes de Acero (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Traslado y montaje de trabes de Acero (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Construcción de Losas de calzada (Puentes 1 y 2)	10.00	Claros	0	10	0	0
Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puentes 1 y 2)	960.00	m	0	960	0	0
Construcción de Accesos (Puentes 1 y 2)	1.00	Accesos	0	1	0	0
Construcción de línea de alumbrado público (Puentes 1 y 2)	1.00	Línea	0	1	0	0
Señalamiento Horizontal y Vertical (Puentes 1 y 2)	1.00	Lote	0	1	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	5,222.6	m3	4,546	676.6	0	3,488.59
Excavación en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	64,026.84	m3	9,663	54,363.84	0	2,554.63
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	46,949.97	m3	12,180	34,769.97	0	4,536.76
